

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS,
MPIO. DE ELOTA.

NOTA #01 (APERTURA)

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DEL PRESENTE LIBRO
DE BITACORA PARA DAR EL SEGUIMIENTO A LA PROYECCION
DE LA OBRA DEL CONTRATO; OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022
CON UN IMPORTE CONTRATADO POR \$ 2'406,649.47 S/IVA
CON UN 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO, DEDUCTIVAS
DEL 3% DEL MONTO DE TRABAJOS CONTRATADO S.V.I. Y
C.S.T.R.C.

CON PERIODO DE EJECUCION A PARTIR DEL DIA 23 DE MAYO
AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CON OFICIO DE AUTORI-
ZACION N° SAF-AIP-IED-00-270/2022, PROGRAMA 074.

CONTRATISTA:

SOCIEDAD ENTRE LAS EMPRESAS EL C. EMILIO CONTRERAS
MENDOZA Y LA COMPAÑIA DISEÑOS Y OBRAS GROPSA,
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESUS MICHEL PERRY, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "CONTRATISTA".

NOMBRANDO AL C. EMILIO CONTRERAS M. COMO SUPER-
INTENDE DE LA OBRA QUIEN TENDRA EL PODER DE DECISION

DE LA OBRA.
LA SECRETARIA: POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS NOMBRA AL RESIDENTE DE OBRA CON N° DE
OFICIO; SOP-DIR-SUP-831-A-2022.

ARO. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POZOSILLOS,
MPIO. DE ELOTA, SINALOA.

NOTA #02.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZA LA VISITA A LA UBICACION DE LA OBRA, EN LA CUAL SE CITA A LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION DE OBRAS DEL MPIO. DE ELOTA Y EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE OBRAS (RESIDENTE) SE LES DA EL CONOCIMIENTO DE LAS METAS DE LA OBRA CONTRATADA; MENCIONANDO QUE SE REQUIERE EL APOYO DEL MPIO, PARA LA REALIZACION DEL DESVIO PROVISIONAL DEL TRAMO COMPRENDIDO EN EN KM. 4.0, LA CONTRATISTA SUMINISTRARA TUBERIA NECESARIA PARA SU COLOCACION EN EL PASO DE VADO PROVISIONAL A BASE DE MATERIAL EXISTENTE DEL LUGAR Y EL TRAMO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LA CREACION DE RAMPAS DEL DESENDO Y ACCENSO DEL PASO VEHICULAR, REQUIRIENDO LA CONSERVACION DE LA MISMA DURANTE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.


ARQ. GILBERTO CAMACHO A.


C. EMILIO CONTRERAS M.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS,
MPIO. DE ELOTA, SINALOA.

NOTA #03:

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DA EL INICIO
DEL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL
KM. 4.0 EN DONDE YA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES
PARA INICIO DE LA DEMOLICION DEL PUENTE (TIPO ALCANTARILLA),



AFECTACION DE ALERO
EXISTENTE / REVESTIMIENTO
A BASE CASCAJO PARA REPARACION
PROVISIONAL.

(PUENTE TIPO ALCANTARILLA)
EXISTENTE.

NOTA #04:

SE LE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTAR LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CON RESPECTO A LAS DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS, PARA SU VALORACION.

ARG. GILBERTO CAMACHO A.

ING. EMILIO CONTRERAS M.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS
MPIO. ELOTA, SINALOA.

NOTA # 05.

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL AVANCE EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, EN LA CUAL SE TRABAJO EN LA DEMOLICION DEL PUENTE EXISTE CONSISTENTE EN DEMOLICION DE LOSA PPAL Y MUROS DEL SUPORTE QUE INCLUYE ALEROS A BASE DE MAMPOSTO DE PIEDRA BRAZA, LOSA ARMADA CON CONCRETO, CON EQUIPO DE MAQUINARIA P/DEMOLICION.

NOTA # 06- LOS TRABAJOS PARA EL DESVIO DE LA VIALIDAD QUEDAN REALIZADOS, CON SUS RESPECTIVOS SEÑALIZACION PARA SU DESVIOS LUMINOSOS PARA EVITAR ACCIDENTES

NOTA # 07:

EL EJE CENTRAL DEL NUEVO PROYECTO SE UBICARA AL SIMILAR AL CRUCE DEL PUENTE DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EL CUAL EVITARA FUTURAS EROSIONES EN SU ESTRUCTURA EXISTENTE.

ARG. GILBERTO CAMACHO A.

ING. EMILIO CONTRERAS M.


CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1305-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS
MPIO DE ELOTA, SINALOA.

NOTA #08:

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL AVANCE EN EXCAVACION
PARA LA CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS PRINCIPALES
DEL PUENTE, A BASE DE CONST. DE ZAPATA CORRIDA
PARA EL DESPLANTE DE MURO PARA EL ESTRIBO (NORTE).

ARMADO DE PARRILLADO A BASE DE ACERO DE VAR. $\phi 1"$,
 $1/2"$ y $3/4"$, ANEXANDO EL PLANO DE ARMADO PARA VER SU
DISTRIBUCION.

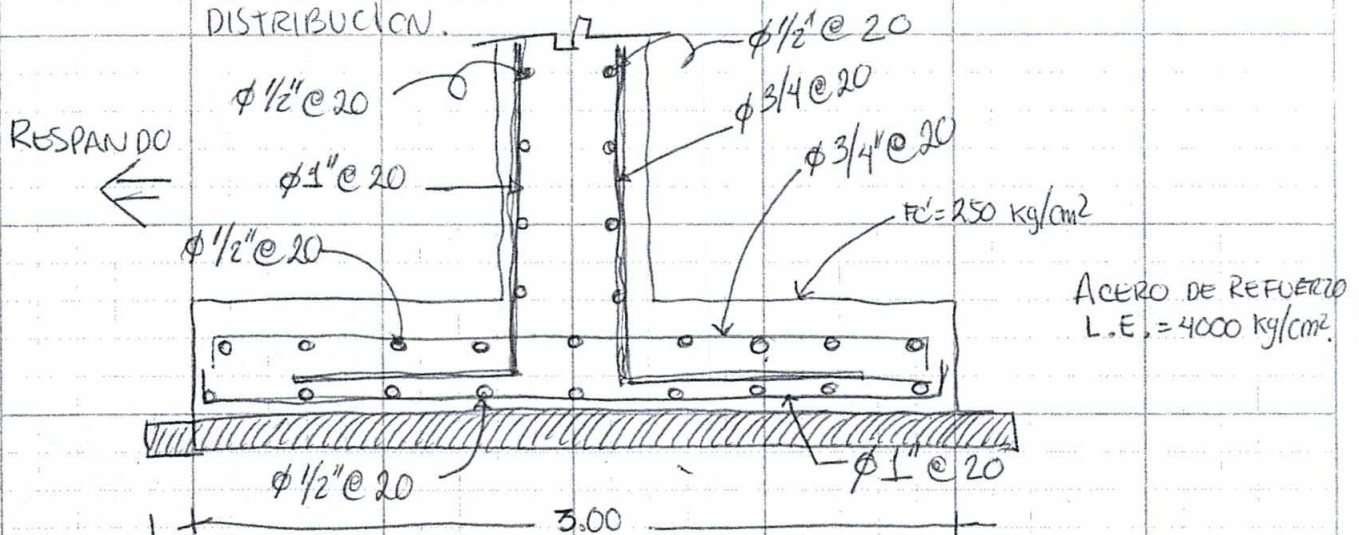

* PLANTILLA PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO
POBRE DE $F_c' = 100 \text{ kg/cm}^2$.

- CIMBRA PERIMETRAL PARA LA PARRILLA DE LA ZAPATA
- TRABAJOS PREVIOS DE NIVELACION, COMPACTACION PARA SUS DESPLANTES.

ASO. GILBERTO CAMACHO A.


ING. EMILIO CONTRERAS M.

CONTRATO: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1805-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ- POTRERILLOS
MPIO. ELOTA, SINALOA.

NOTA #09:

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE REALIZO TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL DESVIO PREVIO PARA LA CONDUCCION DEL DREN PLUVIAL EL CUAL SE REQUIRIO PARA CENTRARSE AL TRAMO ENTRE LOS ESTRIBOS DEL PUENTE EN CONSTRUCCION.

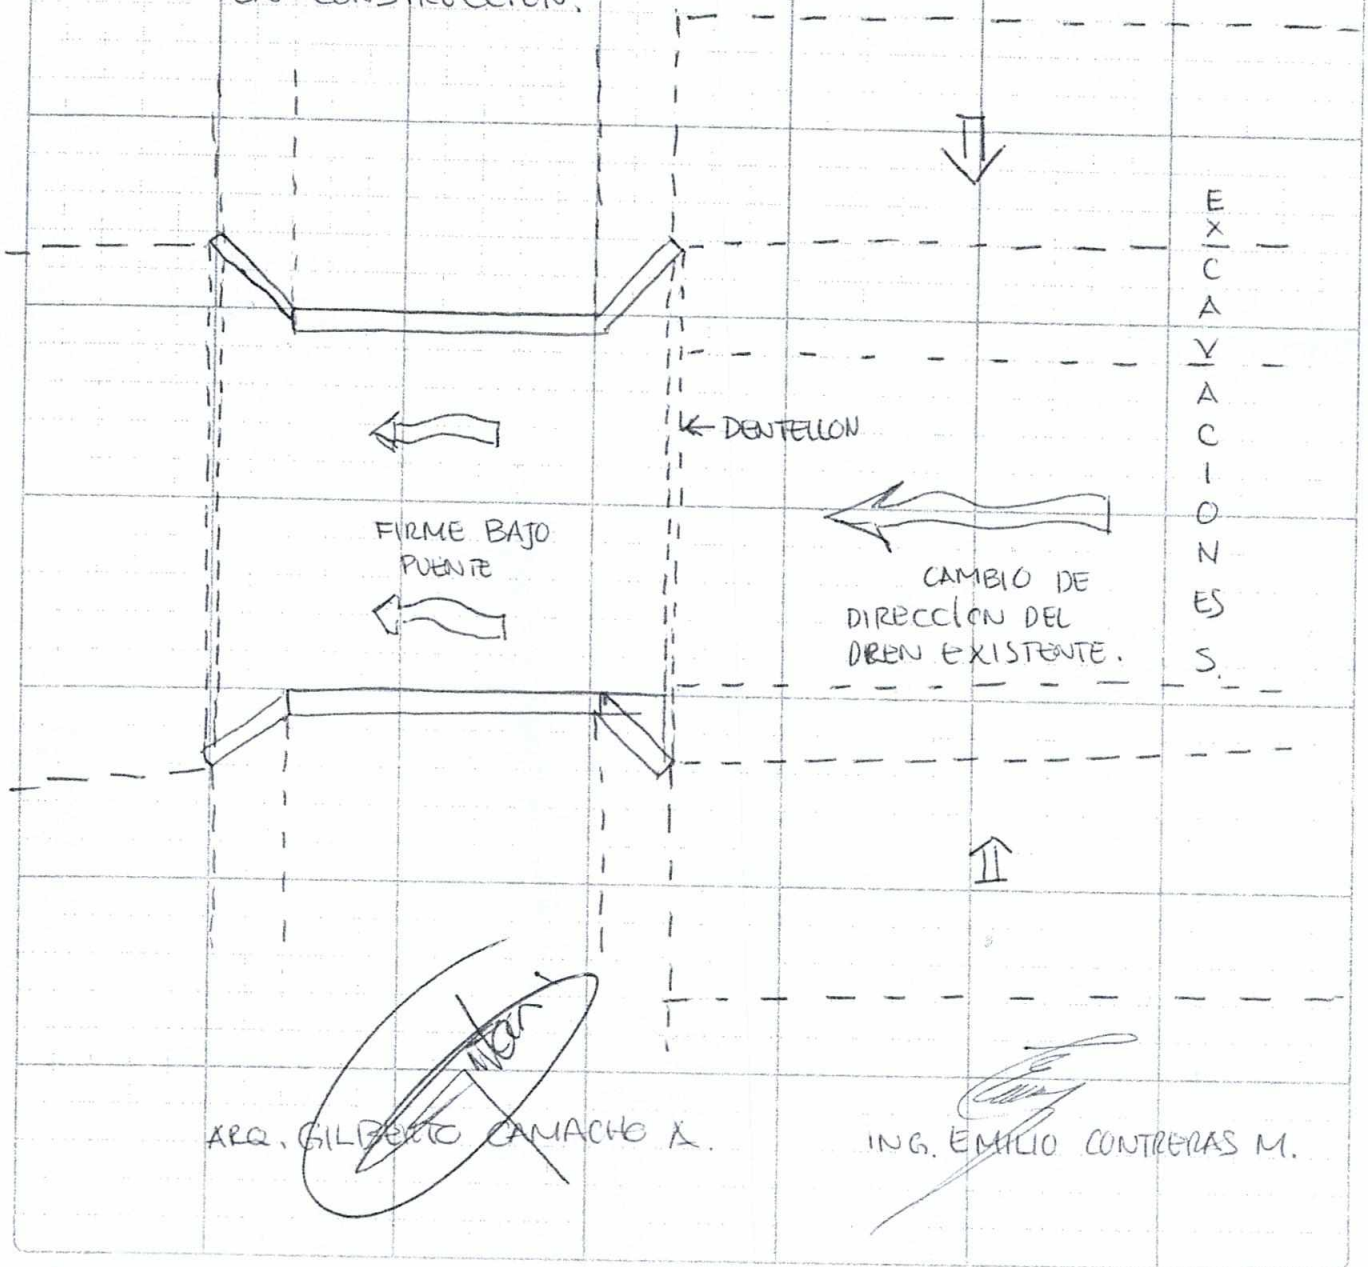


CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-VIAL-1305-2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS.
MPIO. ELOTA, SINALOA.

NOTA # 10:

CON ESTA FECHA SE INFORMA EL PROCESO DEL COLADO DEL PRIMER MURO (ESTRIBO NORTE) A SU PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE A UNA ALT. SOLO CÍMBRA DE 2.45 MTS SOBRE ZAPATA DE 0.60 CMS EN ESTRIBO Y DE 0.40 CMS, SOBRE ESTRIBOS.

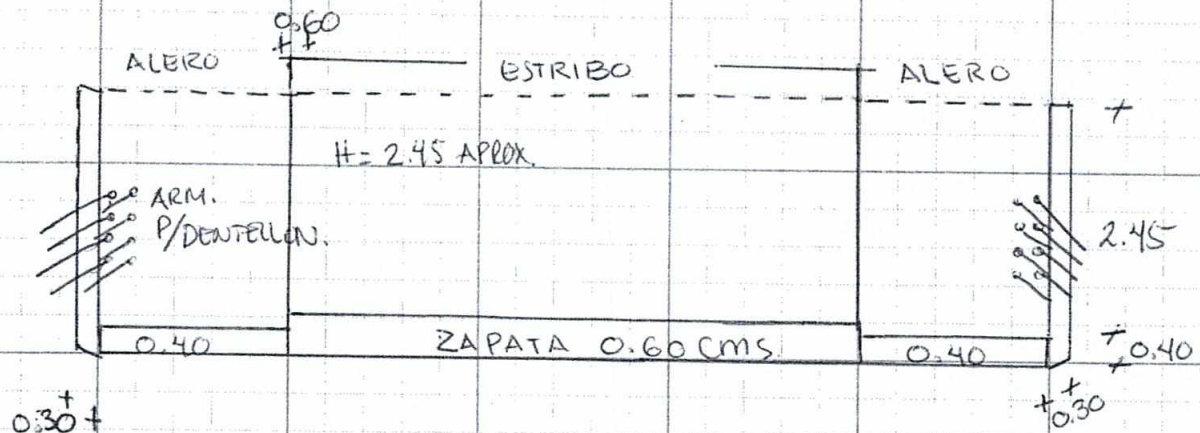

NOTA # 11

SE TRABAJARA EN REALIZAR EL DECIBRADO DE LA ESTRUCTURA PARA RETIRAR LA CÍMBRA Y REUTILIZAR EL MOLDE PARA REALIZAR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA (SUR) ESTRIBO.

~~SUPERVISOR SOP~~

~~SUPERVISOR DENTR~~

OPDV - EST - LP - PEST - VIAL - 1305-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS MUNICIPIO ELIOTA ESTADO DE SINALOA.

12° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL CON UN PERIODO DEL 23-05-2022 - 23-06-2022.

FECHA: 27-JUN-2022

13° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01. NORMAL CON UN PERIODO DEL 23-05-2022 AL 23-06-2022

FECHA: 08-JUNIO-2022

14° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$ 1,148,682.74 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL 23-05-2022 AL 23-06-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SON.
SUPERINTENDENTE

OPPV - EST - LP - PEST - VIAL - 1305 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARREL
TERA LA CRUZ - POTRERILLOS MUNICIPIO
ELOTA ESTADO DE SINALOA.

15° - COLOCACION DE PREELASAS DE 1.40 X 0.30 MTS. DE 10.60 X

16° - CONTINUAN CON ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LOSA.


FECHA: 15-JULIO-2022

17° - COLADO DE LOSA CON CONCRETO
F/C = 250 KG/CM².

FECHA: 18-JULIO-2022

18° - RECIBO SOLICITUD PARA CONVENIO DE AUMENTO EN MONTO ORIGINADO POR CANTIDADES ADICIONALES NECESARIAS PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA.

19° - COLOCACION DE PARADETO PARA CALZADA T-34 EN TACERO


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE.

OPP - EST - LP - PEST - VIAL - 1305 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRE
TERA LA CRUZ - POTRERILLOS MUNICIPIO
ELOTA ESTADO DE SINALOA.

20° - OPERACION DE BACHO CON MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE. (TRINCHADO DE
CARPETA EN AREA DE PUENTE Y
APROCHES PARA LA REPOSICION DE
CARPETA.

FECHA: 24-JUL-2022

21° - RECIBO GENERADORE) PARA ESTIMACION
N° 02 NORMAL CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 24-JUNIO-2022 AL
24-DE JULIO - 2022.

FECHA: 27-JUL-2022

22° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORE)
PARA ESTIMACION N° 02 NORMAL
CON UN PERIODO DEL 24-06-2022.
AL 24-07-2022.

FECHA: 29-JUL-2022

23° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 1,576,871.01
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DE ACUERDO AL CONTRATO. CON UN
PERIODO DEL 24-06-2022 - 24-07-2022.


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - EP - PEST - VIAL - 1305 - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETERA LA CRUZ POTRERILLOS MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

25° RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-09-2022.

FECHA: 02-09-2022.

26° APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 FINIQUITO PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-09-2022.

FECHA: 23-09-2022

27° TRABAJOS AL DIA DE HOY ESTAN TERMINADOS.

28° SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 30 SEPT DEL AÑO EN CURSO EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 30-SEP-2022


29° SE LLEVA A CABO RECORRIDO POR LA OBRA CONSTATANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. SE PROCDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 07-10-2022

30° RECIBO ESTIMACION 03 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 323,859.67 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 25-07-2022 AL 23-09-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1305 - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE, EN
CARRETERA LA CRUZ - POTRERILLOS MUNI-
CIPIO ELORA ESTADO DE SINALOA.

24° - AUTORIZACION DE ESTIMACION N° 02
NORMAL IMPORTR: \$ 1,576,871.01
CON IVA


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 1305 - 2022.

OMPA - CONSTRUCCION DE PUENTE EN CARRETE.
RA LA CRUZ POTRERILLOS MUNICIPIO DE.
FLOTA ESTADO DE SINALOA.

31^{ra} SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.
Supervisor Sop.
SUPERINTENDENTE
