

CONT - APDA - 2007 - 2022.

NOTA NO. 1 25/JULIO/2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

CPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2007 - 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD NIQUERITA, SINDICATURA DE ALVARO BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

MONTO DEL CONTRATO: \$1'543,180.13 Incl. IVA.

CONTRATISTA: BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. EDGAR OMAR FERNANDEZ QUINTERO

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 25 DE JULIO 2022.

TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE 2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE CIRCULO NO. SOP-DIR-SOP-1271-A-2022, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

"LA CONTRATISTA" ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. EDGAR OMAR FERNANDEZ QUINTERO, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 2. 25/JULIO/2022. CONT-APDA-2007-2022.

"LA SECRETARIA" PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, ME DIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-DI-1271-2022.

Edgar Fernandez Q

NOTA NO. 3 25/JULIO/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. DIJO MISMO HECHO MEDIANTE RESPECTIVO OFICIO.

Edgar Fernandez Q

NOTA NO. 4 01/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA MOVILIZADO EL EQUIPO DE PERFORACION, INCLUYENDO LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTE E INTALACION DEL EQUIPO EN EL SITIO DE LA PERFORACION.


Edgar Fernandez Q

NOTA NO. 5 08/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE EN LAS PERFORACIONES SEGUN LOS SIGUIENTES DIAMETROS:

PERFORACION EN POZO 8" DIAM. MAT. TIPO I	→ 10 ML.
AMPL. PERFORACION 8" A 10" MAT. TIPO I	→ 6.0 ML.
PERFORACION 8" ϕ DIAM. MAT. TIPO II	→ 20.0 ML.
PERFORACION 8" ϕ DIAM. MAT. TIPO III	→ 35.0 ML.

POR OTRA PARTE SE HA COLOCADO TUBERIA PVC LISA PARA ADOME DE POZO DE 8" Y 6" DIAM. ASI COMO TUBERIA DE PVC HANDBRADA PARA ADOME DE POZO PROFUNDE DE 6" ϕ DIAM. (54 M2)

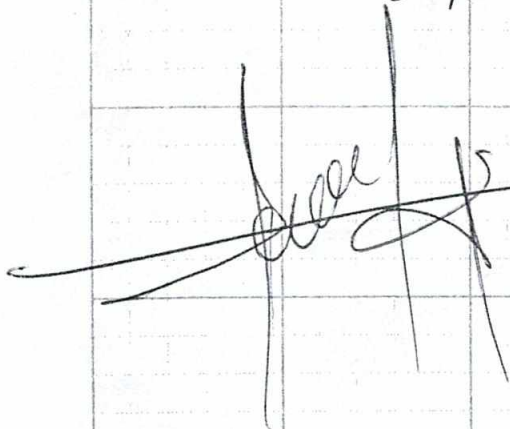


Edgar Fernandez

NOTA NO. 6 19/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LO SIGUIENTES CONCEPTOS:

CEMENTACION DE TUBERIA PARA CONTRADOME, LIMPIEZA DE POZO CON PISTONEO PARA DESATARSE, PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, ANALISIS FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA, BASE PARA APOYOS DE ARRIGLOS HIDRAULICOS.




Edgar Fernandez

NOTA NO. 7 22/AGO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOM.
CUB. NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
25/07/2022 AL 19/08/2022, LA CUAL PRESENTA
EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 725,590.92
AMORT. ANTICIPA	\$ 253,949.82
DEDUC. CONTRATO	\$ 18,764.77
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 452,856.33

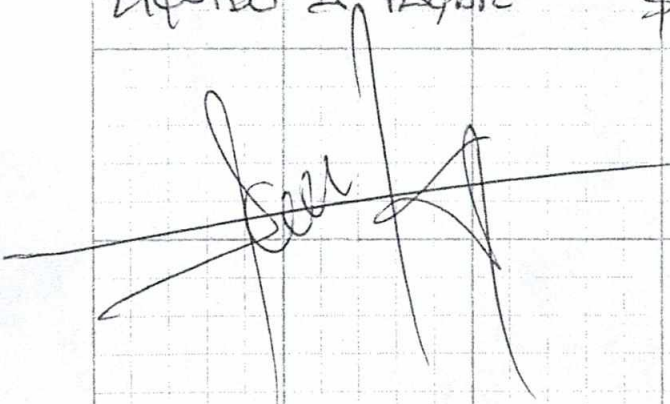
 Egoan Fernandez Q

NOTA NO. 8 07/ SEPT/ 2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADOS LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- LINEAS DE CONDUCCION
- CASETA DE OPERACION
- OBRA ELECTRICA.
- EQUIPO DE BOMBEO Y MANGLOS HIDRAULICOS.

TODO ELLO DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO.



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 9 12/ SEPT/ 2022.


CON ESTA FECHA SE ADOPTA LA ESTIMACION MONETARIA NORMAL, CON UN PERIODO DE EFECTUACION DEL 20/08/2022 AL 07/09/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total ₡ 798,558.96

AMORT. ANTICIPO ₡ 286,163.22

DEDUCC. CONTRATO ₡ 20,652.39

LIQUIDANDO PAGAR ₡ 491,743.35



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 10 12/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA.
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS
DEL CONTRATO.



Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 11 12/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE CANCELAN LA NOTA NO. 9 y
NO. 10 DE FECHA 12/SEPT/2022. DEBIDO AUN
ERROR LOCALIZADO EN LA ESTIMACION DE FINI



Edgar Fernandez Q.

SE CANCELA LA HOJA NO. (SIETE) DE
LA PRESENTE BITACORA.

~~Logo~~
Eduardo Ferrnandez Q

HOJA NO. 11 12/SEPT/2022

CON ESTA FECHA SE CANCELAN LA HOJA NO. 9
NO. 10 DE FECHA 12/SEPT/2022, DEBIDO A UN
ERROR LOCALIZADO EN LA ESTIMACION DE
COSTO FINAL

~~Logo~~
Eduardo Ferrnandez Q

SE CANCELA LA HOJA NO. (SIETE) DE
LA PRESENTE BITACORA.

~~La~~

Wm. Fernandez Q

NOTA NO. 13 12/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION DEL
LIQUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
20/AGO/2022 AL 07/SEPT/2022, LA CUAL
PRESENTA EL SIGUIENTE RESGLOSE:

Importe total	\$ 792,365.74.
Asent. anticipo	\$ 286,163.22.
DEDUCC. ANTICIPO	\$ 20,492.22.
Liquidado a pagar	\$ 485,710.30.

 Edgar Fernandez Q.

NOTA NO. 14 12/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITA-
CORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS
METAS DEL CONTRATO.

 Edgar Fernandez Q.
