


NOTA # 01 24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ABERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2 Y CALLE 9, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NO. OPPU-EST-ADI-PEST-VIAL-1803A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,459,845.57 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.; SE AÑADIAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LA CONTRATISTA.

HUMBERTO Arceola B.
Ing. Humberto Arceola Bustamante.
Residente de la S.O.P.


Superintendente.

NOTA # 02

24 DE MARZO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA A CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO DE OBRA Y DE ASIGNACIÓN DE
SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL;
AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL INB.
JOSE CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE
SUPERVISIÓN.


HUMBERTO FRIEOLA B.

ING. PALMADOR VILLALBA

NOTA #3 28 DE MARZO DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON EL PAVIMEN-
TO DE PIEDRA AHOGADA EN CALLES 2 y 9,
CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$
DE 15 CMS DE ESPESOR EN EL NUEVO POBLADO DE
SANTA MARIA.

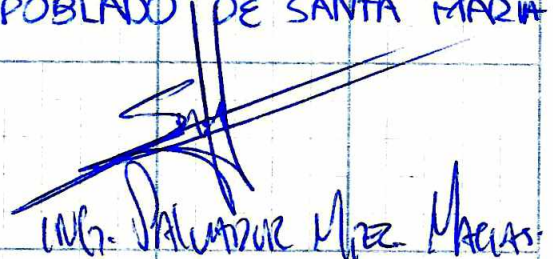
HUMBERTO AREOLA B.


ING. SALVADOR MIER MERA

NOTA #4 04 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LA PAVIMEN-
TACION DE LA CALLE 2, HASTA EL CADENAMIENTO
0+140 y DE LA CALLE 9, HASTA EL CADENAMIENTO
0+103.78, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA.

HUMBERTO AREOLA B.


ING. SALVADOR MIER MERA

NOTA #5 11 DE ABRIL DE 2022
CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS
DE CALAFATEO EN CALLE 2, EN EL NUEVO PO-
BLADO DE SANTA MARIA

HUMBERTO AREOLA B.

ING. JUAN CARLOS VILLALBA MACIAS

NOTA #6 15 DE ABRIL DE 2022
CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS
DE CALAFATEO EN LA CALLE 9, EN EL NUEVO
POBLADO DE SANTA MARIA

HUMBERTO AREOLA B.

ING. JUAN CARLOS VILLALBA MACIAS

NOTA #7 19 DE ABRIL DE 2022.
SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NUMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACION #101 FINIQUITO,
PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

HUMBERTO AREOLA B.

ING. JUAN CARLOS VILLALBA MACIAS

NOTA #08

20 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN
#01 (UNO) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE
\$ 1,370,457,38 IVA INCLUIDO, CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 24 DE MARZO
DE 2022 AL 20 DE ABRIL DE 2022;
CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAI-1803A-2022.

HUMBERTO FREOLA B.

Ing. JUAN CARLOS MORALES

NOTA #9 FECHA 20 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE HACE MENCIÓN DE QUE LOS
REPORTES DE LABORATORIO PRESENTADOS CORRESPON-
DIENTES A 07 Y 14 DIAS YA QUE POR FECHAS, LOS
DEL DIA 28 SE ENVIARAN COMO COMPLEMENTO CUANDO
LOS TENGA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

HUBERTO FREOLA B

W. Salvador Vaz. Méndez

NOTA #10 20 DE ABRIL DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN EN CALLE 2 Y CALLE 9, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,459,845.57 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO CONTRATADO DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 07 DE MAYO DE 2022; DE LA EMPRESA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA ASÍ:

TOTAL DE CONTRATO	\$ 1,459,845.57
SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 1,370,457.38
SALDO A CANCELAR	\$ 89,388.19

HUBERTO FREOLA B.

ING. ~~Samuel~~ Macín
