

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ROQUE SERRANO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR Y CALLE GUILLERMO LAVEAGA, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,
Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. ✓
Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$22,084.35 ✓
Importe del Contrato s/IVA: \$1,520,327.73 ✓
No. Estimación: 3 ✓
Tipo Estimación: Adicional ✓
Periodo del Contrato: 10/03/2023 al 15/05/2023 ✓
Periodo de la Estimación: 30/04/2023 al 06/05/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	22,084.35 ✓
	Total Paquete s/IVA:	22,084.35 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$22,084.35 ✓

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE IASTORGA VANEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Formato para Factura

Municipio: Culiacan
Localidad:
Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. /

Oficio de Autorización:
Periodo Contractual: 10/03/2023 a 15/05/2023 /
Periodo de Estimación: 30/04/2023 a 06/05/2023 /

Domicilio:

C.P.:
Teléfono:
E-mail:
Fax:

No. OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-2023 /
Contrato:

R.F.C.:

Nombre de la Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ROQUE SERRANO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR Y CALLE GUILLERMO LAVEAGA, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA. /

Pago de la Estimación: 3 Adicional /

IMPORTE ESTIMADO SIN I.V.A.:	\$22,084.35 /
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO:	\$0.00
SUBTOTAL:	\$22,084.35 /
16% I.V.A.:	\$3,533.50 /
TOTAL DE ESTIMACION 3 :	\$25,617.85 /

MENOS DEDUCCIONES:

2 AL MILLAR CMIC:	\$0.00
3.00 % S.V.I.C.U.T.	\$662.53 /
0.00 % SUPERVISION DE OBRA	\$0.00
RETENCIÓN POR ATRASO:	\$0.00
DEVOLUCION:()	

PENALIZACION POR ATRASO:	\$0.00
--------------------------	--------

\$662.53 /	\$662.53 /
------------	------------

NETO A RECIBIR:	\$24,955.32 /
-----------------	---------------

CANTIDAD CON LETRA:
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 89/100 M.N. /

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estado de Cuenta (Con IVA)

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-2023

Importe del Contrato: \$1,763,580.17
convenio: \$188,712.94
suma: \$1,952,293.11

No. 3

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
Nombre de PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ROQUE SERRANO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR Y CALLE GUILLERMO LAVEAGA, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN,

Periodo del Contrato: 10/03/2023 a 15/05/2023

Tipo Adicional
Importe \$25,617.85
Periodo 30/04/2023 al 06/05/2023

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

No. Convenio	Periodo del Convenio	Importe c/IVA
No.CONV-01-2023-MI-C0803D-2023		\$188,712.94
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

Oficio Autorización
 SAF-AIP-IED-00-454/2023, FOLIO No SOP/456/2023
 SAF-AIP-IED-00-496/2023, FOLIO No. SOP-DS/669/2024

No. Estimación	Periodo de Estimación		Importe	Amortización	Total	3.00 %	0.00 % Supervision	Total	Líquido a	
				35.00 %						Facturado
1 Normal	10/03/2023	10/04/2023	\$814,711.84	\$285,149.15	\$529,562.69	\$0.00	\$21,070.13	\$0.00	\$21,070.13	\$508,492.56
2 Normal	11/04/2023	29/04/2023	\$923,250.47	\$332,103.91	\$591,146.56	\$0.00	\$23,877.17	\$0.00	\$23,877.17	\$567,269.39
3 Adicional	30/04/2023	06/05/2023	\$25,617.85	\$0.00	\$25,617.85	\$0.00	\$662.53	\$0.00	\$662.53	\$24,955.32
Totales:			1,763,580.16	617,253.06	1,146,327.10	\$0.00	\$45,609.83	\$0.00	\$45,609.83	\$1,100,717.27

Total de Estimaciones c/IVA: \$1,763,580.16
Importe Contrato + Convenios c/IVA: \$1,952,293.11
Saldo por Ejercer c/IVA: \$188,712.95

Total Amortización c/IVA: 617,253.06
Saldo por Amortizar c/IVA: \$0.00
Anticipo c/IVA : \$617,253.06
IVA Anticipos: \$85,138.35

CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE SUPERVISION

LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

ING. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA VAREZ
 SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ROQUE SERRANO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR Y CALLE GUILLERMO LAVEAGA, COLONIA PEMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-

No. Estimación: 3

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA: \$1,520,327.73

Tipo de Estimación: Adicional

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato: 10/03/2023 al 15/05/2023

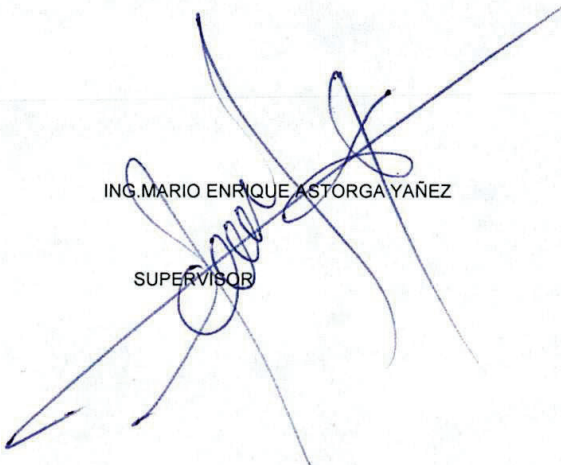
Importe de la Estimación: \$22,084.35


Periodo de la Estimación: 30/04/2023 al 06/05/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación		Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Estimaciones				
PAVIMENTACIÓN											
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO										
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT										
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	132.60	\$3,831.70	132.60	5.76359	138.36	-5.76	\$22,084.35	104.35	%

Total Partida: 22,084.35


 CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
