


NOTA #01

15/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE HABER ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANTERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA TOMA, MUNICIPIO DE RESQUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA EMPRESA CORPORATIVO FINIX S.A DE CV COMO OBRERO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ- PREST-APDA-0805-2023 CON UN IMPORTE DE \$1,689,411.17 LA INCLUIDO Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE MAYO 2023 AL 28 DE JULIO 2023

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS EN CARGADAS DEL USO Y CONTROL DE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA.



MUELACIO PARRA PULIDO  
RESPONSABLE DE SUPERVISION  
OBRAS PUBLICAS.

NOTA #02

15/MAYO/2003


CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA DADA DE NOTIFICAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, NOTOS OFICIOS SERNY DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, ING JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DE ACUERDO A LA CLAUSELA QUINTA DE ESTE CONTRATO.



NOTA #03

15/MAYO/2003

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS CON UBICACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS.




NOTA #04

16/MAYO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC AGUA POTABLE Y EXCAVACION PARA GALERIA FILTRANTE.

Uso



NOTA #05

26/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC AGUA POTABLE, EXCAVACION PARA GALERIA FILTRANTE, Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CIMBRIA Y HABILITADO DE ALERO PARA COCADO DE ANILLOS DE GALERIA FILTRANTE CON CONCRETO  $F'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ , DOBLE DE ALTURA EN GALERIA.

Uso



NOTA #06

08/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE, COLADO DE ANILLOS DE GALERIA Y BOMBEO DE ALTIQUE EN GALERIA.

V

Q

NOTA #07

19/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA TERMINA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC Y GALERIAZADO AGUA POTABLE EXCAVACION PARA GALERIA, COLADO DE ANILLOS, BOMBEO DE ALTIQUE Y TAPADO DE GALERIA.

V

Q

NOTA # 08

27/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA  
NUMEROS GASTADORES CORRESPONDIENTES AL  
PERIODO DE EJECUCION DEL 8 15 DE MAYO  
2023 AL 30 DE JUNIO 2023 PARA SU  
REVISION Y/O AUTORIZACION.

N/A




NOTA # 09

30/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA  
RENTACION #01 NORMAL CON PERIODO DEL  
15 DE MAYO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023 Y  
UN IMPORTE DE \$ 1,176,264.49 IVA INCLUIDO  
PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

N/A




NOTA # 10

04/JULIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON  
LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION  
DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE,  
VALVULA COMPUERTA, VALVULA DE ADMISION Y  
EXPULSION DE AIRE.

Ch




NOTA # 11

11/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA CONS-  
TRUCCION DE CASITA DE OPERACION.

SE TERMINA CON LOS TRABAJOS DE ARMARLOS  
HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO.

Ch



NOTA # 12

18/JULIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA  
NORMAS GUAYABOORMS CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE  
JULIO 2023 AL 20 DE JULIO 2023 PARA SU  
REVISION Y/O AUTORIZACION.

N/A




NOTA # 13

20/JULIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA  
ESTIMACION # 02 NORMAL CON PERIODO DEL:  
01 DE JULIO 2023 AL 20 DE JULIO 2023 Y  
UN IMPORTE DE \$ 331,289.76 LA INCLUIDO  
PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

N/A



NOTA # 14

22/JULIO/2023

CON NOTA FINAL SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN BARRIO FILANTRÓFICO.

\*- CARGA DE MALLA DE ALAMBRE.



\*- SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMODACION MULTIVIDA.

\*- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLADO DE CONTROL.

\*- SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE BANDA TRANSMISION.

\*- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTULO DE OBRA.


V

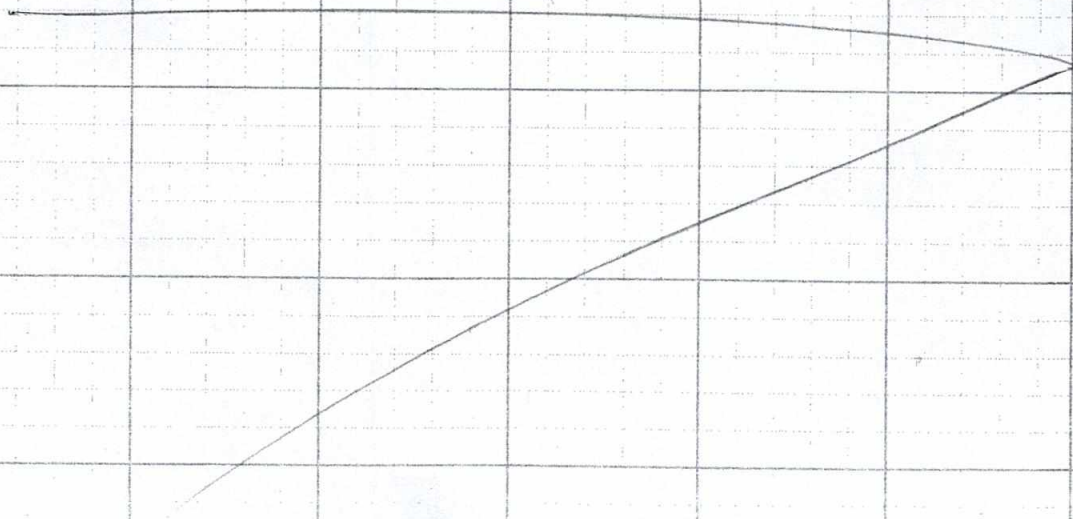

NOTA # 15

26/JULIO/2023


SE PERMITE AUMENTAR EMPLERADOS  
POR PARTE DE LA CONTRATA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DEL:  
21 DE JULIO DEL 2023 AL 28 DE JULIO DEL:  
2023 PARA SU OBRACION Y/O AUTORIZACION



NOTA # 16

28/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA RESTI-  
TUACION #03 FINALIZADO CON PERIODO  
DEL: 21 DE JULIO DEL 2023 AL 28 DE  
JULIO DEL 2023 CON UN IMPORTE DE:  
\$135,408.37 IVA INCLUIDO.



NOTA # 17

28/AUGUSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LIQUIDA ESTA LIBRO DE BITACORA, DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION DE ANTERIA FILTRANTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE MESQUITA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. OPPO-KST-A03-ADDA-0805-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,689,411.17 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 26 DE JULIO DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A LA EMPRESA CORPORATIVO FENIX, SA DE CV.

QUEDANDO EL FINANCIO DE LA SIGUIENTE MANERA.

Monto Contratado \$ 1,689,411.17 IVA  
Suma de Retenciones \$ 1,642,962.61 IVA  
Saldo a cancelar \$ 46,448.56 IVA  
Sumas iguales \$ 1,689,411.17 IVA

