

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR DE ALTA EL CONTRATO N° OPPU-EST-LP-EST-APDA-1008-2022 DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPANIA MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MANUEL IGNACIO PEREZ CASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA". A QUIEN SE LE ENCOMIENDA LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DEL SECTOR MAGISTERIAL - PRIMERA ETAPA - EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOLUE, ESTADO DE SINALOA, POR UN MONTO TOTAL DE \$10'300,528.92, SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N. YA CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUIDO EN ESTE MONTO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

ESTA SUPERVISION HACE ENTREDA DEL LUGAR DONDE SE DEBERA LLEVAR A CABO ESTA OBRA QUE ES EN LAS FAUCAS DEL CERRO DE LA MEMORIA.

EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION EL OFICIO DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA Y TAMBIEN PRESENTA EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE PARA ESTA OBRA SIENDO EL ING. JAIR PACHECO SERRANO CON CEDULA PROFESIONAL N° 7457379 QUE LO ACREDITA COMO LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL Y POR LO TANTO SERA QUIEN PODRA Y DEBA LLEVAR A CABO TODAS LAS AMOTACIONES CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE EJECUCION DE ESTA OBRA, JUNTO CON ESTA SUPERVISION Y FIRMAN AL PIE DE ESTA HOJA DE APERTURA DE ESTA BITACORA DE OBRA

POR LA CONTRATISTA


POR LA SECRETARIA



ING. JAIR PACHECO SERRANO
SUPERINTENDENTE

ING. ARO. JOSÉ ROSARIO VÁZQUEZ ARANGO

NOTA N° ① SE LLEVA A CABO UN RECORRIDO POR EL LUGAR CON EL SUPERINTENDENTE Y ESTA SUPERVISION PARA HACER ENTREGA OFICIAL DEL LUGAR Y SE PUEDAN LLEVAR A CABO LOS PRIMEROS TRABAJOS DE TRAZO Y COLOCACION DE NIVELES, YA QUE SE CUENTA EN EL LUGAR CON EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y SE DA POR INICIADA CON ESTA FECHA QUE ES LA SEÑALADA EN CONTRATO.
SE CUENTA EN LA OBRA CON TRACTOR SOBRE ORUGA PARA LLEVAR A CABO EL DESMONTE DEL AREA DE TRABAJO.






NOTA N° ②

25/08/2022

HOY SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO COMO SE ESTA TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA Y DESPLANE DEL AREA DE TRABAJO, INICIANDO CON LAS EXCAVACIONES CON EXCAVADORA CATERPILAR 325 B, UNA RETROEXCAVADORA CASE, UNA PIPA Y CAMIONES DE VOLTEO.



EN ESTAS PRIMERAS EXCAVACIONES SE HACE LA OBSERVACION POR ESTA SUPERVISION QUE NO HAY PIEDRA SUFICIENTE PARA FORMAR EL CANAL COMO LO MARCA EL PROYECTO, POR LO QUE SE LE SOLICITA AL ING. DEWESKIN, QUIEN HIZO EL PROYECTO VER QUE OTRA OPCION SE PUEDE LLEVAR A CABO.

NOTA N° ③

31/08/2022


DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL CERRO, SOBRE EL TRAZO PROYECTADO, NO SE HA DADO SOLUCION POR PARTE DEL PROYECTISTA POR LA FALTA DE PIEDRA EN EL LUGAR.

FECHA 07 09 2022

3

NOTA N° ④ AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE VER COMO SE LLEVA UN BUEN AVANCE Y SE HA HECHO UNA NUEVA PRO- PUESTA POR PARTE DEL PROYECTISTA PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL CANAL A CIELO ABIERTO DE DRENJE PLUVIAL, QUE SERA CON UN MURO DE CONCRETO SIMPLE QUE NOS SERVIRA DE CONTENSION PARA FORMAR EL CANAL CON UN RE- LLENO DE BASE PARA FORMAR LOS TALUDES Y LUEGO PONER MALLA- LAC PARA COLARSE CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBADO.

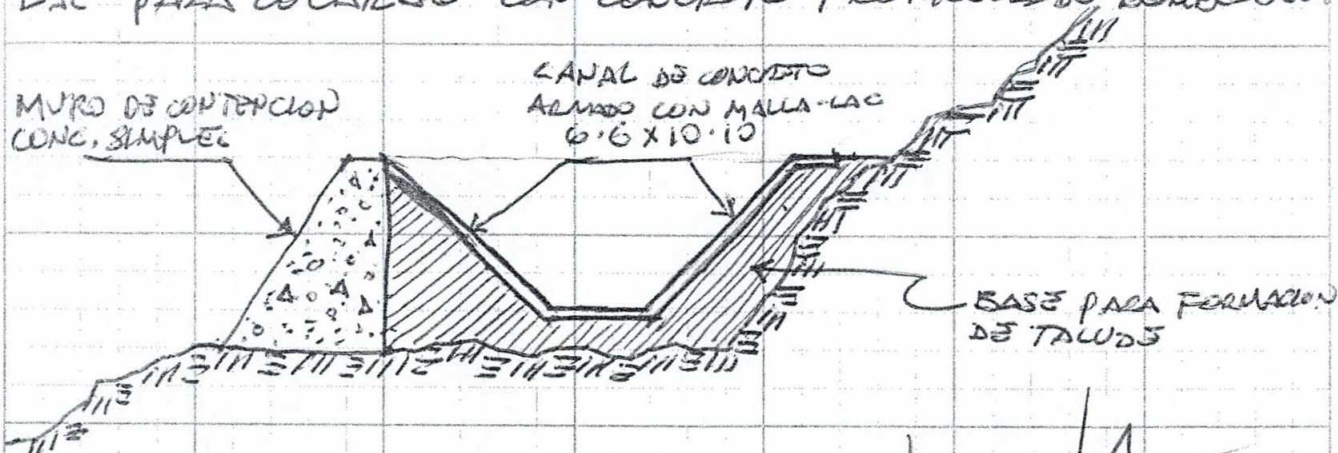

NOTA N° ⑤

14/09/2022

CON EL CAMBIO DE PROYECTO SE PUEDE VER POR ESTA SUPER- VISION, QUE AUMENTARAN ALGUNOS VOLUMENES Y HABRA CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA CON- TRATISTA QUE SE ELABORE AL MENOR TIEMPO POSIBLE EL COM- PARATIVO Y LA SOLICITUD DE ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS CON SUS RESPECTIVOS PRECIOS UNITARIOS.



PARA QUE HAYA UN CONVENIO ADICIONAL A LA BREVEDAD Y SE PUE- DAN LLEVAR A CABO TODOS LOS TRABAJOS.

Lg

R. [signature]

NOTA N: (6) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE OBSERVAR COMO YA SE ESTO TRABAJANDO EN LA EXCAVACION PARA DAR LA PROFUNDIDAD A LO QUE SERA EL CANAL A CIELO ABIERTO PARA EL DRENAJE PLUVIAL QUE CAPTARA TODA EL AGUA QUE BAJA DEL CERRO HACIA LA COLONIA MAGISTERIAL, QUE ES LO QUE SE EVITARA CON ESTOS TRABAJOS.

SE HA CERRADO EL ARRASTRE QUE LLEVA EL FONDO DE ESTE CANAL EN CONTRAMANDONOS QUE HAY UN TUBO DE ABASTO DE MAS DE 24" DE AGUA POTABLE QUE BAJA DEL TANQUE RECIVADO DEL CERRO HACIA EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD, POR LO QUE SE TENDRA QUE HACER EL REFORZAMIENTO ANTES DE LAS ESCALERAS PARA SUBIR A LA PORGOLA Y NO DESPUES COMO VENIA EN EL PROYECTO ORIGINAL.






NOTA N: (7)

26/09/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N: (1) INICIAL NORMAL POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1'635,614.10; SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 10/100 M.N., LA ESTIMACION N: (2) ADICIONAL POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1'010,795.67; SON: UN MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. Y LA ESTIMACION N: (3) EXTRAORDINARIA POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE \$2'168,158.12; SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N. TODAS CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NOTA: CONVENIO EN TRAMITE.

NOTA N°(8) CON ESTA FECHA SE ELABORA ESTA
NOTA PARA CORRIGIR DE LA NOTA N°(7) DE LA
PAGINA ANTERIOR DE ESTA BITACORA Y CON FECHA 26
DEL/09/2022 EL MONTO DE LA ESTIMACION N°(3)
EXTRAORDINARIA, YA QUE SE REPORTO CON UN SALDO NETO
POR PAGAR DE \$ 2'168,158.12; DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
12/100 M.N. Y DEBE SER DE \$ 2'077,302.81; SON:
DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOS
MIL PESOS 81/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS
CORRESPONDIENTES APLICADOS

NOTA: CONVENIO EN TRAMITE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

NOTA N° (9) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA OBSERVANDO COMO SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMENTA PARA EL COLADO DEL MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO SIMPLE BOMBABLE, TAMBIEN SE CONTINUA CON EL TRAZO Y COLOCACION DE NIVELES.


TAMBIEN SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE LA ULLA VIA DONDE SE VAN A LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LAS REJILLAS Y EN LOS ACARREOS PARA EL RETIRO EN CAMION DEL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA.

NOTA N° (10)

18/10/2022

DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APRECIA COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DEL CANAL, DONDE TAMBIEN YA SE TIENE COLADO BUEN TRAMO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y SE ESTA METIENDO MATERIAL DE BASE PARA LUEGO COMPACTAR Y DESPUES EXCAVAR PARA LA FORMACION DE LOS TALUDES PARA EL COLADO DEL CANAL.

NOTA N° (11) SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL CANAL A CIELO ABIERTO DONDE YA SE TIENE COLADO MAS DE 200.00 ML DEL MURO DE CONTENCIÓN QUE ES DE 1.30 MTS. DE ALTURA POR 0.95 MTS. DE BASE MAYOR Y 0.30 MTS. DE BASE MENOR DE CONCRETO SIMPLE BOMBEO PREMEZCLADO DE $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$ CON AGREGADO MAXIMO DE $3/4"$. CIMBRA COMUN.

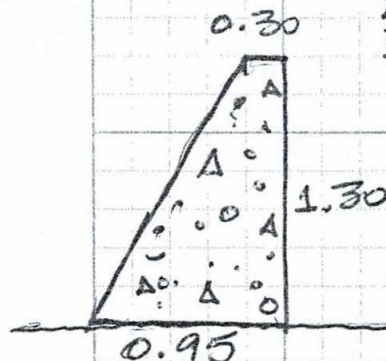

TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LAS REJILLAS SOBRE LA CARRETERA DE SUBIDA AL CERRO Y CON LOS RELEVOS Y COMPACTACION PARA LA FORMACION DE TALUDES PARA EL CANAL A CIELO ABIERTO.

[Signature]

[Signature]


07/11/2022

NOTA N° (12) Hoy se lleva a cabo la visita a esta obra donde se observa como se continua trabajando en la construcción del muro de contención, relevos y compactación para el canal, el cual cuenta con varios metros colados, el convenio para la ejecución de estos trabajos ya se encuentra en trámite y tambien se solicitara un convenio de tiempo para terminar esta obra ya con todos los cambios efectuados no se podrá terminar en la fecha contratada

[Signature]

[Signature]

NOTA N° (13) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE OBSERVA MUY BUEN AVANCE EN EL COLADO DEL CANAL (COLECTOR PLUVIAL) EL CUAL SE ESTA COLANDO DESPUES DE FORMAR LOS TALUDES, ARMAR CON MALLAS $6 \times 6 \times 10 \times 10$ Y COLOCAR FORMAS METALICAS PARA FORMAR LOS TALUDES CON EL CONCRETO PREMOZCLADO BOMBEEABLE DE $F'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$ DE 10 CMS DE ESPESOR

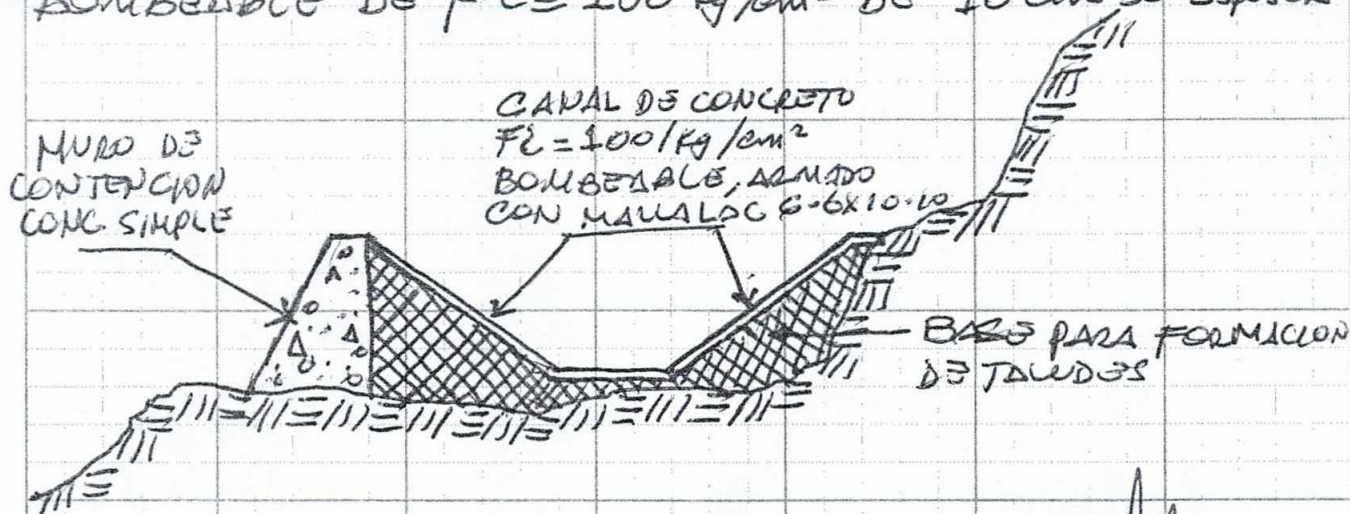

LA

Raluz

NOTA N° (14) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION N° (4) NORMAL POR UN MONTO TOTAL NETO Y LIQUIDO A PAGAR POR \$ 1'363,594.16; SON: UN MILLONO TRESCIENTOS SOSENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ~~NOVENA~~ NOVENA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, REVISADA SE FIRMA LA PRESENTE PARA SU TRAMITE Y PAGO.

17/11/2022

LA

Raluz


NOTA N° (15) ESTE DÍA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO COMO SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DEL CANAL, CON LA FORMACION DE TALLERES COLOCACION DE FORMAS METALICAS, LA MALLALAC 6.8 x 10.10 Y COLANDO LOS TALLERES Y EL FONDO DEL CANAL, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LAS REJILLAS Y SE INICIA LOS TRABAJOS DE HECURA DE ESCALONES Y MUROS LATERALES CON PIEDRA DE CERCA EN LLEGADA AL CANAL.

SE CUENTA CON UN AVANCE APROXIMADO DEL 55%






02/12/2022

NOTA N° (16) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE PUEDE VER POR ESTA SUPERVISION COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HECURA DE CANAL Y TAMBIEN COMO SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LAS REJILLAS, LAS ESCALINATAS (ESCALONES CON MUROS LATERALES PARA LLEGADA AL CANAL

12/12/2022

NOTA N° (17) HOY SE VISITA LA OBRA PUDIENDO OBSERVAR COMO SE CONTINUA CON TODOS LOS TRABAJOS, PERO SE TENDRA QUE SOLICITAR UN CONVENIO DE TIEMPO TAMBIEN PORQUE LOS TRABAJOS SE ATRAZARON POR LOS CAMBIOS AL PROYECTO, SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA QUE LO SOLICITE A LA BREVEDAD.


NOTA N° (18) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE VE BUEN AVANCE DE LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO, TENEMOS AVANCE APROX DE 65% ITENOMOS CONCEPTOS CON TRABAJOS EN CANTIDADES ADICIONALES Y TAMBIEN SE ESPERA LA AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS QUE DEBERAN VENIR EN CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE Y ESPECIAL DE N° CONV-01-2022-MIE-C1008-2022 DE ESTE CONTRATO QUE AMPARA ESTA OBRA.

26/12/2022

NOTA N° (19) SE VISITA LA OBRA ESTE DIA APRECIANDO COMO YA SE TIENE EL CANAL A 35.00 M.L. PARA LLEGAR A LA NUEVA UBICACION DEL RESERVAIRO ANTES DE LA ESCALERA DE SUBIDA A LA PERGOLA POR EL TUBO DE AGUA POTABLE QUE BAJA DEL TANQUE ELEVADO HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD, SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE LAS 2 REJILLAS MAS ALTAS, LA MAS BAJA YA QUEDO TERMINADA, EN EL CRUCE DE LA CICLOPISTA Y LA CARRETERA DE SUBIDA AL CERRO.

NOTA N° (20) ESTA SUPERVISION VISITA LA OBRA ESTE DIA PUDIENDO VER COMO YA SE COLANDO LOS ULTIMOS METROS DEL CANAL PARA LLEGAR AL AREA DEL RESERVOIRIO, DONDE YA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA EXCAVACION EN PIEDRA PARA ABIR CAVA PARA DARLE PROFUNDIDAD EN UN AREA APROXIMADA DE 10 X 15 MTS.

TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LAS 2 REJILLA DE LA PARTE MAS ALTA Y LOS ESCALONES CON MUROS LATERALES DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE CERRO TAMBIEN YA SE ENCUENTRAN TERMINADAS TRES PIEZAS, 2 QUE DESCARGAN AL CANAL Y LA DE LA REJILLA DE MAS ABAJO LA QUE YA ESTA TERMINADA.

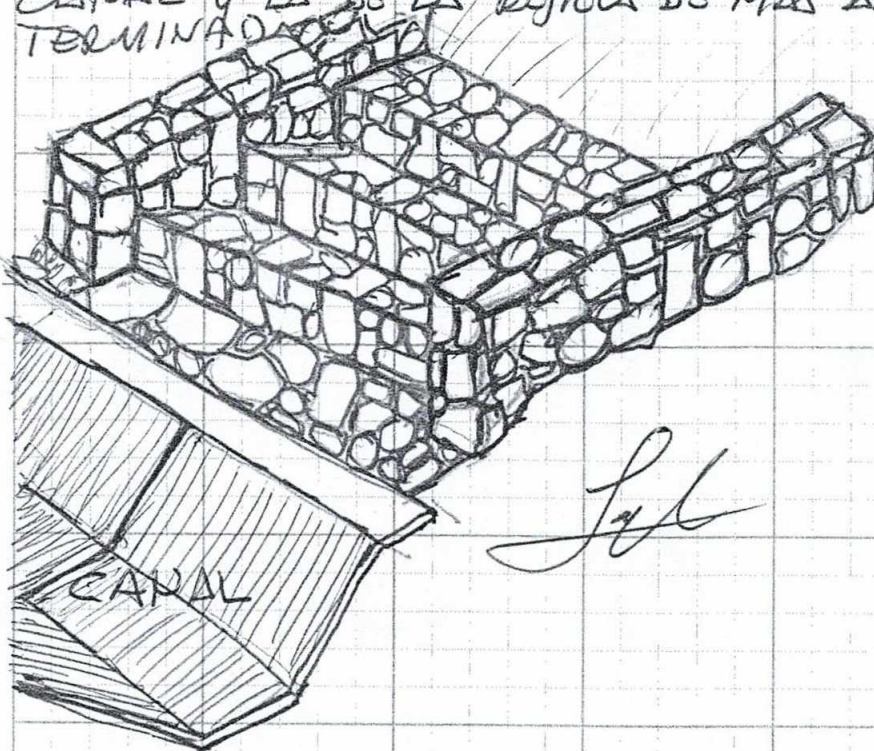

Signature

Signature

09/01/2023

NOTA N° (21) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (5) ADICIONAL POR UN MONTO TOTAL A PAGAR DE \$271.354,75; SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N., YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISÓ Y SE FIRMA PARA SU PAGO.

Signature

Signature

NOTA N° (22) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE YA SE TIENE BUEN AVANCE EN LA EXCAVACION EN PIEDRA CON RETROEXCADORA CON ROTOMARTILLO EN EL AREA DEL RESERVOIRIO, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LAS REJILLAS DE CARRETERA ARRIBA, TAMBIEN SE ESTAN TERMINANDO LAS ESCACERAS CON MUROS LATERALES PARA DESCARGAS DE AGUA CON MAMPOSTO CON PIEDRA DE CERRO, EL CONVENIO DE TIEMPO SE ENCUENTRA EN TRAMITE

[Signature]

[Signature]

29/01/2023

NOTA N° (23) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE VER COMO YA SE TIENE TERMINADA LA EXCAVACION DEL RESERVOIRIO Y SE ESTA TRABAJANDO EN EL AFINE DE TALUDES PARA COLOCAR MALLAS 6.6 X 10.10 Y CUBRAR PARA COLAR TAMBIEN YA SE TERMINO LA REJILLA INTERMEDIA, FALTANDO LA DE MAS ARRIBA QUE YA ESTA CARI AL 80%

[Signature]

[Signature]

07/02/2023

NOTA N° (24) SE VISITA LA OBRA POR ESTA SUPERVISION OBSERVANDO ESTE DIA COMO YA SE TIENE COLADO PARTE DEL FONDO DEL RESERVOIRIO Y EL MURO (TALUD) DEL LADO ORIENTE HACIA LA PENDIENTE DEL CERRO CON CONCRETO FIC = 150 kg/cm² PRUEBAZADO BOMBABLE, LA OBRA GENERAL PRESENTA UN AVANCE APROXIMADO DEL 85%

[Signature]

[Signature]

FECHA 17 02 2023

13

NOTA N° (25) AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA ESTA SUPERVISION PUEDE APRECIAR COMO YA SE TERMINO LA REJILLA QUE FALTABA Y SE ESTAN HACIENDO LOS ESCALONES CON MUROS LATERALES MAMPOSTEROS CON PIEDRA DEL CERRO, TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS COLADOS DE TALUDES EN EL RESERVOIRIO

28/02/2023

NOTA N° (26) CON ESTA FIRMA SE VISITA LA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE TERMINO LAS ESCALINAS DE PIEDRA DEL CERRO (MAMPOSTEROS) EN LA ULTIMA REJILLA QUE FALTABA Y LAS QUE DESCARGAN AL CANAL TAMBIEN EN EL RESERVOIRIO NO SE HA TERMINADO LA ESQUINA SUR PONIENTE QUE POR DONDE SE VA A CONECTAR EL TUBO DE DESCARGA HACIA LA CALLE PORQUE NO HA LLEGADO LA CONEXION QUE SE VA A PONER AHI.

03/03/2023



NOTA N° (27) ESTE DIA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° 6 EXTRAORDINARIA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2023 POR UN MONTO TOTAL A COBRAR LIQUIDADO POR \$ 696,849.09; SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.P., YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, SE REVISÓ Y SE FIRMA PARA SU PAGO LA OBRA PRESENTA UN 95% DE AVANCE.

NOTA N° (28) ESTA NOTA ES PARA SUSTITUIR LA NOTA N° (21) TENIA UN MONTO A PAGAR DE \$ 271,354.⁷⁵; SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. Y CAMBIO A UN MONTO TOTAL A PAGAR LIQUIDO DE \$ 271,340.³⁰; SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 30/100 M.N.

~~---~~
~~---~~
~~---~~

~~Plaza...~~
~~---~~
~~---~~

NOTA N° (29) CON ESTA NOTA SE SUSTITUYE LA
NOTA N° (27) REFERENTE A LA ESTIMACION N° (6) EXTRA
ORDINARIA QUE LLEVABA UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PA-
GAR POR \$696,849.09; SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.
POR UN ERROR DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, DEBIENDO
SER EL MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR REAL POR LA
CANTIDAD DE \$1'048,199.09; SON: UN MILLÓN CUARENTA
Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.



NOTA N° (30) SE VISITA LA OBRA CON ESTA FECHA Y SE PUEDE VER COMO YA HA QUEDADO COLADO TODO LO QUE ES EL RESERVOIRIO Y SE AUNDA HACIENDO COR-
TES EN PISO Y TALUDES PARA CALAFATEAR, EN TO-
DO LO QUE ES EL CANAL YA QUEDO TERMINADO.

TAMBIEN LOS ESCALONES DE PIEDRA MAMPUESTADA DEL CARRO HAN QUEDADO TERMINADOS, EN LAS AVENIDAS.
ESTA SUPERVISION SOLICITA A LA CONTRATISTA HACER LIMPIEZA AL REDEDOR DE LA OBRA Y RETIRAR EL EQUIPO QUE YA NO SE OCUPE.

LH

~~Raluyub~~ ★

15/03/2023
NOTA N° (31) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE TIENE TODA EL AREA DESPEJADA Y LIMPIA, SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PARA LA DESCARGA DEL RESERVOIRIO HACIA LA CALLE DONDE TODO SERA ENTUBADO Y ENCOFRADO CON CONCRETO ARMADO CON MALLA 12C

LH

~~Raluyub~~ ★

17/03/2023
NOTA N° (32) CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (7) NORMAL, LA CUA SE REVISY SE FIRMA, SIENDO POR UN MANTO TOTAL DE TO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 334,115.12; SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS 12/100M.N. YA CON TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS

LH

~~Raluyub~~ ★

