

OPPU-EST-ADI-PEST-APDA-0703E-2022.

NOTA NO. 7 14/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADI-PEST-APDA-0703E-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE OBRA ELECTRICA, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE POTOPLAST Y FLAUTA DE SALIDA EN LA LOCALIDAD DE LOS NARAJOS, SINDICATURA DE ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO DE BADIAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: DESARROLLADORA TREC, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. CINTHIA MARLENE PEREZ LOPEZ

MONTO DE CONTRATO: \$ 764,480.07 (INCL. IVA)


PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 14/MARZO/2022

TERMINO: 14/MAYO/2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. MARIO ENRIQUE ASTORGA GARCIA COMO PRESIDENTE DE OBRA, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP 0440-A-2022. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. EDGAR ERNESTO RODRIGUEZ GARCIA, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



CONT-0703E-2022

NOTA NO.2 14/MARZO/ 2022

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION EL INMUEBLE, AL CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-DI- 0440-2022.

NOTA NO.3 14/MARZO/ 2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE DARA INICIO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA QUE SEA DEPOSITADO EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

NOTA NO.4 24/MARZO/ 2022.


NOTIFICA LA CONTRATISTA, QUE DA INICIO FORMAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN VIRTUD DE QUE YA LE FUE PAGADO EL ANTICIPO.

NOTA NO.4-A 24/MARZO/ 2022.

SE CANCELA LA NOTA NO.4 DE FECHA 24/MAR/ 2022 EN VIRTUD DE QUE EL PERIODO DE INICIO QUEDARA CON FECHA 14/MARZO/ 2022.

NOTA NO. 5 31/MARZO/2022.
PARA ESTA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 50%
DE TUBO GALVANIZADO CED. 40 $1\frac{1}{2}$ " ϕ DIAM.


SE TRABAJA EN LA CASITA DE CONTROLES DE 1.95 X 0.8
Y 2.0 mts. DE ALTURA.



NOTA NO. 6 05/ABR/2022.



PARA ESTA FECHA ESTA CONCLUIDA LA ESTRUCTURA
DE PASO DE MANGUERA SOBRE EL ANCHOYO, MISMA
QUE CONSISTE EN ZAPATA AISLADA, DADO DE CONCRETO
DE 0.30 X 0.30 mts. 1.50m ALTURA, INCL. TUBO DE
ACERO DE 6.0 mts. X 3" ϕ , AHOGADO EN EL DADO.
DOS INVERTOS PARA TENSAR 60 mts. DE CABLE
DE ACERO $\frac{1}{2}$ " ϕ .

EL TUBO GALVANIZADO CED. 40 DE $1\frac{1}{2}$ " ϕ . AL 100%.





NOTA NO. 7 11/ABR/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE TERMINADA LA CASITA
DE CONTROLES, EL CRUCE SUBTERRANEO DE TUBERIA EN
LA CARRETERA BGTO-PARRAL, CAMINO DE ACCESO
PARA COLOCAR TINACO.



NOTA NO. 8 14/ABR/2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO EL TINACO FOTO-PLAS DE 10,000.0 LTS. ASI COMO SE FRACTA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA LOS USUARIOS.






NOTA NO. 9 18/ABR/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOME PC UNO, NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 24/MARZO/2022 AL 14/ABRIL/2022. A CONTINUACION SE AGOTA SU DESGLOSE.

IMPORTE TOTAL	\$ 427,465.72.
AMORT. ANTICIPO	\$ 149,613.00
DEDUCCIONES CONTRATO	\$ 11,055.15

Liquidado a pagar	\$ 266,797.57.
-------------------	----------------

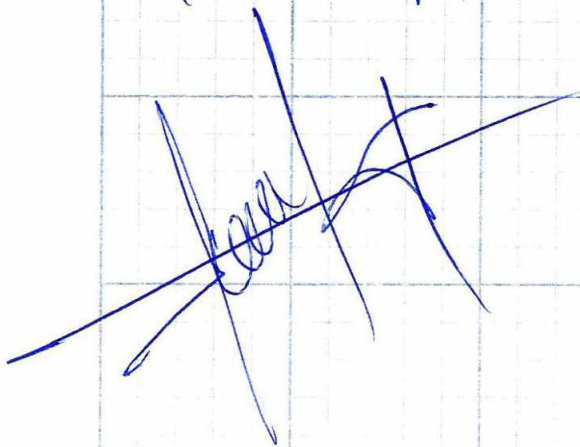

NOTA NO. 10 29/ABRIL/ 2022

SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES EN VIRTUD DE QUE NO FUERON CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO DE CONTRATO Y QUE SON NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROYECTO. POR OTRA PARTE DICHAS CANTIDADES ADICIONALES NO MODIFICAN EL MONTO AUTORIZADO.

NOTA NO. 99 02/MAYO/ 2022.

PARA ESTA FECHA SE HA COLOCADO LA BOMBA DE ENERGIA SOLAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. TAMBIEN SE HA COLOCADO EL CERCO DE ALAMBRE PARA LA PROTECCION DE PANELES SOLARES. SE TIENE COLOCADO TODO EL ARREGLO HIDRAULICO QUE VA UNIDO A LA BOMBA. LOS PANELES SOLARES SE COLOCARON SOBRE UN FILLOPE DE CONCRETO.

NOTA NO. 12 03/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NO. DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15/ABRIL/2022 AL 02/MAYO/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 256,973.65
AMORTIZACION	\$ 117,955.01
DEDUCC. CONTRATO	\$ 6,645.87
LIQUIDO A PAGAR	\$ 132,372.77

NOTA NO. 13 14/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO LOGRANDOSE LAS METAS DE PROYECTO, EN EL CUAL SE TUVIERON CANTIDADES ADICIONALES EN LAS PARTIDAS QUE CONTINUACION SE DESCRIBEN: CESTA DE OPERACION, ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION A TANQUE ROTOPLAST, PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION.

NOTA NO. 14 14/MAYO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES DEFINITIVO, CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 03/MAYO/2022 AL 14/MAYO/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 80,018.35

AMORT. ANTICIPO \$ 00.00

DEDUC. DE CONTRATO \$ 2,069.44

LIQUIDO A PAGAR \$ 77,948.90

SALDO A CANCELAR \$ 22.35

NOTA NO. 15 15/MAYO/2022.

NOTA DE CIERRE DE BITACORA.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, HABIENDO CUMPLIDO CON LAS METAS DEL CONTRATO Y ENTREGADO AL ORGANISMO OPERADOR.
