


NOTA#1 Con esta fecha se abre bitácora para la obra Pavimentación en la calle Alamos entre Av. Prof. Jose Remon Diaz Franco y Av. Lazaro Corderas en la colonia 6 de Enero en el Municipio de Culiacan Estado Sinaloa.

- Numero Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2507A-2022
- Fecha de contrato: Fecha inicio 26 Julio 2022
Fecha de Termina 24 Agosto 2022
- Importe de Contrato: \$ 732,180.11 clavo.
- Contratista: Miguel Diaz Campos.
- Supervisor S.O.P. Ing. Alejandro Sainz Sanchez
- Residente de Obra Contratista: Ing. Jose Alejandro Gonzalez Gonzalez

- Con este fecha se hace el recorrido con el residente de obra del contratista Ing. Jose Alejandro Gonzalez, Ing. Alejandro Sainz Sanchez, haciendo el recorrido por el tramo a pavimentar, se encuentra que no hay ningun problema para iniciar los trabajos de pavimentacion. por lo tanto esta supervision de S.O.P. le hace la entrega para dar inicio a los trabajos de pavimentacion.




Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Jose Alejandro Gonzalez G.
Residente Obra Contratista

NOTA #2 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continúan los trabajos de colocación de tubos de 8"
- Se hace los trabajos de relleno material inerte limo
- Se inician los trabajos de registro sanitarios.
- Se inician los trabajos de apertura de caja por los trabajos terrestres

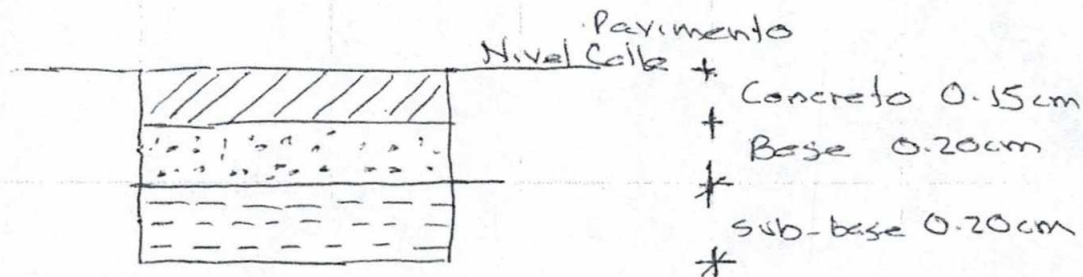


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor. S.O.R.


Ing. Jose Alejandro Gonzalez G.
Residente Obra Contratista.

10 Agosto 2022
NOTA #3 En Supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se inician y continúan los trabajos de suministro y compactación de sub-base y base
- Se continúan los trabajos de instalación eléctrica, Sistema de tierras, cable XLP 2+1 cel. y subterráneo, Registros prefabricados 40x40, poliducto Narenga 1 1/2"





NOTA #4 Con esta fecha se entrega la estimación número uno; cobrandose los siguientes portales.

- Pavimentación concreto Hidráulico		
Preliminares	- - - - -	\$ 20,415.60
Obra Civil	- - - - -	\$ 20,439.76
Concreto Hidráulico	- - - - -	\$ 150,437.95
Obras Viales	- - - - -	\$ 98,716.48
Banquetas Guardacuerpos y Onda	- - -	\$ 7,067.20
- Alumbrado		
Inst. Eléctrica	- - - - -	\$ 134,243.15
- Agua Potable		
Preliminares	- - - - -	\$ 10,355.56
Agua Potable	- - - - -	\$ 20,696.59
Señalización	- - - - -	\$ 128.52
- Drenaje		
Preliminares	- - - - -	\$ 18,634.64
Obra Civil	- - - - -	\$ 16,823.62
Agua Potable	- - - - -	\$ 2,217.45
Alcantarillado	- - - - -	\$ 65,945.34
Señalización	- - - - -	\$ 188.14

Subtotal \$ 566,097.02

I.V.A 16% 90,575.52

Total \$ 656,672.54


 Ing. Alejandro Sainz Sanchez
 Supervisor S.O.P.


 Ing. Jose Alejandro Gonzalez G.
 Contabilista.

NOTA#5 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- se determinen los trabajos de colado de losa de concreto de 15 cm de espesor resistencia $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$
- se determinan los trabajos de instalacion electrica (Registros, bases para postes,
- se continuan los trabajos de colado de banquetes.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jos Alejandro Gonzalez G.
Residente Obra Contratista

27 AGOSTO 2022

NOTA #6 con esta fecha se concluyen los trabajos de Pavimentación en la calle alamos entre Av. prof. Jose Ramon Dias Franco y Lazaro Cardenas en colonia 6 Enero, quedando ejecutados todos los Trabajos al 100%.


- Se entrega la estimacion numero Dostinguido cobrandose las siguientes partidas

- Extraordinarias - - - - - \$ 57,186.52 s/iva

- Quedando un saldo por ejercer \$ 7,906.23 s/iva.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Jose Alejandro Gonzalez G.
Contratista

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta bitacora

