

CONTROL DE ESTIMACIONES

PERAZA CONSTRUCCIONES

HUGOMAR PERAZA PONCE

CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	Estimacion 1 (UNO)	
Periodo de la estimacion	07/11/2022	al	25/11/2022	Localidad PIAXTLA DE-ABAJO, SAN IGNACIO, SINALOA	No. De contrato FISMDF-AD-009-2022
Periodo de Ejecución	07/11/2022	al	10/12/2022		
Importe del contrato con I.V.A.:	Descuentos:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 344,176.22	0.00 %	\$ 296,703.64	\$ 120,461.67	\$ 103,846.27	72.72%
					% Avance Total 72.72%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 215,751.46 16 % I.V.A (+) \$ 34,520.23 Sub- Total A (=) \$ 250,271.69	ESTA ESTIMACION \$ 250,271.69
\$ 120,461.67	Amortizacion Anticipo 35% \$ 103,846.27 16 % I.V.A (+) \$ 16,615.40 Total (=) \$ 120,461.67	ACUMULADO ANTERIOR \$ -
AMORTIZACION ANTERIOR		
\$ -	Importe TOTAL \$ 111,905.19 16 % I.V.A (+) \$ 17,904.83 Total (=) \$ 129,810.02 CMIC 0.2% (-) 0.00 S.V.I.C. 3% (-) 6,472.54 Total Deducciones (=) \$ 6,472.54	TOTAL ACUMULADO. \$ 250,271.69
TOTAL AMORTIZADO		
\$ 120,461.67	Importe T O T A L \$ 123,337.48	CONTRATADO \$ 344,176.22
ANTICIPO OTORGADO		
\$ 120,461.67	NETO A PAGAR \$ 123,337.48	SALDO \$ 93,904.53
SALDO DEL ANTICIPO	Son CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.	
-\$ 0.00		

POR LA CONTRATISTA  ING. HUGOMAR PERAZA PONCE	REVISO  ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ SUPERVISOR DE OBRA
AUTORIZO  ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	

PERAZA CONSTRUCCIONES
HUGOMAR PERAZA PONCE
 CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
 MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022

UBICACIÓN: LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)


IMPORTE: \$

344,176.22

HOJA 1 DE 1
 FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

PARTIDA	IMPORTE
010101 PRELIMINARES	2,270.38
010102 LOSA Y AZOTEA	209,813.55
010103 ELECTRICA	2,273.92
010104 VARIAS	1,393.61
	SUB-TOTAL
	215,751.46
	16% I.V.A.
	34,520.23
	TOTAL
	250,271.69


 ING. HUGOMAR PERAZA PONCE
 CONTRATISTA


 ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONES
HUGOMAR PERAZA PONCE
 CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
 MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022
 EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE: \$ 344,176.22

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022



FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)								
010101	PRELIMINARES						153.82	\$14.76	2,270.38
01010045	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	M2	211.74	153.82				TOTAL PARTIDA	2,270.38
010102	LOSA Y AZOTEA								
01040153	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE BASTONES, TERMINADO DE LA LOSA SUPERIOR SERA PLANEADO, CIMBRA ACABADO COMUN INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	211.74	153.82				1,285.59	197,749.45
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2	211.74	153.82				78.43	12,064.10
010103	ELECTRICA								
01120057	SALIDA PARA PREPARACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA CUADRADA DE 4" X 4" INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	SAL	20.00	16.00				\$142.12	2,273.92
010104	VARIAS								
01040154	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	211.74	153.82				9.06	1,393.61
								TOTAL PARTIDA	2,273.92
								TOTAL PARTIDA	209,813.55
								TOTAL PARTIDA	2,273.92
								TOTAL PARTIDA	1,393.61
								TOTAL PARTIDA	1,393.61

ING. HUGOMAR PERAZA PONCE
 CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
 SUPERVISOR

ARC. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS		CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022 OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.		FECHA 25/11/2022	
NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA		ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE		NIVEL MODIFICACION		UNIDAD	
		PLANO CUERPO		PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022			
		LOCALIZACION LARGO ANCHO ALTO PZAS		NOTAS DE BITACORA		RESULTADO PARCIAL TOTAL UNIDAD	
CLAVE	EJE	TRAMO					
0101		TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)					
010101		PRELIMINARES					
01010045		TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA					
		CUARTO PROPIEDAD DE:					
		MARIA TERESA CRUZ CASILLAS				1.00	15.12 M2
		$((2.64 + 2.95)/2) \times (5.41)$	1.48	1.09		1.00	1.61
						SUBTOTAL	16.73
		CUARTO PROPIEDAD DE:					
		ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ				1.00	20.08 M2
		5.02	4.00				
		CUARTO PROPIEDAD DE:					
		ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO				1.00	21.83 M2
		4.53	4.82				
		CUARTO PROPIEDAD DE:					
		JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ				1.00	22.79 M2
		4.88	4.67				
						SUBTOTAL	81.43 M2
		SUPERVISOR				ACEPTA	EL CONTRATISTA
							
		ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ				ING. HUGOMAR PERAZA PONCE	

CLAVE	C O N C E P T O	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	R E S U L T A D O		
							PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
							EJE	TRAMO	
	NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA	CUARTO PROPIEDAD DE: DAVID MARTINEZ LLAMAS	4.44	4.30	1.00		19.09	19.09	M2
		CUARTO PROPIEDAD DE: JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO	4.00	4.20	1.00		16.80	16.80	M2
		CUARTO PROPIEDAD DE: FRANCISCO DIAZ AGUILAR	6.45	3.13	1.00		20.19	20.19	M2
		CUARTO PROPIEDAD DE: OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO	3.87	3.85	1.00		14.90	14.90	M2
			2.27	0.62			1.41	1.41	
							SUBTOTAL	16.31	
							TOTAL	153.82	M2

CONTRATO CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOEA.

LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOEA.

FECHA 25/11/2022

ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE

PLANO CUERPO NIVEL

PARTIDA PERIODO DE EJECUCION MODIFICACION

DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022

NOTAS DE BITACORA

EL CONTRATISTA

ING. HUGOMAR PERAZA PONCE

SUPERVISOR



ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

<p>H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS</p>		<p>CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022</p> <p>OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.</p>				UNIDAD			
		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.		FECHA		25/11/2022			
		ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE							
		PLANO	CUERPO	NIVEL					
		PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION				
			DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022						
		NOTAS DE BITACORA							
CLAVE	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	
		EJE							
C O N C E P T O								R E S U L T A D O	
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)								
010102	LOSA Y AZOTEA								
01040153	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE BASTONES, TERMINADO DE LA LOSA SUPERIOR SERA PLANEADO, CIMBRA ACABADO COMUN INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA								
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	MARIA TERESA CRUZ CASILLAS								
			$((2.64 + 2.95)/2) \times (5.41)$		1.00	15.12	15.12	M2	
		1.48	1.09		1.00	1.61	1.61		
						SUBTOTAL	16.73		
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ								
		5.02	4.00		1.00	20.08	20.08	M2	
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO								
		4.53	4.82		1.00	21.83	21.83	M2	
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ								
		4.88	4.67		1.00	22.79	22.79	M2	
	SUPERVISOR					SUBTOTAL	81.43	M2	
						ACEPTA	EL CONTRATISTA		
	ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ							ING. HUGOMAR PERAZA PONCE	


 ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

 ING. HUGOMAR PERAZA PONCE

CLAVE		LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		UNIDAD					
		EJE	TRAMO					PARCIAL	TOTAL		UNIDAD				
H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS		CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022		OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.		FECHA		25/11/2022					
		ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE		PLANO	CUERPO	NIVEL									
		PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION										
		DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022		NOTAS DE BITACORA											
		NUMEROS GENERADORES		VOLUMEN DE OBRA											
C O N C E P T O		EJE		LARGO		ANCHO		ALTO		PZAS		RESULTADO		UNIDAD	
		CUARTO PROPIEDAD DE: DAVID MARTINEZ LLAMAS		4.44	4.30	1.00	19.09	19.09	M2						
		CUARTO PROPIEDAD DE: JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO		4.00	4.20	1.00	16.80	16.80	M2						
		CUARTO PROPIEDAD DE: FRANCISCO DIAZ AGUILAR		6.45	3.13	1.00	20.19	20.19	M2						
		CUARTO PROPIEDAD DE: OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO		3.87	3.85	1.00	14.90	14.90	M2						
				2.27	0.62		1.41	1.41	M2						
							SUBTOTAL	16.31	M2						
							TOTAL	153.82	M2						
		SUPERVISOR		ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		ACEPTA		EL CONTRATISTA							
						ING. HUGOMAR PERAZA PONCE									

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS		CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022		UNIDAD					
OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.		FECHA 25/11/2022					
ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE		NIVEL							
PLANO		CUERPO							
PARTIDA		PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION					
		DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022							
		NOTAS DE BITACORA							
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			RESULTADO				
		EJE	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)								
010102	LOSA Y AZOTEA								
01053027	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO CALIDAD 5 AÑOS A 2 MANOS INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA								
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	MARIA TERESA CRUZ CASILLAS								
			1.48				15.12	15.12	M2
							1.61	1.61	
							SUBTOTAL	16.73	
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ								
			5.02				20.08	20.08	M2
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO								
			4.53				21.83	21.83	M2
	CUARTO PROPIEDAD DE:								
	JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ								
			4.88				22.79	22.79	M2
							SUBTOTAL	81.43	
SUPERVISOR		ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		ACEPTA		EL CONTRATISTA			
									
				ING. HUGOMAR PERAZA PONCE					

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS			CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022			UNIDAD				
NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA			OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2. EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			FECHA 25/11/2022				
			LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.				NIVEL			
			ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE				MODIFICACION			
			PLANO CUERPO PARTIDA PERIODO DE EJECUCION DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022				NOTAS DE BITACORA			
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO			
		EJE TRAMO					PARCIAL	TOTAL	UNIDAD	
		CUARTO PROPIEDAD DE: DAVID MARTINEZ LLAMAS	4.44	4.30		1.00	19.09	19.09	M2	
		CUARTO PROPIEDAD DE: JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO	4.00	4.20		1.00	16.80	16.80	M2	
		CUARTO PROPIEDAD DE: FRANCISCO DIAZ AGUILAR	6.45	3.13		1.00	20.19	20.19	M2	
		CUARTO PROPIEDAD DE: OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO	3.87	3.85		1.00	14.90	14.90		
			2.27	0.62			1.41	1.41		
							SUBTOTAL	16.31	M2	
							TOTAL	153.82	M2	
SUPERVISOR							ACEPTA	EL CONTRATISTA		
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ							ING. HUGOMAR PERAZA PONCE			



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS		CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022 OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		UNIDAD				
NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.		FECHA 25/11/2022				
C O N C E P T O		ONTRARATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE						
CLAVE	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO		
						PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR) ELECTRICA							
010103								
01120057	SALIDA PARA PREPARACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJA CUADRADA DE 4" X 4" INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO							
	CUARTO PROPIEDAD DE: MARIA TERESA CRUZ CASILLAS				2.00	2.00	2.00	SAL
	CUARTO PROPIEDAD DE: ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ				2.00	2.00	2.00	SAL
	CUARTO PROPIEDAD DE: ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO				2.00	2.00	2.00	SAL
	CUARTO PROPIEDAD DE: JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ				2.00	2.00	2.00	SAL
						SUBTOTAL	8.00	





ING. HUGOMAR PERAZA PONCE





ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ

<p align="center">H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS</p> <p align="center">NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA</p>		CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022		UNIDAD						
		OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOEA.		FECHA						
		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOEA.		25/11/2022						
		CONTRATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE								
		PLANOS	CUERPO	NIVEL						
PARTIDA		PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION						
		DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022								
		NOTAS DE BITACORA								
CLAVE	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO			
	EJE	TRAMO						PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	DAVID MARTINEZ LLAMAS					2.00	2.00	2.00	SAL	
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO					2.00	2.00	2.00	SAL	
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	FRANCISCO DIAZ AGUILAR					2.00	2.00	2.00	SAL	
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO					2.00	2.00	2.00	SAL	
					TOTAL	16.00	16.00	16.00	SAL	
				ACEPTA			EL CONTRATISTA			
				 ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ		 ING. HUGOMAR PERAZA PONCE				

CLAVE		CONTRATO	CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022		UNIDAD	FECHA
			OBRA:	LOCALIDAD:		
H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS		OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.			25/11/2022
NUMEROS GENERADORES VOLUMEN DE OBRA		ONTRARATISTA:	HUGOMAR PERAZA PONCE			
		PLANO	CUERPO	NIVEL		
		PARTIDA	PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION	
		DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022		NOTAS DE BITACORA		
C O N C E P T O		LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS
		EJE	TRAMO			
0101	TECHO (CONCRETO ARMADO DE 10 CMS ESPESOR)					
010104	VARIAS					
01040154	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO					
		CUARTO PROPIEDAD DE:				
		MARIA TERESA CRUZ CASILLAS				
		($(2.64 + 2.95)/2$) X (5.41)	1.48	1.09		1.00
						15.12
						1.61
						16.73
		CUARTO PROPIEDAD DE:				
		ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ				
			5.02	4.00		1.00
						20.08
		CUARTO PROPIEDAD DE:				
		ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO				
			4.53	4.82		1.00
						21.83
		CUARTO PROPIEDAD DE:				
		JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ				
			4.88	4.67		1.00
						22.79
						81.43
		SUPERVISOR				EL CONTRATISTA
						
		ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ				
						
		ING. HUGOMAR PERAZA PONCE				

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICAS

CONTRATO CONTRATO No. FISMDF-AD-010-2022 OBRA: CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 242.35 M2, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		UNIDAD		FECHA	25/11/2022					
		LOCALIDAD: LOMAS DEL PEDREGAL, SAN IGNACIO, SINALOA.								
CONTRATISTA: HUGOMAR PERAZA PONCE										
PLANOS PARTIDA DEL 07 DE NOV. AL 25 DE NOV. 2022		CUERPO		NIVEL						
		PERIODO DE EJECUCION		MODIFICACION						
NOTAS DE BITACORA										
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO			
		EJE	TRAMO					PARCIAL	TOTAL	UNIDAD
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	DAVID MARTINEZ LLAMAS		4.44	4.30		1.00	19.09	19.09	19.09	M2
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO		4.00	4.20		1.00	16.80	16.80	16.80	M2
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	FRANCISCO DIAZ AGUILAR		6.45	3.13		1.00	20.19	20.19	20.19	M2
	CUARTO PROPIEDAD DE:									
	OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO		3.87	3.85		1.00	14.90	14.90	14.90	
			2.27	0.62			1.41	1.41	1.41	
							SUBTOTAL	16.31	16.31	M2
							TOTAL	153.82	153.82	M2
SUPERVISOR										
ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ 										
ACCEPTA										
EL CONTRATISTA 										
ING. HUGOMAR PERAZA PONCE										

PERAZA CONSTRUCCIONES
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022**

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE: \$ 344,176.22**

ESTIMACIÓN: 1 (UNO) **FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022**

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022


ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
MARIA TERESA CRUZ CASILLAS

[Handwritten signature]

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

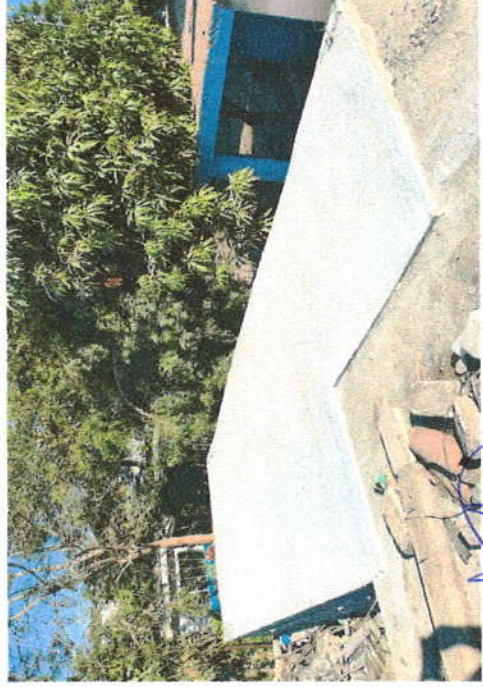

[Handwritten signature]

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

[Handwritten signature]

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONAL S
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2. EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** FISMDF-AD-009-2022

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$ **344,176.22**

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022

FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
ENRIQUETA TORRES HERNANDEZ

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARC. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONAL
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** FISMDF-AD-009-2022
UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$ **344,176.22**
ESTIMACIÓN: 1 (UNO)
PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022 **FECHA:** 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
ANA MARCELA LOAIZA ARELLANO

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA



ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONAL
HUGOMAR PERAZA PONCE

CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2. EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** FISMDF-AD-009-2022

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$ **344,176.22**

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022

FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
JOSEFINA ONTIVEROS RUIZ

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONES
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022

UBICACION: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE: \$ 344,176.22

ESTIMACION: 1 (UNO)

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022

FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
DAVID MARTINEZ LLAMAS

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCIONES
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHTEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022
UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. IMPORTE: \$ **344,176.22**
ESTIMACIÓN: 1 (UNO)
PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022 FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
JULIETA VELAZQUEZ VERDUGO

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCION S
HUGOMAR PERAZA PONCE
CALLE CUAUHEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95


H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO: FISMDF-AD-009-2022
UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACION: 1 (UNO)
IMPORTE: \$ **344,176.22**

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022

FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO

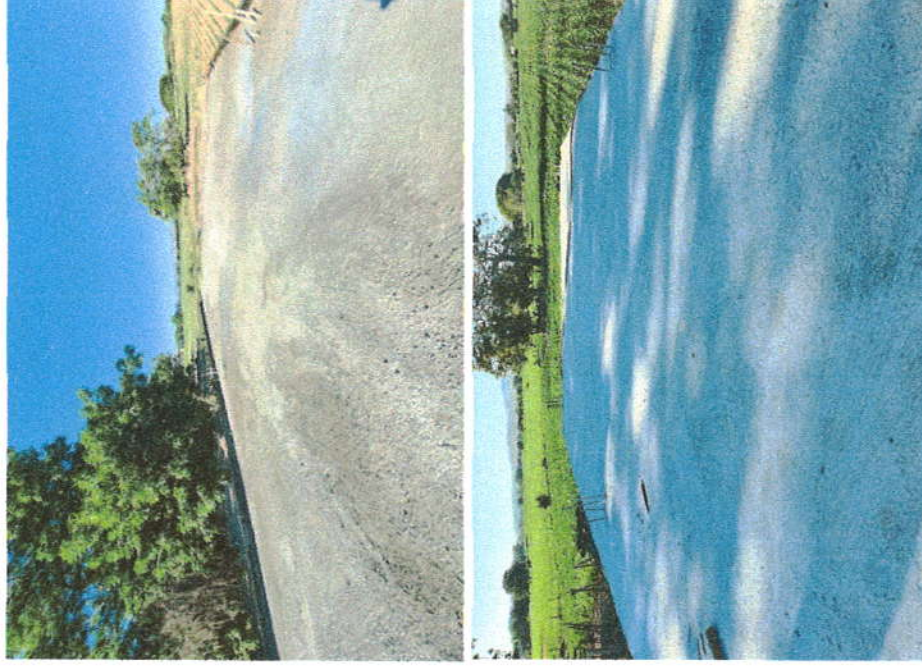

CUARTO PROPIEDAD DE:
FRANCISCO DIAZ AGUILAR

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PERAZA CONSTRUCCION S
HUGOMAR PERAZA PONCE

CALLE CUAUHEMOC No.138, COL. LOPEZ MATEOS
MAZATLÁN, SINALOA. TEL: 01 (69) 83 67 95

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA DE 211.74 M2. EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO:** FISMDF-AD-009-2022

UBICACIÓN: PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA. **IMPORTE:** \$ 344,176.22

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO: 07 DE NOV. DEL 2022 AL 25 DE NOV. DEL 2022

FECHA: 25 DE NOV. DEL 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CUARTO PROPIEDAD DE:
OMAR ERNESTO SARABIA ANGULO

HUGOMAR PERAZA PONCE
CONTRATISTA

ING. DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ
SUPERVISOR

ARQ. ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE
DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
