

BITACORA DE OBRA

FECHA / /

NOTA NO.01

09 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORAS PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE JUAN CARRASCO Y CALLE CUAUHTEMOC EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MOGUA, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO-OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-07060-2022 CON UN IMPORTE DE \$937,580.15 IVA INCLUIDO, Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09-JUNIO-2022 AL 07-AGOSTO-2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

NOTA NO.02


09 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA EN COMPARIA DEL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES MOGUA, S.A. DE C.V. SE LE NOTIFICA QUE DEBERA DE PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS DEBERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA S.O.P. DE ACUERDO A LA CLAUDULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

Nota No. 03

09 de Junio del 2022


Con esta fecha el Contratista da inicio a los trabajos contratados, iniciando con el trazo para verificación de lo físico contra proyecto.



Nota No. 04

10 de Junio del 2022



Con esta fecha se inician las excavaciones con máquina en terreno seco en material tipo "B" y tipo "C" en zanjas mayores a 1.20 m de profundidad para la reposición de la infraestructura hidráulica y sanitaria.



Nota No. 05

14 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio al suministro e instalación de tubería Pvc hidráulico de 3", seguido del inicio de la prueba hidrostática según la Norma Oficial Mexicana NOM - 001 - CONAGUA - 2011.



Nota No. 06

17 de Junio del 2022



Con esta fecha se da inicio a la reposición de tomas domiciliarias de 2.00 m a 3.50 m de longitud, con tubería Extrupack o similar de polietileno de alta densidad, incluyendo material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Nota No. 07

25 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio al corte en caja con medios mecánicos en material tipo I O II, incluyendo carga y acarreo en camión al primer Kilómetro con producto del corte de caja.



Nota No. 08

26 de Junio del 2022


Con esta fecha se da inicio a los trabajos de afine y compactación del terreno natural al 90% proctor, Seguido del tendido y compactación en sub-base con material pétreo.



Nota No. 09

04 de Julio del 2022

Con esta fecha se inician los trabajos de construcción de registros de $0.60 \times 0.40 \times 1.00$ M a base de tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluyendo tapa de concreto armada, marco y contramarco.



Nota No. 10

05 de Julio del 2022


Con esta fecha se inician los trabajos de control de calidad en el afine del terreno natural y en Sub-base, incluyendo herramientas, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Nota No. 11

07 de Julio del 2022


Con esta fecha se da inicio a los trabajos de mezcla, tendido y compactación de base de Grava-Arena de 15 cms de espesor, compactada al 100 % de su peso volumétrico.



Nota No. 12

09 de Julio del 2022



Con esta fecha se da inicio a los trabajos de riego de impregnación con emulsión asfáltica de 1.5 a 1.8 Lts por M^2 .



NOTA No.13

09 DE JULIO DEL 2022



CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO. 1 (CUND) NORMAL, CON UN PERIODO DEL 09/06/2022 AL 08/07/2022 CON UN IMPORTE DE \$477,469.76 IVA INCLUIDO Y ESTIMACION NO. 2 (COS) ADICIONAL CON UN PERIODO DEL 09/06/2022 AL 08/07/2022 CON UN IMPORTE DE \$19,522.85 IVA INCLUIDO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.



Nota No. 13

10 de Junio del 2022



El Contratista continua con el suministro de concreto para guarnición tipo "L" de 15 x 30 x 60 cm de concreto premezclado de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$.

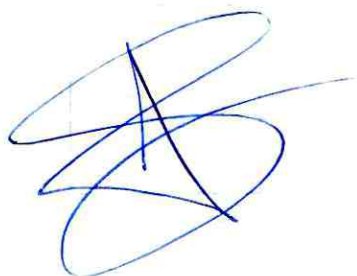

Nota No. 14

12 de Julio del 2022


Con esta fecha se inicia el colado de losa de pavimento con un $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ de 15 cms, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluyendo pasajuntas redondo 5/8", contrajuntas de Pvc, curado, vibrado, escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Nota No. 15

14 de Julio del 2022


Con esta fecha se da inicio a los trabajos de calafateo en losas, guarniciones y toda junta en el área pavimentada, incluyendo limpieza de la junta, sellado de junta con Sellacreto "P" o similar y todo lo necesario para su terminación.



Nota No. 16

25 de Julio del 2022



Con esta fecha se reciben las Pruebas de control de calidad en guarniciones y losa de pavimento con resistencia a los 7 días dando resultados que cumplen con las especificaciones de proyecto.



Nota No. 17

03 de Agosto del 2022


Con esta fecha se inician los trabajos de limpieza final de la Obra de acuerdo con la Norma N-LEG-3/07, Clausula D.4.28, incluyendo limpieza de toda superficie dentro y fuera del área de trabajo en donde se realizó algún cambio por causa de la obra.



NOTA NO. 18

07 DE AGOSTO DEL 2022


CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO. 3 (NORMAL) CON UN PERIODO DEL 09/07/2022 AL 07/08/2022, CON UN IMPORTE \$262,789-71 IVA INCLUIDO Y CON LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) ADICIONAL CON UN PERIODO 09/07/2022 AL 07/08/2022 CON UN IMPORTE DE \$11,694-91 IVA INCLUIDO, PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA NO-19

07 DE AGOSTO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE HACE LA ACLARACION QUE EN LA NOTA NO-18 SE MENCIONO LA ESTIMACION NO-4 (CUATRO) ADICIONAL CON UN PERIODO 07/07/2022 AL 07/08/2022 CON UN IMPORTE DE \$11,694.91 IVA INCLUIDO LA CUAL SE HACE LA ACLARACION QUE LA ESTIMACION DEBE DE DECIR, ESTIMACION NO-4 (CUATRO) ADICIONAL FINIQUITO CON PERIODO 07/07/2022 AL 07/08/2022 CON UN IMPORTE DE \$11,694.91 IVA INCLUIDO.



NOTA NO-20

07 DE AGOSTO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORAS DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE JACOBO GUTIERREZ ENTRE JUAN CARANASCO Y CALLE CUARENTA EN EL POBLADO DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE MATATLAN, ESTADO DE SINALOA, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMINADO A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES MOGUA, S.A DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. 09PU-EST-A03-PEST-VIAL-0206B-2022, CON UN IMPORTE DE \$937,580.15 IVA INCLUIDO Y EN PERIODO DE EJECUCION DEL 07-JUNIO-2022 AL 07-AGOSTO-2022.

EL FINIQUITO DE OBRA QUEDA ASI:

MONTOS DE CONTRATO =

\$937,580.15 IVA INCLUIDO

MONTOS DE ESTIMACIONES:

\$771,477.23 IVA INCLUIDO

MONTOS A CANCCAN:

\$166,102.92 IVA INCLUIDO

SUMAS IGUALES:

\$937,580.15 IVA INCLUIDO

