

Nota No. 1 OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804J-2022
25/Abril/2022

Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de obra:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804J-2022

Objeto del contrato:

"La Secretaría" encomienda a "la contratista" la ejecución de los trabajos de la Obra:

Pavimentación en calle privada L entre Av. Z y Av. T. en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Coliacán Rosales, Municipio de Coliacán, Estado de Sinaloa.

Monto del contrato: \$ 1,147,480.15 (incluido)

Contratista: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL A&A, S. A DE C.V.

Plazo de ejecución:

Inicio: 25 de Abril del 2022


Término: 25 de Junio del 2022

La Secretaría asigna al Arq. Carmen Rosario Uzárraga Acosta mediante Oficio como residente de Obra a continuación se registra su firma:




Continua Nota No. 1 CONT-1804J-2022

La contratista designa como superintendente de Obra al C. Ing. Jesús A. Beltrán Sánchez con poder amplio y suficiente para dirigir los trabajos del presente contrato. A continuación se registra su firma:




Nota No. 2 25/Abril/2022

La secretaria pone a disposición del contratista el inmueble sobre el cual se llevarán a cabo los trabajos relativos al presente contrato, mediante oficio: SOP-DIR-SUP-613-DI-2022.



Nota No. 3 25/Abril/2022

Con esta fecha dan inicio formal los trabajos del presente contrato.



Nota No. 4

CONT-1804J-2022
04/mayo/2022

Con esta fecha se tiene un avance del 50% en la reposición del drenaje Sanitario, en el cual se está instalando tubería de 8" diám. en tubo Principal y 6" diám. para descargas domiciliarias, de acuerdo a las especificaciones del Proyecto.


Toms. *León*

Nota No. 5

11/mayo/2022

Para esta fecha tenemos ejecutado al 100% las instalaciones del drenaje Sanitario, y red de agua Potable. Por otra parte se ha iniciado la apertura de caja.


Toms. *León*

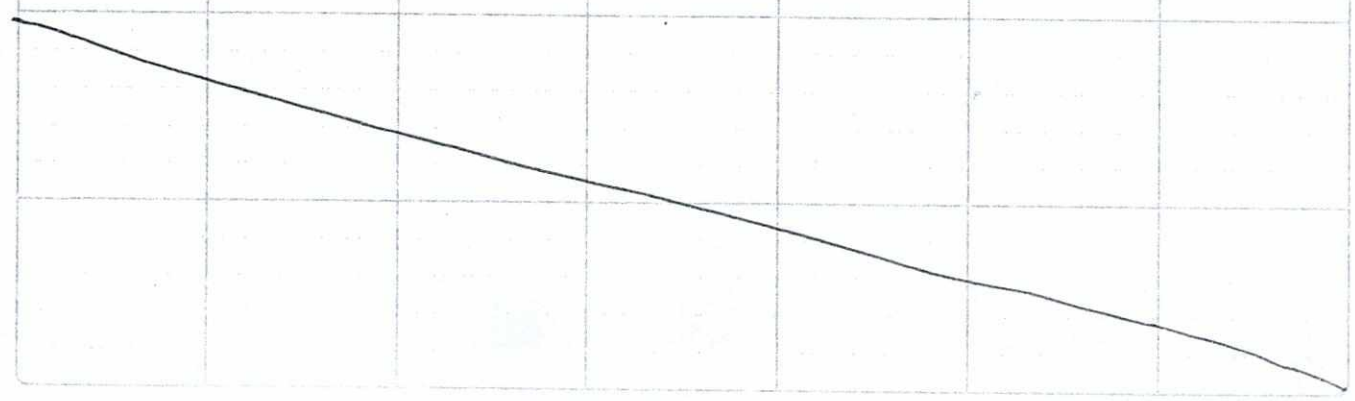

Nota No. 6

CONT-1804J-2022
18 mayo 2022

Para esta fecha tenemos el 100% de la excavación ejecutada, de acuerdo al proyecto, también tenemos un avance del 50% de la capa de subrasante con material de banco, para un espesor de 20 cm, compactado al 95%, según proyecto.




Nota No. 7

25/mayo/2022


Para esta fecha tenemos el 100% ejecutado de la capa de subrasante así como también de la capa de base hidráulica, incluyendo riego de impregnación.

Nota: En virtud de que no se colocó base hidráulica triturada, se deberá solicitar precio extraordinario para base hidráulica de canto rodado.




Nota No. 8 CONT-1804 J-2022
27 Mayo 2022
con esta fecha se autoriza la estimación
no. 1 normal con un periodo de
ejecución del 24 de abril de 2022 al
25 de mayo de 2022, la cual presenta
el siguiente desglose:

Importe total \$ 394,026.67
Amort. Anticipo \$ 177,312.00
Pedocc. de Contrato \$ 10,190.34
Liquido a pagar \$ 206,524.33



Nota No. 9 01/Junio/2022
Para esta fecha tenemos colado el
100% de losas de Pavimento de 15cms
de espesor, concreto $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, de
igual manera se tiene coladas las
banquetas de 10 cms de espesor con
concreto premezclado $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
Por otra parte se tiene ejecutado el
alumbrado público que consta de 4
lámparas, incluye instalación eléctrica



Nota No. 10

CONT. 1804J-2022

10/JUNIO/2022



Con esta fecha se autoriza la estimación no. 2 Normal, con un periodo de ejecución: del 26/05/2022 al 09/06/2022. La cual presenta el siguiente desglose:

Importe total \$ 221,906.19
Amort. Anticipo \$

Nota No. 11

01/JUNIO/2022

Con esta fecha se cancela la nota No. 9 de fecha 01/JUNIO/2022 y la nota no. 10 de fecha 10/JUNIO/2022 quedando ambas sin efecto debido a un error involuntario. La presente bitácora continuará con sus notas a partir de la nota no. 8 de fecha 27 Mayo 2022.


 

Nota no. 12

CONT. 1804 J-2022

06 / Junio / 2022

Para esta fecha tenemos el siguiente avance en la Pavingentación del kilómetro 0+000 al kilómetro 0+079.74, en los conceptos de guarnición pecho de paloma, banquetas y losa de concreto de 15 cms de espesor, con un $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$.




Nota no. 13

07 / Junio / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 2 Normal, con un periodo de ejecución del 26 / mayo / 2022 al 06 / junio / 2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total	\$ 449,695.81
Amort. Anticipo	\$ 224,306.06
Deduca. de Contrato	\$ 11,630.06
Líquido a Pagar	\$ 213,759.69



Nota No. 14

CONT-1804J-2022

25 JUNIO 2022

Para esta fecha tenemos ejecutada la obra al 100%, incluyendo alumbrado público y accesorios.




Nota No. 15

25 JUNIO 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación 3 Normal finiquito, con un periodo de ejecución del 07 JUNIO 2022 al 25 JUNIO 2022, la cual presenta el siguiente desglose:

ImpORTE total: \$ 265,426.27

Amort. Anticipo: \$ 0.0

Deducc. de Contrato: \$ 6,864.47

Liquidado a pagar: \$ 288,561.80




Nota No. 16

CONT-1804J-2022
27 JUNIO 2022

Con esta fecha se cierra la presente bitácora, en virtud de haber cumplido con las metas del Contrato.

