



NOTA #1 FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA; PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZUELA DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINAOA, DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0208-2022 CON UN MONTO \$ 350,100.12 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 08 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINAOA AL CONTRATISTA EMMANUEL ESH TIRADO PADILLA, SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA.




ARQ CESAR ABRAHAM  
CASTRO MEZA  
SUPERVISOR DE OBRA  
DE LA SOP



ING. EMMANUEL ESH  
TIRADO PADILLA  
SUPERINTENDENTE DE  
OBRA


NOTA #2 FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA  
PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y OFICIO  
DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA, CON  
COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, AMBOS OFICIOS DEBERAN  
ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ  
MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SOP.




ARQ. CESAR ABRAHAM  
CASTRO MEZA

SUPERVISOR DE OBRA  
DE LA SOP



ING. EMMANUEL ESH  
TIRADO PADILLA


SUPERINTENDENTE  
DE OBRA

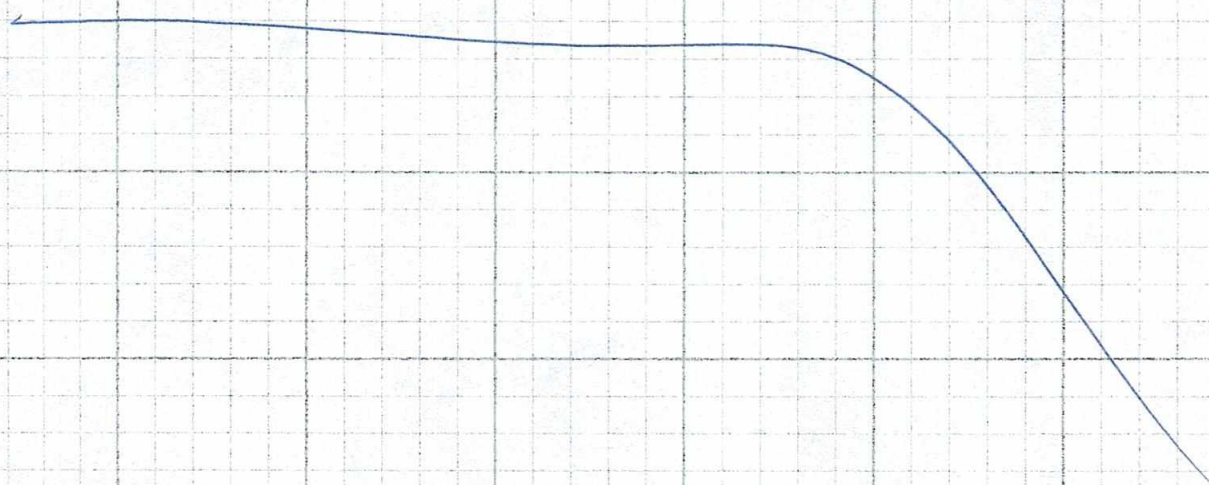

NOTA #3 FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL DE DIMENSIONES 40 x 80 x 120 COLOCADA CON GRUA.



Car / Contr. Men



NOTA #4 FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PROCEDE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA COLONIAL MEXICANA 100 EN POSTE DE FEGALU SOBRE LA BASE PIRAMIDAL PREVIAMENTE INSTALADA


Car / Contr. Men

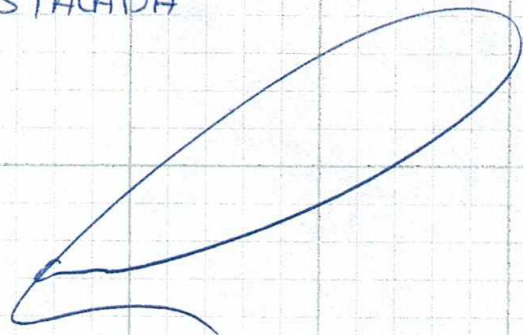

NOTA #5 FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE REGISTROS PREFABRICADOS EN CADA LUMINARIA ( NUEVA Y EXISTENTE) PARA LA INSTALACION POSTERIOR DE DUCTO NARANJA Y CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO PARA LA ALIMENTACION DE LUMINARIAS.



Cesar Coto Acuña



NOTA #6 23 DE AGOSTO DE 2022

SE PROCEDE CON LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRA A BASE DE VARILLA PARA TIERRA DE 5/8" X 1.50mts. PARA FINALIZAR EL CIRCUITO SUBTERRANEO.


Cesar Coto Acuña

NOTA #7 FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA INICIO DE LA INSTALACION DEL CIRCUITO AEREO EN BASE A LOS MATERIALES DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA UNICORNIO 19, ESTRUCTURA TIPO 1TR1A 33KV, ESTRUCTURA RP1N CON POSTE Y ESTRUCTURA RP1N SIN POSTE


Cesar C. Arce



NOTA #8 FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A LA COLOCACION DE MURTE DE MEDICION PREFABRICADO PARA LA CONEXION ENTRE EL CIRCUITO SUBTERRANEO Y AEREO.


Cesar C. Arce

NOTA #9 FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO PARA SU VERIFICACION Y/O APROBACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE, REPORTE FOTOGRAFICO, OFICIO TERMINO, ACTA DE EXTINCION Y FINIQUITO.


Cerr. J. Cabr. Mez



NOTA #10 FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022


CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION No. 01 (FINIQUITO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

Cerr. J. Cabr. Mez

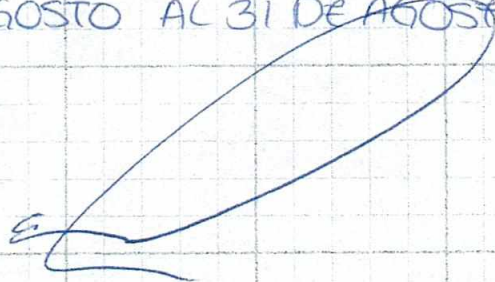


NOTA # 11 FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION No. 01 (UNO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022, CON UN IMPORTE \$316,357.36 INA INCLUIDO DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZUELA DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0208-2022.




ARQ. CESAR CASTRO  
MEZA

SUPERVISOR DE OBRA  
DE LA SOP



ING. EMMANUE ESTH.  
TIRADO PADILLA

SUPERINTENDENTE DE  
OBRA

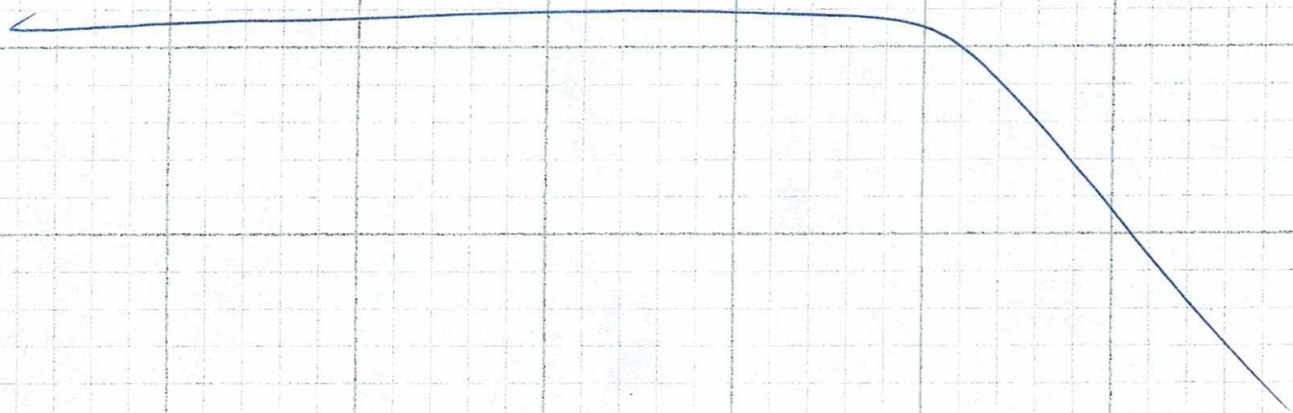

NOTA #12 FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE  
BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA  
OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO  
EN PLAZUELA DEL NUEVO DOBLADO DE SANTA MARIA,  
MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL  
CONTRATO OPRU-EST-ADJ-PEST-ALPU-0208-2022.

MONTO CONTRATO

\$ 350,100.12

ESTIMACION No. 01  
(UNO) FINIQUITO

\$ 316,357.36

SUMA ESTIMACIONES

\$ 316,357.36


SALDO QUE SE CANCELA

\$ 33,742.76

SUMAS IGUALES

\$ 350,100.12

\$ 350,100.12



ARQ. CESAR ABRAHAM  
CASTRO MEZA

SUPERVISOR DE OBRA  
DE LA SOP

  
ING. EMMANUEL ESTH  
TIRADO PADILLA

SUPERINTENDENTE DE  
OBRA
