

Nota No. 1

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2806-2022
06 / JULIO / 2022

Con esta fecha se apertura este libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos del siguiente contrato de obra:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2806-2022

Objeto del Contrato:

"La Secretaría" encomienda a "La Contratista" la ejecución de los trabajos de la Obra: Pavimentación en Av. 2, entre 31 de diciembre e Ignacio Ramírez, ubicada en la col. Benito Juárez, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa.

Monto del contrato: \$ 1,903,695.92 (Inc.lva)

Contratista: DARRECO, S.A de C.V.

Plazo de ejecución:

Inicio: 06 de julio del 2022

Término: 06 de Octubre del 2022.

La Secretaría asigna al Arq. Carmen Rosario Uzarraga Acosta. mediante oficio como residente de Obra a continuación se registra su firma:



Continúa Nota No. 1 CONT-2806-2022


La contratista asigna como superintendente de Obra al C. Ing. Francisco J. Parra Valenzuela con poder amplio y suficiente para dirigir los trabajos del presente contrato. A continuación se registra su firma:



Nota No. 2 06 Julio / 2022



La Secretaría pone a disposición del contratista el inmueble sobre el cual se llevarán a cabo los trabajos relativos al presente contrato, mediante oficio:

SOP-DIR-SUP-1136-DI-2022



Nota No. 3 06 Julio / 2022

con esta fecha dan inicio formal los trabajos del presente contrato.



Nota No. 4


CONT-2806-2022
15/Julio/2022

Con esta fecha se tiene un avance del 50% en la reposición del drenaje sanitario en el cual se está instalando tubería de 8" diám. en tubo principal y 6" diám. para descargas domiciliarias, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Icmm

Nota No. 5 29/Julio/2022

Para esta fecha tenemos ejecutado al 100% las instalaciones del drenaje Sanitario.

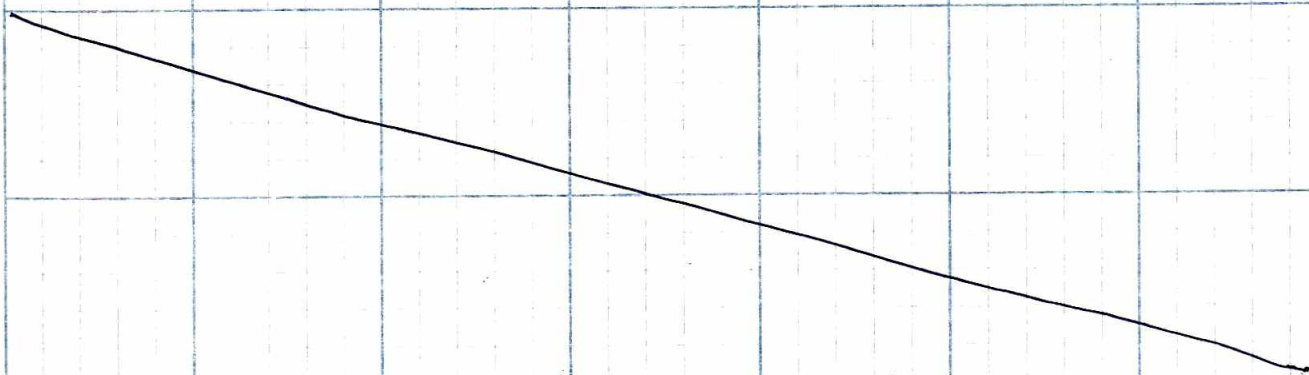Icmm

Nota No: 6

CONT-2806-2022
02/Agosto/2022



Con esta fecha se autoriza la estimación no. 1 normal, con un periodo de ejecución del 6 de julio del 2022 al 31 de julio del 2022, la cual tiene el siguiente desglose:

Importe total \$ 178,610.19

Amort. Anticipo \$ 62,513.57

Deduc. contrato \$ 4,619.23



Líquido a Pagar \$ 111,477.39



Nota No. 7

16/Agosto/2022



Para esta fecha tenemos ejecutado el 50% de la obra de agua Potable, consistente en tubo PVC de 75mm (3") diámetro (rd-26) y tomas domiciliarias.



Nota No: 8

CONT-2806-2022
31 / Agosto / 2022

Para esta fecha tenemos ejecutado el 100% de la sustitución del agua Potable de acuerdo al proyecto autorizado.




Nota No: 9

01 / septiembre / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 2 Normal, con un periodo de ejecución del 01 / Ago / 2022 al 31 / Ago / 2022 la cual presenta el siguiente desglose:



Importe total	\$	148,897.36
Amort. Anticipo	\$	52,114.08
Deducc. de contrato	\$	3,850.79
Líquido a Pagar	\$	92,932.49



Nota No. 10

CONT-2806-2022
15 / septiembre / 2022

Para esta fecha se tiene ejecutados los siguientes trabajos: Excavaciones en cortes para alojar el cuerpo del Pavimento, Compactación del terreno natural al 95%, capa de subrasante de 20 cm de espesor compactada al 95% y demolición de concreto en banquetas existentes, todo ello en el tramo del km 0+000 al km 0+141.13.





Nota No. 11

16 / septiembre / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 3 Normal, con un periodo de ejecución del 01 / septiembre / 2022 al 15 / septiembre / 2022, la cual presenta el sig. desglose:

Importe total	:	\$	212,045.95
Amort. Anticipo	:	\$	4,216.08
Pedocc. de Contrato	:	\$	5,483.95
Líquido a Pagar	:	\$	132,345.92





Nota No. 12

CONT-2806-2022

30/Septiembre/22

Para esta fecha se tiene ejecutado la capa de base hidráulica con material parcialmente tritorado con un espesor de 20 cm, incluyendo riego de impregnación y drenes para protección del Kilómetro 0+000 al 0+141.13, Guarnición pecho de Paloma y registros de albañal.




Nota No. 13

03/0ctubre/2022

Con esta fecha se autoriza la estimación no. 4 Normal, con un periodo de ejecución del 16 de septiembre del 2022 al 30 de septiembre del 2022. La cual presenta el siguiente desglose:



Importe total:	\$ 329,257.16
Amarf. Anticipo:	\$ 115,240.00
Deduc. de Contrato:	\$ 8,513.27
Líquido a Pagar	\$ 205,503.89



Nota No. 14

CONT-2806-2022
03/0ctubre/2022

Con esta fecha tenemos el siguiente avance de obra, guarnición tipo L, banquetta de 10 cm de espesor, concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ para losas de pavimento de 15 cm de espesor, todo lo anterior del km 0+000 al 0+141.13. También tenemos colocados 4 luminarias para alumbrado público.



Nota No. 15

03/0ctubre/2022



Con esta fecha se autoriza la estimación No. 5 Normal, con un periodo de ejecución del 01/oct/22 al 03/oct/22 la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total \$ 686,394.23

Amort. Anticipo \$ 240,237.98

Deducci. de Contrato \$ 17,781.57

Líquido a Pagar \$ 428,374.68



Nota No. 16

CONT-2806-2022
06 octubre / 2022

Para esta fecha tenemos ejecutado el total de conceptos normales y adicionales del presente proyecto, teniendo por concluida la obra

Nota No. 17

04 octubre / 2022

Con esta fecha se autoriza la estimación No. 6 Normal, con un periodo de ejecución del 04 octubre / 2022 al 06 octubre / 2022, la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total: \$ 103,155.32

Amort. Anticipo: \$ 51,577.66

Deducc. de Contrato: \$ 2,667.81

Líquido a Pagar: \$ 48,909.85

Nota No. 18

CONT. 2806-2022
07 octubre 2022

Con esta fecha se autoriza la
estimación 7 adicional finiquito

Con un periodo de ejecución del
04 octubre 2022 al 06 octubre 2022
la cual presenta el siguiente desglose:

Importe total : \$ 122,722.39

Amort. Anticipo: \$ 70,394.19

Deducc. de Contrato: \$ 3,173.85

Líquido a Pagar: \$ 49,154.35

Saldo a cancelar: \$ 122,613.32

Nota No. 19

07 octubre 2022

Con esta fecha se cierra la Presente
bitácora en virtud de haber com-
plido con la meta del proyecto.
