

NOTA NO.01

09 DE MARZO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORAS PARA DARSE SEGUIMIENTO A LA OBRA REMODELACION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V., COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-A03-REST-ADDA-03030-2022 CON UN IMPORTE DE \$1'563,970-80 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09-MARZO-2022 AL 22-MAYO-2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

A handwritten signature in blue ink, with a circular stamp containing the letters 'C.A.' overlaid on it.

NOTA NO.02

09 DE MARZO DEL 2022


CON ESTA FECHA EN COMPANIA DEL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CESECO, S.A. DE C.V. SE LE NOTIFICA QUE DEBEA DE PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE PRESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SERAN DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. DE ACUERDO A LA CLASULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

A handwritten signature in blue ink, with a circular stamp containing the letters 'C.A.' overlaid on it.

NOTA N°03

09 DE MARZO DEL 2022


CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, RETIRO DE CONTACTO O ARAGADO, RETIRO DE SALIDA CENTROCORTADO BOTE, MANUFACIION EN PISO, DEMOLICION DE ZOLLO DE CERAMICA.



NOTA N°04

14 DE MARZO DEL 2022

EL CONTRATISTA PROCEDE A AVANCE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS CONTINUANDO CON RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO, DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE, DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO,



NOTA N°05

18 DE MARZO DEL 2022


SE TRABAJA EN RETIRO DE CONTACTO O ARAGADO, RETIRO DE SALIDA CENTROCORTADO BOTE, MANUFACIION EN PISO, DEMOLICION DE ZOLLO DE CERAMICA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO, DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE, DEMOLICION DE CASTILLO DE CONCRETO, DEMOLICION DE PALA DE CERAMAMIENTO, DEMOLICION DE APLAMADOS EN MUROS Y PLATONES, DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE PARA INSTALACION DE PUERTA,



NOTA NO-06

21 DE MARZO DEL 2022

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS ACABADO EN CARPETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION,

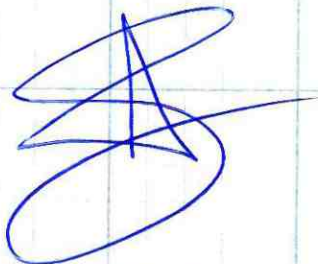

NOTA NO-07

25 DE MARZO DEL 2022


SE TRABAJA EN LA IMPLEMENTACION ACABADO ELASTOMERICO, PINSALITAE EN MUROS DE TABIQUE DE BARRIDO RECORRIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS.



NOTA NO-08

29 DE MARZO DEL 2022


SE AVANZA CON LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS NO TERMINADOS, ASI MISMO SE CONTINUAN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA POR PLAFONDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA APAGARES SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION VISIBL,



NOTA NO-09

01 DE ABRIL DEL 2022

SE TRABAJA EN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO ACABADO PULIDO EN MUROS, LOSAS, TAPES, FILLOS DE YESO ACABADO PULIDO EN MUROS, LOSAS, TAPES,



NOTA NO-10

04 DE ABRIL DEL 2022

SE TRABAJA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLADO ELÉCTRICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE TUBERÍA PARA DESAGUE AG MINISPLIT, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA,



NOTA NO-11

08 DE ABRIL DEL 2022


EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACIÓN NO-DICUNO NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN, CON UN IMPORTE DE \$388,074.25 IVA INCLUIDO Y CON UN PERÍODO DEL 09-MARZO-2022 AL 08-ABRIL-2022.



NOTA NO-12

12 DE ABRIL DEL 2022


EL CONTRATISTA CONTINUA LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTALCA, SALIDAS DE CONTACTOS Y APAGADORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, ASI MISMO EN REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL CALLE VENUS, EXCAVACION, CONTE, RETINO CON RECOBRADO DE REVESTIMIENTO EN MURO, DEMOLICION DE FILMES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN MALESTAD. ACARRO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,

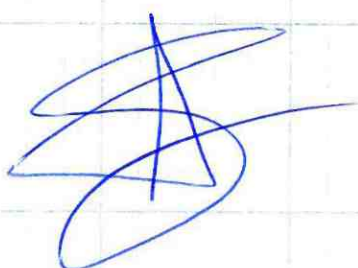

NOTA NO-13

15 DE ABRIL DEL 2022



SE CONTINUAN LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS AVANZANDO CON MUROS DE TABLAMIENTO BURECK FIRME DE CONCRETO, FUNDADO DE ESCALON DE CONCRETO, COLOCACION DE ADQUIN DE RECUPERACION.



NOTA NO. 14

19 DE ABRIL DEL 2022

SE TRABABA EN COLOCACION DE PISO
INTERCEMAMIC, COLOCACION DE ZOLLO,
INSTALACION ELECTALCA, CONEXION Y
PUERBOS DE ADAPACIONES. ASI MISMO
CONTINUANDO CON LOS CONCEPTOS ANTERIO-
RAMENTE MENCIONADOS.

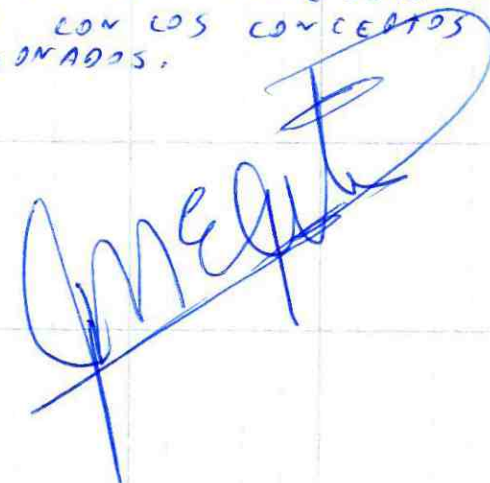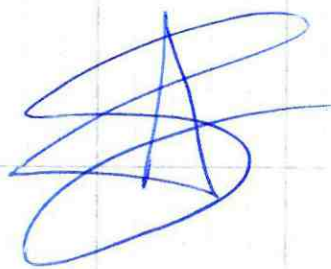

NOTA NO. 15

22 DE ABRIL DEL 2022


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE Muros de
PAÑEL DE YESO, COLOCACION DE PLAFON,
COLOCACION DE PLATABANDA, COLOCACION
DE CANCELERIA DE ALUMINIO, COLOCACION
DE ZOLLO, COLOCACION DE PISO, APLANADOS,
DE COBRIMIENTOS Y ENBOQUILLADOS DE
YESO EN MUROS, LOSAS, TRABAJOS.



NOTA NO.16

26 DE ABRIL DEL 2022



SE AVANZA CON LOS TRABAJOS OBRA CIVIL,
CANCELEPIA DE ALUMINIO, RECUBRIMIENTOS
Y ACABADOS ADLANADOS, INSTALACION
ELECTRICA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PRELIMINARES,

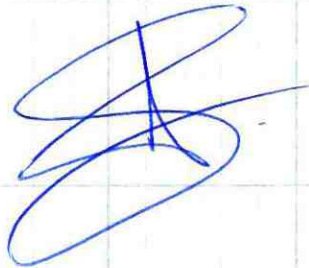

NOTA NO.17

29 DE ABRIL DEL 2022


EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO.2 (DOS
NORMAL PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION
CON UN PERIODO DEL 09/04/2022 AL 29/04/2022
Y UN MONTO DE L\$246,548-98 IVA INCLUIDO.

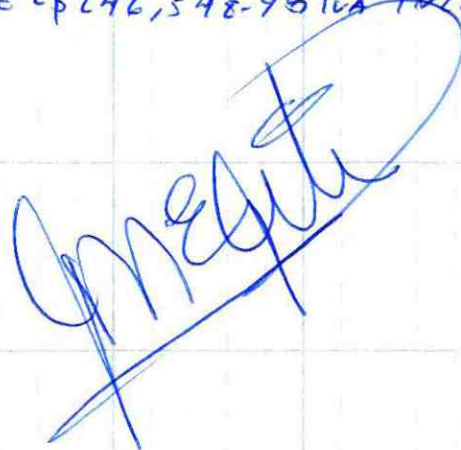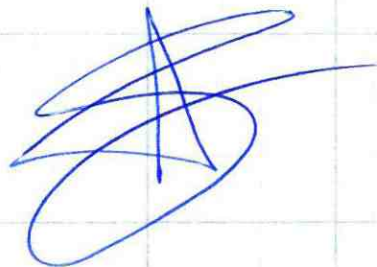

NOTA NO-18

07 DE MAYO DEL 2022

SE TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTALICA, APLICACION DE PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR, COLOCACION DE MUROS DE PORDOS, APLICACION DE TEXTUCO, COLOCACION DE LAMPARAS.

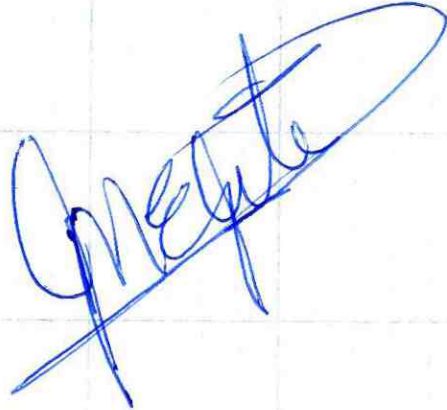

NOTA NO-19

12 DE MAYO DEL 2022



EL CONTRATISTA PRESENTA PRECION UNITARIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION. AVANTANDO CON LA COLOCACION DEL PLAFONDO, INSTALACION ELECTALICA, APLICACION DE PINTURA, COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO.



NOTA NO-20

16 DE MAYO DEL 2022


SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LAMPARAS EN PLAFONDO, APLICACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, COLOCACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO. ASI MISMO PRESENTA ESTIMACION NO-03, CON UN PERIODO DE 30/04/2022 AL 16/05/2022, Y CON UN MONTE DE \$698,652.43 LA INCLUIDO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA NO. 21

18 DE MAYO DEL 2022


EL CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCELERIA A BASE DE ALUMINIO NEGRO, COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NEGRO, APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA.



NOTA NO. 22

19 DE MAYO DEL 2022



EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) CON UN PERIODO DEL 16/05/2022 AL 19/05/2022 CON UN IMPORTE DE \$16,300.05 IVA INCLUIDO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA NO. 23

20 DE MAYO DEL 2022

EL CONTRATISTA CON ANTERIORIDAD TRABASO EN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, DEMOLICION DE ZOLLO DE MARMOL, ZOLLO DE MARMOL, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO INSTALADO PARA INTERIOR DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONTACTO CON TIERRA AISLADA PARA INTERIOR DE MURO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA VISIBLE PARA CONTACTO CON TIERRA AISLADA EN CADA METALCA VISIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION VISIBLE PARA BOMBAS, SUMINISTRO DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT INVERTIDA.



NOTA NO. 24

22 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO. 5 EXTRAORDINARIA FISIQUITO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION, CON UN PERIODO DEL 20/05/2022 AL 22/05/2022, CON UN IMPORTE DE CO\$ 279,260.13 IVA INCLUIDO.



NOTA NO-25

22 DE MAYO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORAS DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OTRA REMODELACION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NOMINACION NOMBRADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA LESECO, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. OPPU-EST-ADS-BEST-APPA-03030-2022, CON UN MONTE DE \$1'563,970.80 IVA INCLUIDO, Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09-MARZO-2022 AL 22-MAYO-2022, DONDE SE AUTORIZO UN CONVENIO NO-CONV-01-2022-MI-C03030-2022,

EL FINQUITO DE OBRA QUEDA ASI

MONTO DE CONTRATO CON IVA:

\$ 1'563,970.80

MONTO DE CONVENIO CON IVA:

\$ 65,281.30

SUMA DE ESTIMACIONES CON IVA:

\$ 1'628,252.10

SALDO A CANCELAR CON IVA:

\$ 416.21

SUMAS IGUALES CON IVA:

\$ 1,629,252.10

