

OPERA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS
EN CASAS VIEJAS MUNICIPIO FLOTA.
ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION Y VALIDADES
A CONTRATISTAS PARA QUE EJECUTE TRABA-
JOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

02° - INICIAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION
Y EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACION
DE TUBERIA.

FECHA: 16-08-2022

03° - EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS
EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA.


04° - INSTALACION DE TUBO DE PVC PARA
ALCANTARILLADO SANITARIO.


FECHA: 23-08-2022

05° - KILBRO EN EXCAVACION REALIZADA
A VOLTRO CON PRODUCTO DE EXCAVACION

FECHA: 26-08-2022

06° - CONTINUAN CON EXCAVACION PARA
INTRODUCCION DE TUBO PARA ATARJEAS.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 03080 - 2022

OPERA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CASAS NUEVAS MUNICIPIO ELOTA. ESTADO DE SINALOA.

07° - INSTALACION DE TUBO PVC DE 8" PARA ATARJEAS

FECHA: 30-08-2022

08° - CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN DE 1.00 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 01-09-2022

09° - APLANADO EN POZOS DE VISITA TIPO COMUN EN SU INTERIOR.


FECHA: 03-09-2022

10° - REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS

FECHA: 05-09-2022

11° - COLOCACION DE BRICKS Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPU - EST - ADT - PST - APPA - 03080 - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARDEAS EN CASAS VIEJAS MUNICIPIO SILOTA. ESTADO DE SINKRA.

12° - RECIBO DE GENERADORES PARA ESTIMACION DEL PERIODO DEL 10-08-2022 AL 09-09-2022.

FECHA: 12-09-2022

13° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION DEL PERIODO DEL 10-08-2022 AL 09-09-2022.


FECHA: 15-09-2022

14° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL. IMPORTE: \$ 368,428.75 CON IVA MANOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 10-08-2022 AL 09-09-2022.

AUTORIZACION DE ESTIMACION

~~Superintendente~~

~~Superintendente Sop.~~

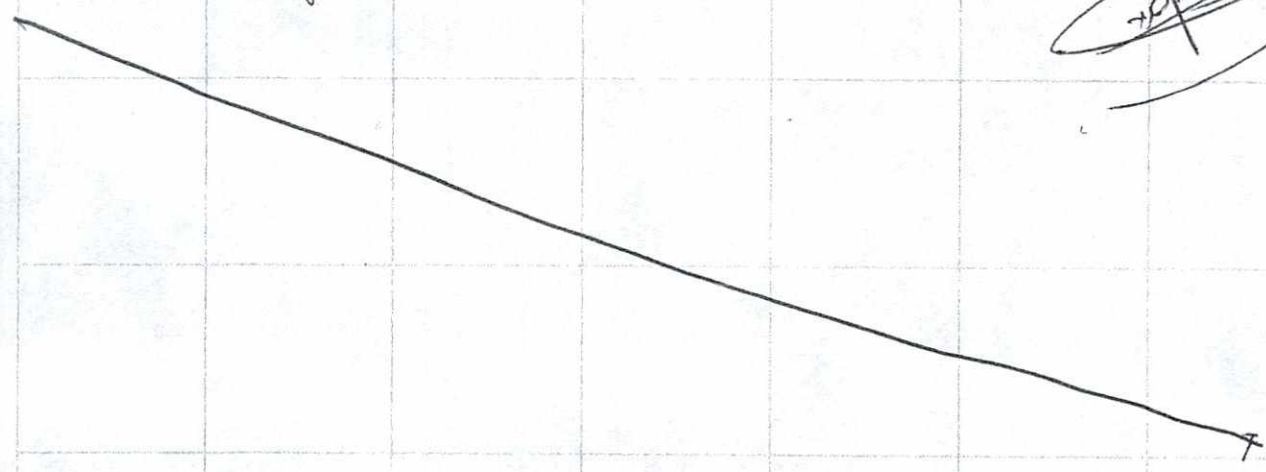

20 09 2022

OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 03080 - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CASAS VIVIAS MUNICIPIO FLOTA. ESTADO DE SINALOA.

15° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE KOTUVO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS CON BASTIDOR.

FECHA: 23-09-2022

16° - AFINIR Y CONFORMADO CON MOTOCONFOR MADERA EN CALLES.

17° - OBRA ESTA TERMINADA.

FECHA: 23-09-2022

18° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION DE FINIQUITO PERIODO DEL 10 SEP. AL 23 SEP 2022.

19° - IR CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD.

FECHA: 25-09-2022

20° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION DE FINIQUITO PERIODO DEL 10 SEPT AL 23 SEPT 2022.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 03080 - 2022.

OPERA: AMPLIACION DE RED. DE AGUAS EN CASAS VIEJAS MUNICIPIO ECOTA. ESTADO DE SINALOA


21° SE REALIZO RECORRIDO CONSTATANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD SE PROCEDA A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 07-10-2022


22° RECIBO ESTIMACION 02 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 59,686.27 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 10-09-2022 AL 23-09-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

23° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE
