

COPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-3101A-2023.

NOTA NO. 1 01/FEB/2023.

CON ESTA FECHA SE ABRETIÓ ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS
DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

COPPU-EST-ADJ-PEST-DESO-3101A-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA RECOMIENDA A LA CONTRATISTA LA EJE
CUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION
DE BARROS EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ A LA ALTOA
DE LA LOCALIDAD DE LA PUTANERO, MUNICIPIO DE
COLACAN, ESTADO DE SINALOA.


MONTO DE CONTRATO: \$ 9'013,551.13 INCL. IVA

CONTRATISTA: C. FELIPE MIGUEL RAMOS. (REPRESENTANTE)
CIA: CONSTRUCCIONES TELMEX S.A. DE C.V.

PRZO DE EJECUCION:

INICIO: 01 FEBRERO 2023
TERMINO: 07 MARZO 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE
ASTORGA YAREZ, MEDIANTE OFICIO SOP-DIR-SOP-0215-
A-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION
SE REGISTRA SU FIRMA:




CONTINUA NOTA NO. DOS EN
HOJA NO. DOS.

CONTINUA NOTA NO. 1 01/FEB/2023.

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C-ING. FELIPE MIER NAIMES, CON PODER AMPLIO Y SUFFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA :


NOTA NO. 2 01/FEB/2023.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-0215-DI-2023.

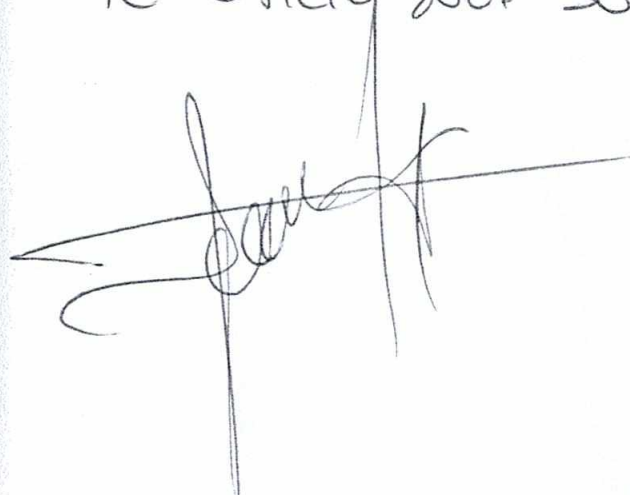

NOTA NO. 3 01/FEB/2023.



NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON LUGO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.



NOTA NO. 4 10/FEB/2023.

PARA ESTA FECHA SE HAN DESINSTALADO FLUXOMETROS PARA WC EN BAÑOS HOMENES Y MUJERES; FLUXOMETROS PARA MINCITORIOS, MAQUE DE CIERRE AUTOMATICO, RETIROS DE 32 LUMINAS.

SE HA TERMINADO DE COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO INCL. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

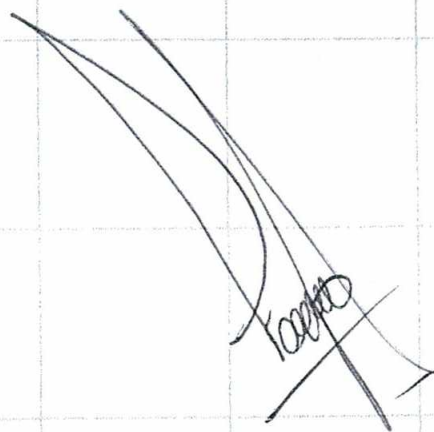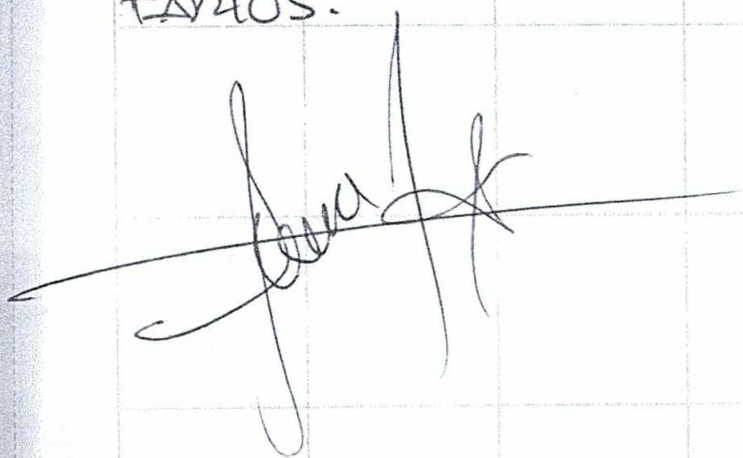

NOTA NO. 5 20/FEB/2023.

PARA ESTA FECHA SE HAN TERMINADO DETALLES DE MURO DE TABIQUERIA CLAS. REY, ASISTE EN MANIPULACION DIVISORIAS EN MINCITORIOS, RETRASELACION PROTECCION HERRERA EN FLUXOMETROS, TENEMOS AVANCE DEL 70% EN PANTERA UNICA.



NOTA NO. 6 24 / FEBRERO / 2023.


TENEDORES LA PINTORA VINILICA AL 100%.

FLUXOMETROS PARA WC DE MANIJA AL 100%.

FLUXOMETRO PARA WC SENSOR Y BOTON 100%.


FLUXOMETRO DE PEDAL 100%.

32 LUMINARIAS LED, MANEJOS ECONOMIZADORES CIENRE AUTOMATICO 100%, REVISION Y REPARACIONES TOBERAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS 100%.

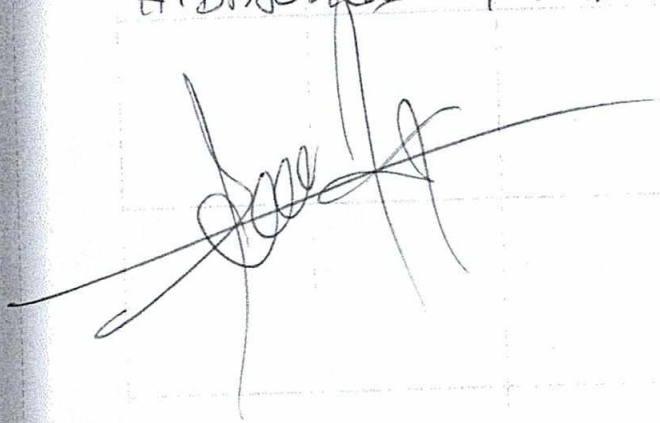

NOTA NO. 7 07 / MARZO / 2023.

PARA ESTA FECHA SE HAN TERMINADO TODOS LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DEJANDO EN OPERACION LAS INSTALACIONES Y LIMPIAS LAS AREAS DONDE SE TRABAJÓ.

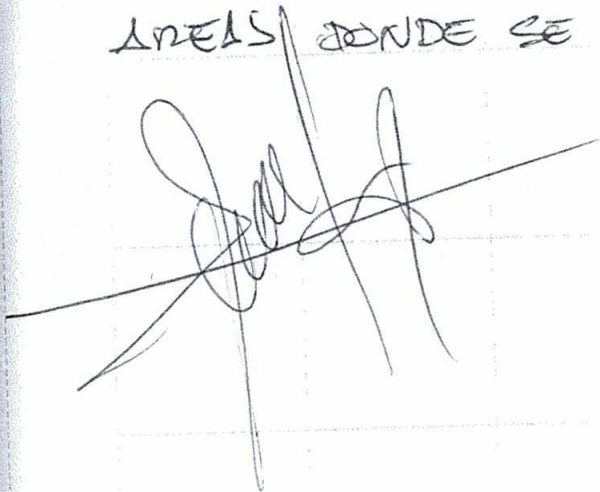

NOTA NO. 8 08/marzo/2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUM. CNO-NORMAL-FINICUITO, CON UN PERIODO
DE EJECUCION DEL 01/feb/2023 AL 07/marzo
/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DES
GLOSE ?

IMPORTE TOTAL	\$	7013,551.13	incl. IVA.
AMORT. ANTICIPO	\$	0.00	
DEDUCC. CONTRATO	\$	26,212.53	
LIQUIDOS A PAGAR	\$	987,338.60.	
SALDO A CONCILIAR	\$	0.00	

NOTA NO. 9 08/marzo/2023.

CON ESTA FECHA SE CERRA LA PRESENTE RITA
CORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS
METAS DE CONTRATO Y PROYECTO.
