

BITACORA DE OBRA

FECHA

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2206-2022.

NOTA NO. 2 01 DE JULIO 2022.
CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS
DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2206-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCUMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJE-
CUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION
EN AV. FRAY ANDRES TELLO, ENTRE LIC. JESUS URETA Y
CARRE LIC. FERNANDO B. HERNANDEZ, UBICADA EN LA COL. GUARDIA
LUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE COLACAN ROSALES, MU-
NICPIO DE COLACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MASLA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCO ANTONIO ARAGON
TENADO.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 2'031,731-16 INCL. IVA.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 01 DE JULIO 2022.

TERMINO: 31 DE OCTUBRE 2022.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE AS-
TORGUA YANEZ, MEDIANTE OFICIO SOP-PIR-SUP-983-A-2022
COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA
SU FIRMA:




LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. CARLOS ALBERTO SEPEDA BERTRAN, CON PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL
PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU
FIRMA:

OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2206-2022.


NOTA NO. 2 01 JULIO 2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE VERANAN A CARGO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-923-DI-2022.




NOTA NO. 3 01 JULIO 2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.



NOTA NO. 4 02 JULIO 2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 40%. TANTO EN LA SUSTITUCION DE LA INSTALACION DEL AGUA POTABLE COMO DEL DRENAJE SANITARIO



NOTA NO. 5 15/ JULIO/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, TALES COMO, EXCAVACION EN MATERIAL 'C', TUBO PVC (SI) DE 3"φ, PRUEBA HIDROSTATICA, PIEZAS ESPECIALES EN CONEXION DE ALCANTARILLADO A PETICION DE LA LAPAC, ASI COMO EN AGUA POTABLE.

NOTA NO. 6 01/ AGOSTO/ 2022


PARA ESTA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE DE OBRA:
- SUSTITUCION Y/O REPOSICION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 100%.

- EXCAVACIONES PARA ALOJAR EL CUERPO DEL PAVIMENTO TRAMO: OTCCO AL KM 0+147.40 AL 100%.

- CAPA DE SUBASANTE CON MAT. DE BANCO, ESPESOR 20cm AL 100%.

NOTA NO. 7. 31/JUL/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS CONVENIDO TODO LO
REFERENTE A LA SUSTITUCION DE LAS REDES DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

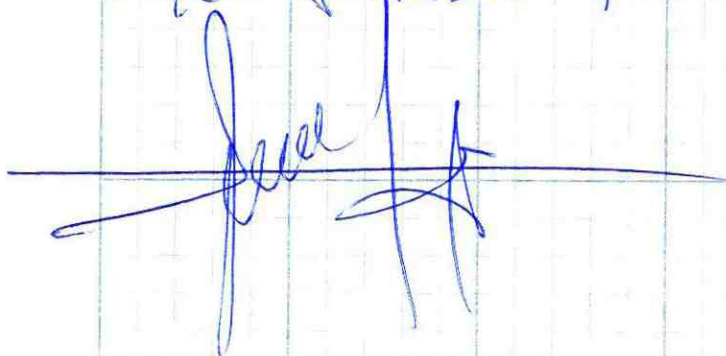

NOTA NO. 8 02/Ago/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO UNO NORMAL CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 01/JUL/2022 AL 31/JULIO/2022
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 396,482.69

AMORT. ANTICIPA \$ 138,768.94

DEDUCC. CONTRATO \$ 10,253.86.


LIQUIDO A PAGAR \$ 247,459.89.

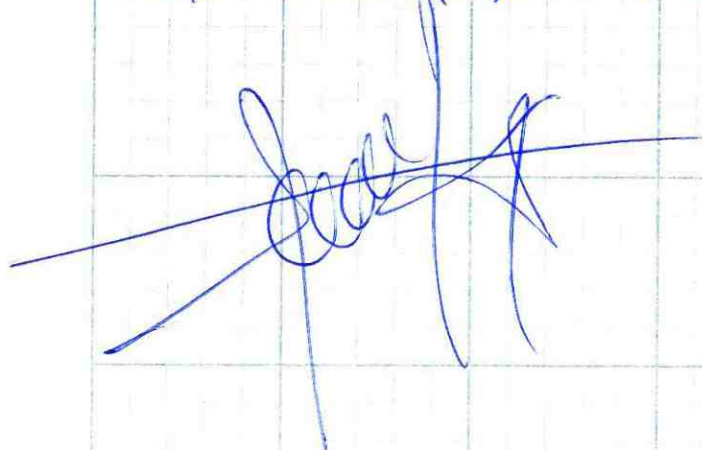

NOTA NO. 9 31/AGO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL SIGUIENTE AVANCE:

TRAMO: Km 0+000 AL Km 0+K7.40.
ELEVACION, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL,
CAPA DE SUPERFACIENTE DE 20 cms compact. al 95%,
CAPA DE BASE HOMOLOGICA DE 20 cms.
AL 100% GUARNICION TIPO I, LOSA DE
CONCRETO f'c = 300 kg/cm² DE 15 cms. espesor.

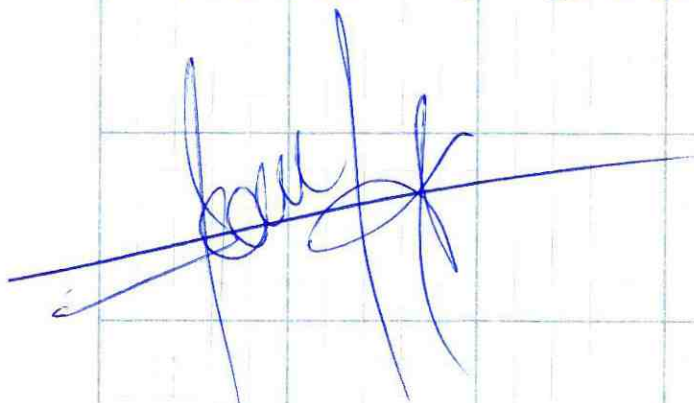

NOTA NO. 10 01/SEPT/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMEROS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/AGO/2022 AL 31/AGO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total \$ 1'631,078.59.

AMORT. ANTICIPO \$ 570,877.50

DEDUCE CONTRATO \$ 42,183.07

LIQUIDO A PAGAR \$ 1'018,018.02.

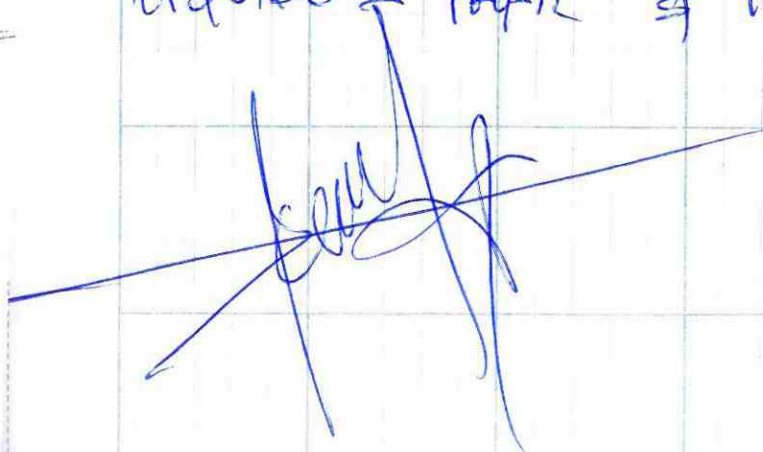

NOTA NO. 11 30/SEPT/2022.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN DE EJECUTAR CANTIDADES NORMALES DE OBRA Y PRACTICAMENTE SE TERMINA DE EJECUTAR EL PROYECTO. FALTANDO DE ESTIMAR CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

NOTA NO. 12 03/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOTA NO. 3 (TRES) NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/SEPT/ AL 30/SEPT/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$	139,407.87
AMORT. ANTICIPO	\$	115,236.41
DEDUCC. CONTRATO	\$	3,605.38
LÍQUIDO A PAGAR	\$	20,566.09

NOTA NO. 13 13/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE TERMINAN DE EJECUTAR LAS CANTIDADES ADICIONALES, SIENDO NECESARIO TRANSMITIR ESTIMACION CORRESPONDIENTE, PARA SU COBRO.

NOTA NO. 14 14/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION CUATRO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION 01/OCT - 13/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	≠	68,989.09
Import. Anticipo	≠	0.00
deducc contrato	\$	1,784.20
liquido a pagar	\$	67,204.89.

NOTA NO. 15 21/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUM.
ENCU ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION
DEL 14/OCT/2022 AL 20/OCT/2022, LA CUAL
PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE?

IMPORTE TOTAL	≠	44,629.86.
AMONT. ANTICIPO	\$	0.00
DEDUCC CONTRATO	≠	1,154.22.
LIQUIDO A PAGAR	\$	43,475.64.

NOTA NO ~~15~~ 16 31/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS LOS CONCEPTOS
ADICIONALES, DE TAL MANERA QUE LA OBRA
ESTA CONCLUIDA.

NOTA NO. 17 31/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION ADICIONAL SEIS EXTRAORDINARIA Y SUPLENTE, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 21/OCT/2022 AL 31/OCT/22, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 76,156.66
AMONT. ANTICIPO	\$ 0.00
DEDUCC. CONTRATO	\$ 1,969.57
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 74,187.09
SALDO A CANCELAR	\$ 63.37.

NOTA NO. 18 31/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DE PROYECTO Y DE CONTRATO.
