

NOTA #1 FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA QUE SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA; PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PLATAFORMAS (ETAPA 3) EN FRACC. CUINE UBICADO EN CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA, DE CONTRATO OPPU-EST-AOJ-PEST-VIAL-2809F-2022 CON UN MONTO \$ 1,348,408.12 IVA INCLUIDO. Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONTRATISTA: RAU MAQUINARIA, S DE RL DE CV SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP.


ING. FRANCISCO JAWINOF
SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA # 2 FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS
Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE
OBRA, CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, AMBOS
OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ
CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; DIRECTOR DE
SUPERVISION DE CA SOP.

Cesar A Castro Meza
ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE CA SOP

Ing. Francisco Jacinto Sánchez
ING. FRANCISCO JACINTO
SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA # 3 FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES AL DESPALME DE TERRENO NATURAL, REMOVIENDO LA CAPA VEGETAL DE CALLE MONTE MOJINO, EL PALMITO, TEPUSTA Y PLATAFORMAS 03 Y 04.



Cen I Coto Aca



NOTA # 4 FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA EJECUTA INICIALMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO TODOS LOS EJES Y NIVELETAS PARA EL POSTERIOR CERTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO DE CALLE MOJINO, PALMITO, TEPUSTA Y PLATAFORMAS 03 Y 04.


Cen I Coto Aca

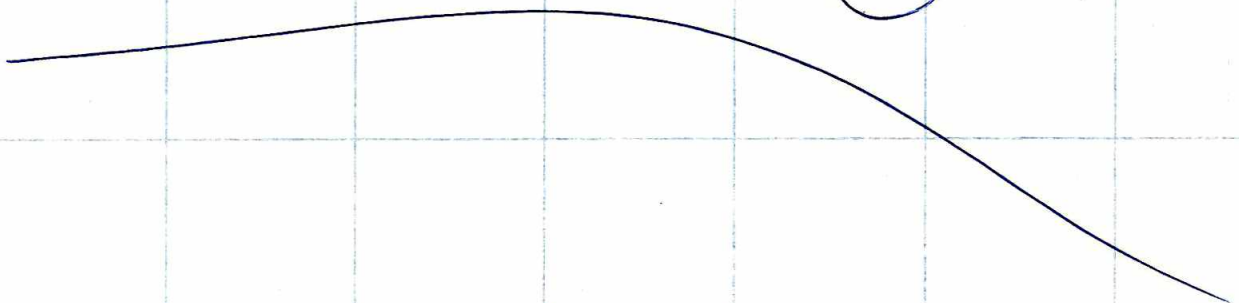

NOTA #5 FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA EL CONTRATISTA PROCEDE CON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LAS EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ESTE MATERIAL EXTRAÍDO SERÁ RETIRADO A ZONA EN DONDE DE ACUERDO A PROYECTO LO UTILIZARÁN COMO TERRAPLEN. ES DECIR A RASANTE DE PROYECTO.


Car t Castro dea



NOTA #6 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL AFINE Y COMPACTACIÓN DE CALLES Y PLATAFORMAS EN EL ÁREA DE TRABAJO AL 90%. DE ACUERDO A LA PRUEBA PROCTOR, ADICIONANDO EL AGUA Y COMPACTACIÓN PARA UN BUEN RESULTADO FINAL.

Car t Castro dea



NOTA # 7 FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA LOS NÚMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) FINIQUITO PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA, OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, OFICIO INICIO DE OBRA, GENERADORES, REPORTE FOTOGRAFICO, OFICIO TERMINO DE OBRA, ACTA DE EXTINCIÓN Y FINIQUITO

Cesar L. Castro Aren

NOTA # 8 FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Cesar L. Castro Aren

NOTA #9 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
Nº 01 (UNO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03 DE OCTUBRE DE
2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON UN IMPORTE
\$ 1,317,298.91 IVA INCLUIDO DE LA OBRA: TRABAJOS
DE TERRACERIAS Y PLATAFORMAS (ETAPAS) EN
FRACC. CUINE UBICADO EN CONCORDIA, MUNICIPIO
DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. DEL CONTRATO
OPPU-EST-A0J-PEST-JIAL-2809F-2022


ARQ. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SOP


ING. FRANCISCO JACUINDE
SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA # 10 FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE
BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA
OBRA: TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PLATAFORMAS
(ETAPA 3) EN FRACC. CUIVE UBICADO EN CONCORDIA
MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA DEL
CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2809F-2022

MONTO CONTRATO: \$1,348,408.12


ESTIMACIÓN N° 07 : \$1,317,298.91
(UNO) FINIQUITO

SUMA ESTIMACIONES: \$1,317,298.91

SALDO QUE SE : \$31,109.21
CANCELA

SUMAS IGUALES: \$1,348,408.12 \$1,348,408.12


ARG. CESAR ABRAHAM
CASTRO MEZA
SUPERVISOR DE OBRA
DE LA SOP


ING. FRANCISCO JACINTO
SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.
