

NOTA NO. 1 14/SEPT/2022

CONT. NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0609-2022

CON ESTA FECHA SE ABRENTA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRAS:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0609-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CARRETERA MEZQUITITA - EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE COLIAGO, ESTADO DE SONORA.

REPRESENTANTE LEGAL:  
C. JORGE LEAL NIEBLAS

CONTRATISTA:

DE LEAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., Y  
JUALAS, S.A. DE C.V.


MONTO DEL CONTRATO: \$ 3'123,576.30

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 14/SEPT/2022.

TERMINO: 31/DIC/2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MANO ENRIQUE ASTORGA YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1513-A-2022, COMO RESIDENTE DE OBRA, A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:




ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

CONTINUA NOTA No. 1 14/SEPT/2022.


LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. ING. YURI ANACLETO TERRAZAS RUBIO, CON PODER AMPLO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA



ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 2 14/SEPT/2022.


LA SECRETARIA PONE A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, SOBRE EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1513-DI-2022.




ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 3 14/SEPT/2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO; EN CUMPLIMIENTO CON LA CLÁUSULA TERCERA DEL MISMO.




ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 4 20/ SEPT / 2022 CONT-0609-2022

PARA ESTA FECHA TENEMOS EFECTUADO, LO RELATIVO A LAS DEMOLICIONES DE CONCRETO DEL ANTIGUO VADO, EFECTUADAS LAS EJECUCIONES PARA LAS ESTRUCTURAS, SE TRABAJA EN EL HABILITADO DEL ACERO DE REFORZO.

ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO


NOTA NO. 5 03/OCT / 2022.

SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA SOLICITAR LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIO, EN VIRTUD DE NO ESTAR INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO Y SER NECESARIOS PARA QUE LA OBRA CORRA DE MANERA CORRECTA. LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SON LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO Y COLOCACION CONTRAPUNTA PVC TIPO C-3, CALAFATEO EN LOSAS, PARA PISO A BASE DEL TUBO, COLOCACION CELOTEK.

ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 6 14/OCT/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADAS LAS OBRAS VINCULADAS PARA LAS ESTRUCTURAS Y LOS APROCHES SE BIEN EJECUTADOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE DE VADO, CONFORME A PROYECTO, SIENDO ESTOS DENTE LIGNES, LOSA DE CIMENTACION, MUROS DE CARGA, LOSA SUPERIOR, ALEROS, ETC.



  
ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS PUBIO

NOTA NO. 7 17/OCT/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO, NORMAL, CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 14/SEPT/2022 AL 14/OCT/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	≠	2'631,654.53
AMORT. ANTICIPADO	≠	921,879.09
DEDUCC. CONTRATO	≠	68,060.03
LÍQUIDO A PAGAR	≠	1'642,515.41



  
ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS PUBIO

NOTA NO. 8 15/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADA EL TOTAL DE LA OBRA DE ACERDO AL PROYECTO Y HA SIDO NECESARIO EJECUTAR CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES LOS CUALES HAN SIDO AUTORIZADOS Y PROTOCOLIZADOS MEDIANTE UN CONVENIO.

ING. YUPI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NO. NO. 9 16/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION ADICIONAL MENOS DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15/OCT/2022 AL 15/NOV/2022.

LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 319,015.22

AMORT. ANTICIPO \$ 172,172.67

DEDUCC CONTRATO \$ 8,250.39

LÍQUIDO A PAGAR \$ 138,592.21

ING. YUPI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 10 16/ DIC/ 2023.

PARA ESTA FECHA SE HAN EJECUTADO LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE RESULTARON EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CONCRETO, CONCRETO  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$  Y CONCRETO  $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , TERRAPLENES, ASFALTO DE RETENCIÓN.

ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 11 19/ DIC/ 2023.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 16 NOVIEMBRE 2022 AL 16 DICIEMBRE 2022.

LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 364,531.55
AMORT. ANTICIPA	\$ 0.00
DEDUC. CONTRATO	\$ 9,427.54
LIQUIDO A PAGAR	\$ 355,104.01

ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO


NOTA NO. 12 02/ENERO/2023.  
 PARA ESTA FECHA SE HAN EJECUTADO EL TOTAL  
 DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  
 INCLUYENDO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

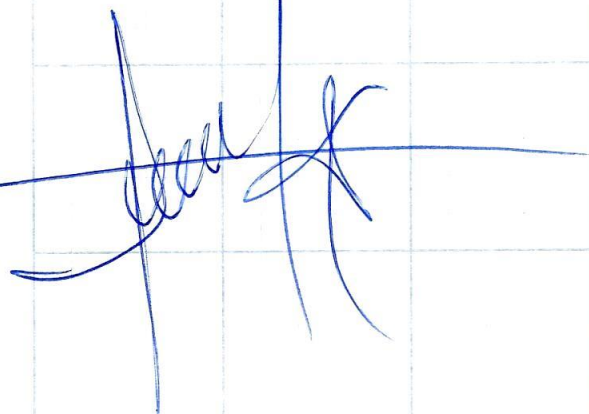

4x ING. YURI ANACLETO  
 TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 13 02/ENERO/2023.  
 CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOMENCLATURA  
 CONTRATO EXTRAORDINARIA SIGNIFICANTE, CON UN PERIODO  
 DE EJECUCION DEL 17/DIC/2022 AL 31/DIC/2022  
 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:



IMPORTE TOTAL	≠	21,767.44.
IMPORTE ANTICIPADO	≠	0.00
DEDUCC. CONTRATO	≠	1,858.05
LÍQUIDO A PAGAR	≠	69,911.39.

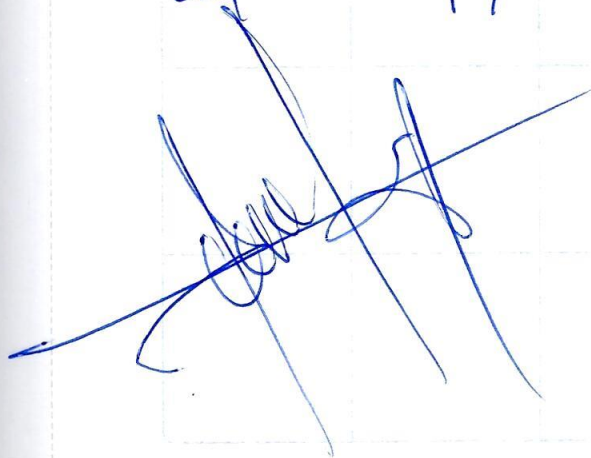

4x ING. YURI ANACLETO  
 TERRAZAS RUBIO

NOTA NO. 14 02/ENERO/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA, EN VIRTUD DE HABER COMPLEDO CON LAS METAS DE CONTRATO Y DE PROYECTO.

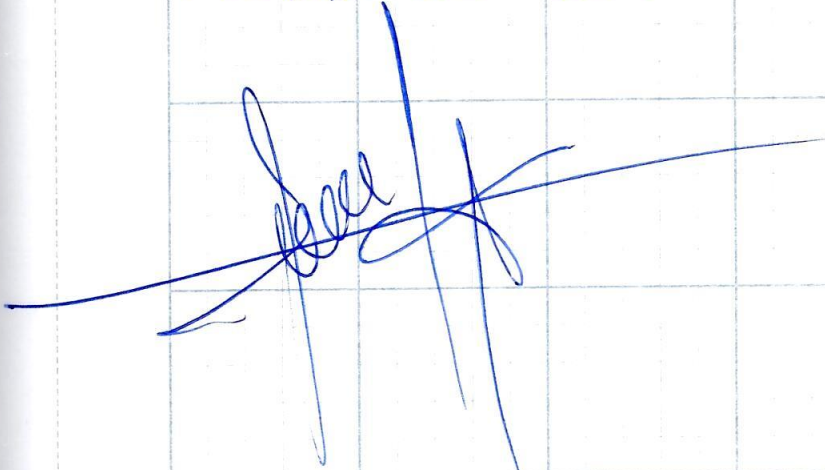

ING. YURI ANACLETO  
TERRAZAS RUBIO
