

CONT-NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-2023.

NOTA NO. 1 10 MARZO 2023.

CON ESTA FECHA SE ABERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DON SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0803D-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA?

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO ROQUE SERRANO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES RAFAEL MARTINEZ ESCOBAR Y CALLE GUILLERMO LAZARCA, UBICADOS EN LA COLONIA REMEX, EN LA CIUDAD DE CULIACAN RO-SALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA CESECO, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

C. FERNANDO COTERA CROZCO.


MONTO DE CONTRATO: \$1'763,580.17

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 10 DE MARZO 2023

TERMINO: 15 DE MAYO 2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA GANER, MEDIANTE CICIO NO. SOP-DIR-SOP-0679-A-2023, COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:



PAU R. Contreras

CONTINUA NOTA NO. 1 EN HOJA 2




CONTINUA NOTA NO. 1 10/MARZO/2023

LA CONTRATISTA DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL C. DR. PABLO RICARDO GONZALEZ MADON, CON PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA.

NOTA NO. 2 10/MARZO/2023.


LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE VIGILARAN A CARGO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO. LO ANTERIOR SE HIZO MEDIANTE OFICIO NO. SOP - DIR - SOP - 0679 - DI - 2023.



Paul R. Gonzalez

NOTA NO. 3 10/MARZO/2023


NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DIERON INICIO LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

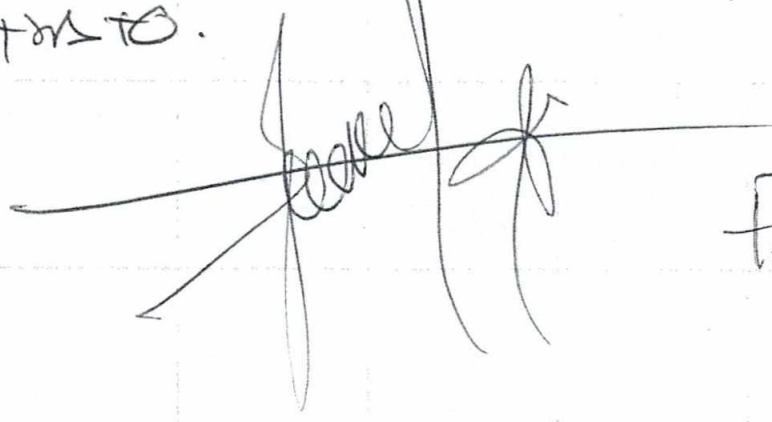

Paul R. Gonzalez

NOTA NO. 4 20/MARZO/2023


PARA ESTA FECHA TENEMOS UN AVANCE DEL 60% EN LA REPOSICION DEL ALCANTARILLADO Y SE INICIA LA REPOSICION DE LA RED HIDRAULICA.



PAUL R. GONZÁLEZ

NOTA NO. 5 31/MARZO/2023.


PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO AL 100%: RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, EXCAVACIONES, CAPA DE SOBRESORTE CON MATERIAL DE BANCO.

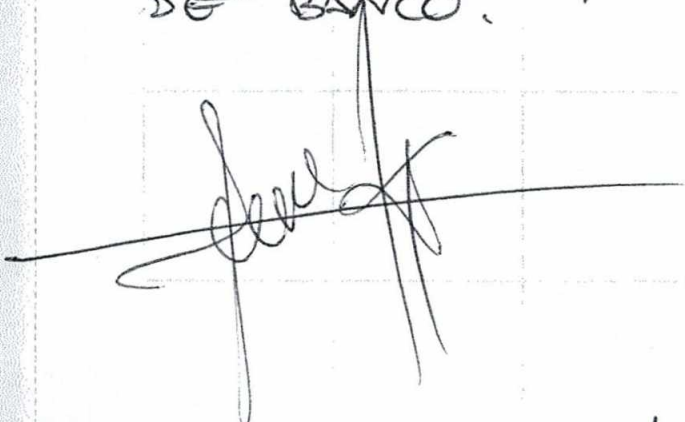

PAUL R. GONZÁLEZ

NOTA NO. 6 10/ABRIL/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS UN AVANCE DE OBRA HASTA NIVEL DE BASE IMPREGNADA.

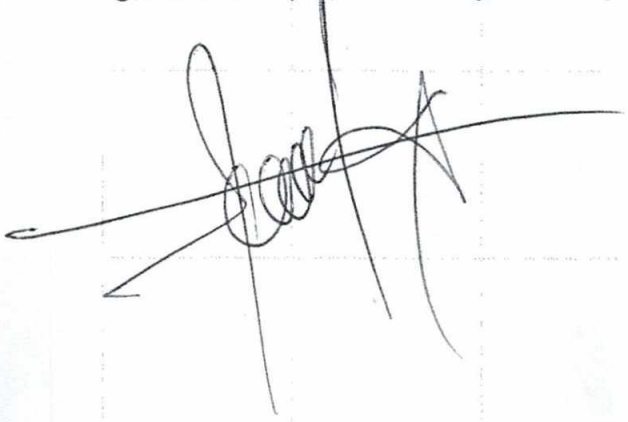

PAUL R. GONZÁLEZ



NOTA NO. 7 19/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE SUPRIME LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 10/MARZO/2023 AL 10/ABRIL/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| IMPORTE TOTAL    | \$ 814,711.84 |
| AMORT. ANTECIP.  | \$ 285,149.15 |
| DEDUCC. CONTRATO | \$ 21,070.13  |
| QUEDANDO A PAGAR | \$ 508,492.56 |

Paul R. Garza


NOTA NO. 8 18/ABRIL/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100% DE LAS GUARDACIONES Y BONIFICACIONES, DE ACORDO AL PROYECTO AUTORIZADO.

Paul R. Garza

NOTA NO. 9 29/ABRIL/2023.

CON ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA EL TOTAL  
DE LA LOSA DE PAVIMENTO DE 15cm ESPESOR  
CONCRETO  $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ .

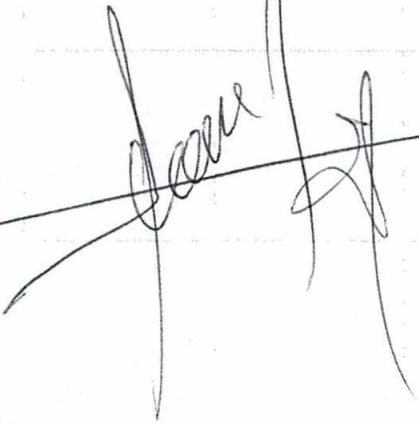

PAUL R. GONZÁLEZ

NOTA NO. 10 29/ABRIL/2023

SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA SOLICITAR  
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS ACERCA DEL AUM-  
BADO PUBLICO Y CANTIDADES ADICIONALES  
DIVERSAS, EN VIRTUD DE CONCLUIR LA OBRA  
PARA SU DEBIDA OPERACION.




PAUL R. GONZÁLEZ



NOTA NO. 77 02/mayo/2023.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION  
NUMERO DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE  
EJECUCION DEL 11/ABRIL/2023 AL 29/ABRIL/23  
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

|                  |    |             |
|------------------|----|-------------|
| Importe total    | \$ | 923,250.47  |
| ASPORT. ANTICIPA | \$ | 332,103.91  |
| DEDUCC. CONTRATO | \$ | 23,877.17   |
| Líquido a pagar  | \$ | 567,269.39. |

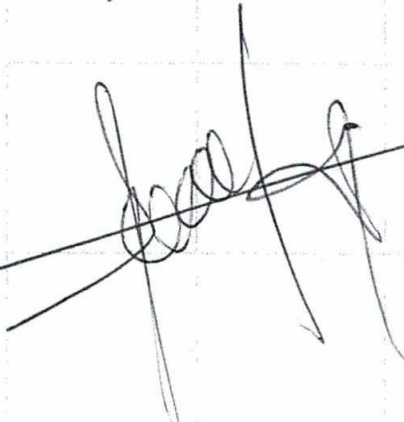  
PAUL R. GONZALEZ

NOTA NO. 12 06/mayo/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADAS LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE FUE NECESARIO AÑADIR AL CONJUNTO DE LA OBRA Y LAS CUALES FUERON PROTOCOLIZADAS MEDIANTE CONVENIO NO. CWA-01-2023-MI-COEO3D-2023, EL CUAL INCLUYE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DE MONTO.




PAUL R. GONZALEZ

NOTA NO. 13 06/mayo/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO TRES ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 30/ABRIL/2023 AL 06/MAYO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Importe total   | \$ 25,617.85  |
| AMORT. ANTICIPA | \$ 0.00       |
| DEDUCCIONES     | \$ 662.53.    |
| Líquido a pagar | \$ 24,955.32. |

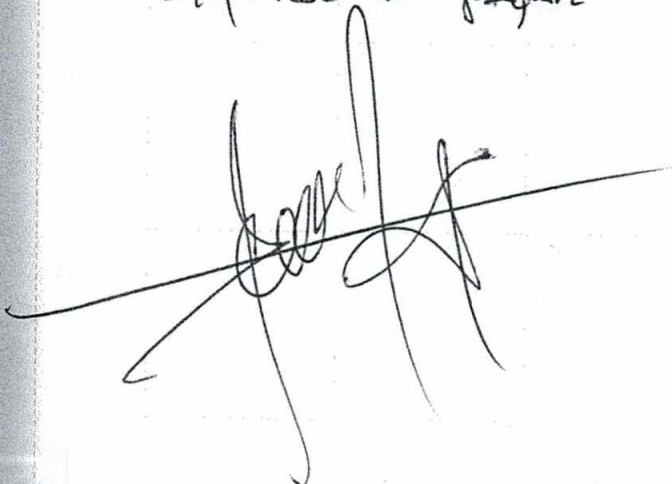


PAUL R. GONZALEZ



NOTA NO. 14 15/MAYO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL NOMBRAMIENTO PÚBLICO Y CONCEPTOS CORRELACIONADOS. MISMO QUE SON PARTE DE UN CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO LEGALMENTE AUTORIZADO.

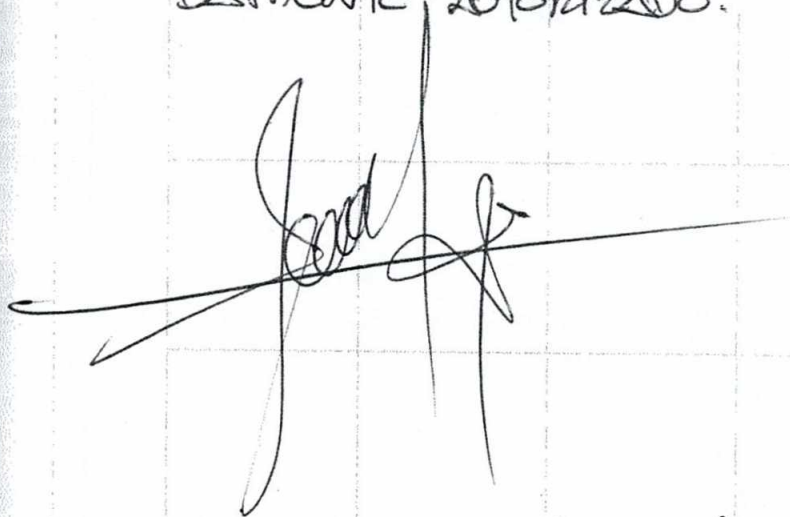


PAUL R. GONZÁLEZ

NOTA NO. 15/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO FINICOITO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/MAYO/2023 AL 15/MAYO/2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| IMPORTE TOTAL   | \$ | 185,863.51  |
| AMORT. ANTICIPO | \$ | 0.00        |
| DEDUCCIONES     | \$ | 4,806.81    |
| LÍQUIDO A PAGAR | \$ | 181,056.70. |

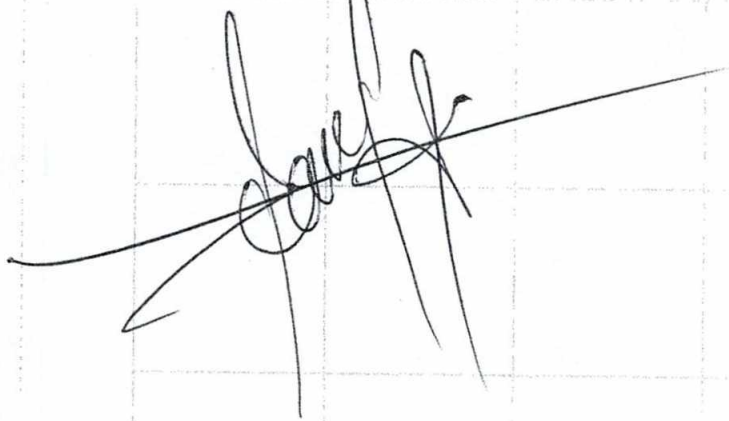

PAUL R. GONZÁLEZ




NOTA NO. 16 16/mayo/ 2023

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA presente bitacora  
EN VIRTUD DE HABER COMPLEDO CON LAS METAS DEL  
CONTRATO Y DEL RESPECTIVO CONVENIO DE AMPLIACION  
DE MONTO.

PAUL R. GONZÁLEZ

NOTA NO. 17 16/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE CANCELAN LAS NOTAS NO  
MENOS 15 Y 16 DEL DIA 15 Y 16 DE MAYO  
2023, RESPECTIVAMENTE.

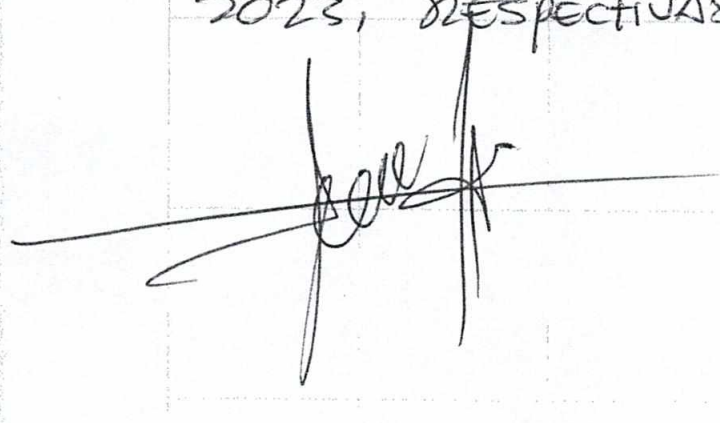


PAUL R. GONZALEZ

NOTA NO. 18 16/MAYO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NOMBRE  
NO Y EXTRAORDINARIA, CON UN PERIODO DE ELEC  
CION DEL 07/MAYO/2023 AL 11/MAYO/2023, -  
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE RESGLOSE:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| IMPORTE TOTAL   | \$ 27,565.76  |
| AMORT. ANTICIPO | \$ 0.00       |
| DEDUCCIONES     | \$ 712.91     |
| LICUADO A PAGAR | \$ 26,852.85. |

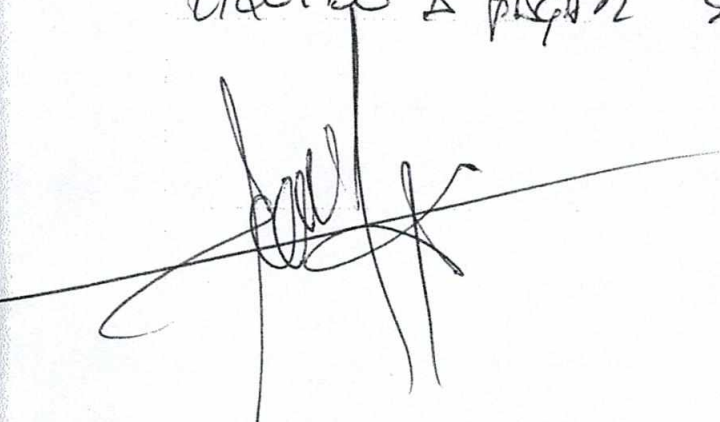

PAUL R. GONZALEZ




NOTA NO. 19 16/mayo/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CINCO EXTRAORDINARIA FINIQUITO, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 12/mayo/2023 AL 15/mayo/2023.

|                 |    |             |
|-----------------|----|-------------|
| Importe total   | ≠  | 158,269.29  |
| AMORT. ANTICIPO | \$ | 0.00        |
| DEDUCCIONES     | \$ | 4,093.17    |
| Liquido a pagar | \$ | 154,176.12. |

 Paul R. González

---

---

---

NOTA NO. 20 16/mayo/2023.

CON ESTA FECHA SE CERRA LA PRESENTE BITACORA  
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON LAS METAS DEL  
CONTRATO Y PROYECTO.

PAUL R. GONZALEZ
