


NOTA #1 Con esta fecha se habre la presente bitacora para la obra: Pavimentacion en calle General Jose Maria Yañez entre Av. Coronel Calisto Peña y Av. Jose castro Valdes en la colonia 21 Marzo en el Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa.

- Contrato No: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1605-2022
- Contratista: Construcciones Electricas y Urbanas Mier S. de CV
- Importe de Contrato: \$ 1,817,736.08 CIVA.
- Periodo de Contrato: Fecha inicio: 23 Mayo 2022
Fecha Termino: 23 Agosto 2022.
- Representante Legal Contratista: Ing. Herminio Mier Ramos.
- Supervisor S.O.P.: Ing. Alejandro Sainz Sanchez

- Con esta fecha se hace la visita de obra con el contratista Ing. Herminio Mier Ramos, Representante Supervision de Secretaria Obras Publicas Ing. Alejandro Sainz Sanchez, donde se hace el recorrido por donde se va ejecutar la obra, no encontrando ningun problema, se hace la entrega del tramo en construccion al contratista para que inicie los trabajos de pavimentacion.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.




Ing. Herminio Mier Ramos
Contratista.

30 MAYO 2022

NOTA# 2 En supervisión de Obra se muestra el siguiente avance.

* Agua Potable
Se hacen los trabajos de trazo y Nivelación de terreno.

- Se hacen los trabajos de excavación, para la colocación de tubería de 3"

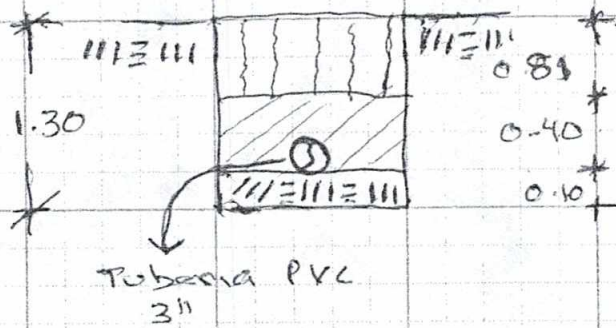

Relleno a Volteo

Relleno Banco o Prod. Exc.

Plantilla Limo

Tubería PVC
3"

NOTA: Se consideran una longitud de 103.90 m entre las calles calle Calixto Peña y calle Jose C. Valdez.




Ing. Alejandro Sanz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Alejandro Mier Ramos
Contratista.

* Drenaje Sanitario 8" P.V.C.

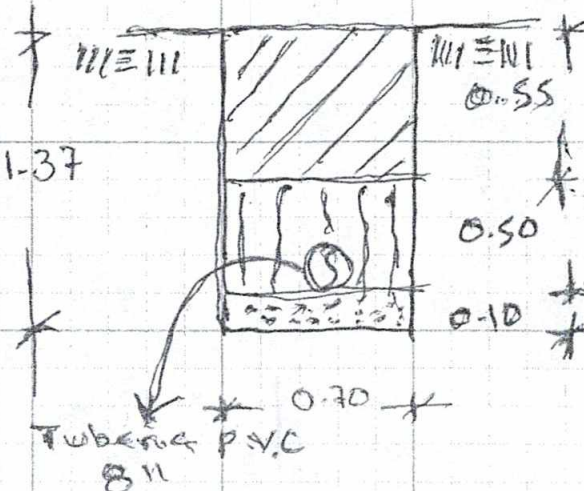

Relleno compactado 95%

Relleno compactado

Plantilla Limo

Tubería PVC
8"




8 June 2022

NOTA #3 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de colocación de tubería para Agua Potable y Tubería de Drenaje Sanitario, contemplando todas las instalaciones.
- Se inician los trabajos de apertura de caja, para los conceptos de la estructura de pavimento hidráulico.

+	0.15cm	Concreto 15cm
+	0.20cm	base 20cm
+	0.20cm	Sub-base 20cm

- Se retira material producto de excavación a fuera de la obra.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Herminio Mier Ramos
Contratista

18 Junio 2022

NOTA # 4 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminan los trabajos de suministro de material de banco Sub-base, base, compactada.
- Se inician los trabajos de impregnación con arena.

* Alumbrado Público.

- Se inician los trabajos de excavación para la colocación de Poliducto Naranja 1 1/2" y Registro eléctrico de 40X40

* Banquetes

Se retira material producto de excavación para la colocación de relleno material inerte, compactado en capas de 20cm.

Ing. Alejandro Sarmiento Sanchez
Supervisor S.O.P.

Ing. Hermilto Mier Ramos
Contratista.

NOTA # 5 1

30 Junio 2022

En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se inician los trabajos de colado de guardas y colado de loses
- Se inician los trabajos de colado de banquetes de 10cm espesor.
- Se continúan los trabajos eléctricos, alumbrado público.

5 Julio 2022

Nota #6 con esta fecha se entrega la estimacion numero uno, cobrandose las sig. Partidas.

* Pavimentacion concreto Hidraulico

- Preliminares	- - - - -	\$ 67,044.63
- Obra Civil	- - - - -	\$ 18,923.10
- Concreto Hidraulico	- - - - -	\$ 490,987.60
- Obras Viales	- - - - -	\$ 332,182.47
- Banquetas, Guardiaunas y Dnd.	- - - - -	\$ 167,557.95

* Alumbrado

- Instalacion Electrica	- - - - -	\$ 147,497.47
-------------------------	-----------	---------------

* Agua Potable

- Preliminares	- - - - -	\$ 23,169.06
- Agua Potable	- - - - -	\$ 90,444.82
- Señalización Vial	- - - - -	\$ 215.27

* Red Drenaje

- Preliminares	- - - - -	\$ 54,928.21
- Obra Civil	- - - - -	\$ 52,254.60
- Agua Potable	- - - - -	\$ 8,865.90
- Alcantarillado	- - - - -	\$ 61,294.93
- Señalización	- - - - -	\$ 45478

Sub-total \$ 1'495,790.78
I.V.A \$ 239,326.51

Total \$ 1'735,117.31



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.



Ing. Herminio Mier Ramos
Contratista

17 Julio 2022

NOTA #7 En supervisión de obra se observando el siguiente avance.

- Se continúan los trabajos de colado de losas pavimento
- Se terminan los trabajos de colado de guardacuerpos
- Se continúan los trabajos de colado de banquetas
- Se continúan los trabajos de instalación Eléctrica, cableado y interconexión.



Ing. Alejandro Saenz Sanchez
Supervisor S.O.R.



Ing. Hermelindo Mier Ramos
Controlador.

NOTA #8

15 Agosto 2022

- En supervisión de obra se observa el siguiente avance.

- Se terminen los trabajos de colado de losas pavimento
- Se terminen los trabajos de colado de banquetas.
- Se terminen los trabajos de instalación Eléctrica. (Alumbrado Público).
- Se inician los trabajos de pintura en guardacuerpos.



23 Agosto 2022


Nota #9 Con esta fecha se finalizan los trabajos de pavimentación en la calle Jose Maria Yañez entre Av. Coronel Calixto Peña y Av. Jose Castro Valades col. 21 Marzo, quedando ejecutados todos los trabajos al 100%.

- Se entrega la estimación numero de 5 Trinquies cobron base las siguientes partidas.

- Pavimentación con concreto hidráulico
Señalización Vial \$ 3,370.10
- Red de Agua Potable
Señalización Vial \$ 6,693.54
- Red. de Drenaje
Señalización Vial \$ 6,693.54
- Extraordinarios \$ 20,822.81

\$ 37,579.99 s/iv

- Quedando un saldo de contrato \$ 33,643.09 s/


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.P.


Ing. Hermilida Mier Ramos
Contratista

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta bitácora

