

NOTA#1 Con esta fecha se abre la presente Bitacora para la obra: Construcción de borda lindero Norte en el centro de resguardo temporal e identificación Humana (CERTIDH) en el Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

Contrato No. OPU-EST-ADJ-PEST-MSF-1605B-2023.

Fecha de Contrato Inicio: 22 Mayo 2023

Fecha Terminación 22 Agosto 2023

Importe de Contrato: \$ 1'139,455.14 C/IVA.

Contratista: Cafeta Soluciones Integrales S. de C.V.

Residente Técnico Contratista Ing. Jonathan Alfredo


Martinez Trujillo.

Supervisor SOP. Ing. Alejandro Sainz Sanchez.

- Con esta fecha se hace un recorrido con el contratista, verificando la ubicación y el lugar donde se efectuara la obra, encontrándose el lugar en buen estado para iniciar los trabajos por lo tanto esta Supervision hace la entrega a la contratista para que inicie los trabajos.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP.



Ing. Jonathan A. Martinez
Trujillo
Contratista

NOTA # 2 En supervisión de obra se observan las siguientes acciones.

- Se hicieron los trabajos de retiro de malla ciclónica existente, dejando en su lugar de en el mismo terreno por el cargo al organismo operador.

- Se hace los trabajos de freza, ubicación de lugar de se ubicaron los zonas aislados de 1.00 X 1.00 X 0.20

- Se continúan los trabajos de excavación con máquina, haciendo los cortes en cenefilla y en cambio a fuerce de la obra.


- Se continúan los trabajos de habilitación de acate para los zepedos aislados, Dadas ! Dele Display y columnas.

Ing. Alejandro Saenz Sanchez
Supervisor SGP


Ing. Jonathan A. Metherell
Contratista

NOTA #3 En supervisión de obra, se muestra el siguiente avance.


- Se terminen los trabajos de ejecución y retiros para las zapatas aisladas.
- Se continúan los trabajos de colado de plantillas, colado de zapatas aisladas por sus lados.
- Se continúan los trabajos de habilitación de acero para Dales de planta y columnas
- Se inician los trabajos de colado de dala de planta y colado de columnas
- Se inician los trabajos de pegado de muro de block arquitectónico.

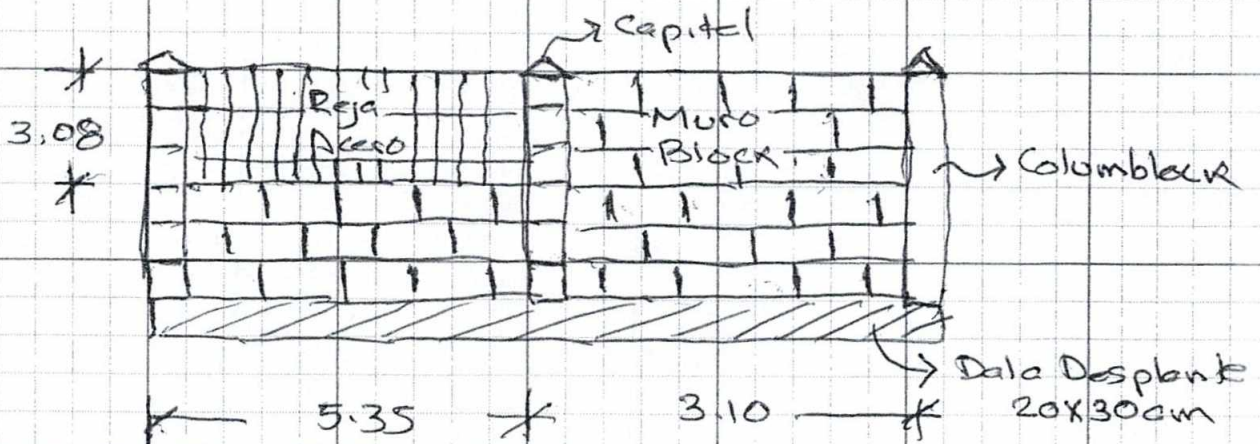

Zapata Aislada

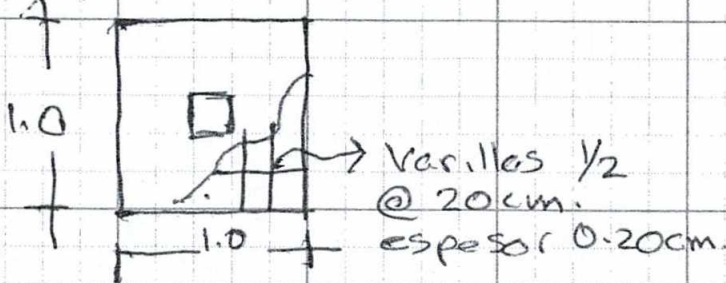

Dado 30x30x80



Mg. Alejandro Pardo Sanchez
Supervisor

Mg. Jonathan A. Martinez Toujilla

NOTA # 4 En supervision de obra se observa el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de coledos de plantillas, Zapatas aisladas, Dadas y Dado desplante.
- Se continuan los trabajos de pegado de block arquitectonicos en Muros.
- Se continuan los coledos de columnas de Columblock.
- Se inician los trabajos de colocacion de rejacasos blancos.




Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor SOP.

Ing. Jonathan A. Medina Puyol
Contratista


NOTA # 5

7 Julio 2023

- Con esta fecha se entrega la estimacion numero uno cobrandose las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$ 129,542.41
- Cimentacion	- - - - -	\$ 102,201.12
- Obra Civil	- - - - -	\$ 12,602.05
- Concreto Hidraulico	- - - - -	\$ 1,100.81
- Herreria	- - - - -	\$ 151,201.09
- Limpieza	- - - - -	\$ 6,114.17

S/IVA \$ 902,761.65


Ing. Alejandro Samz Sanchez


Ing. Jonathan A. Medina Puyol

NOTA #6 En supervisión de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continúan los trabajos de pegado de block en muros.
- Se continúan los trabajos de colado de columnas para column block.
- Se continúan los trabajos de colocación de Reja Acero
- Se determinen los trabajos de colado de Zapatas, Dadas, y relleno con material de producto excavación, y de banco.
- Con esta fecha se soliciten los conceptos extraordinarios para su autorización

- 1: Desmonte, Desentrase Liriano a mano
- 2: Limpieza General a mano
- 3: Retiro Cerca de Malla Ciclónica
- 4: Portón doble Abatible de 7.0X2.50 de Repacero.
- 5: Registro de Valvula de llenado 40X60X40 cm.
- 6: Suministro y colocación de tubería P.V.C 4"
- 7: Reparación de tubería hidráulica 2"
- 8: Banqueta de 10 cm de espesor de 150 kg/cm²
- 9: Suministro y colocación tubería CPVC 1/2"
- 10: Demolicion de Muerto Concreto 25X25X50
- 11: Demolicion de banqueta existente


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SAP.


Ing. Jonathan A. Martinez Pruj
Contratista.

NOTA # 7 En supervision de obra se muestra el siguiente avance.

- Se continuan los trabajos de pegado de block arquitectonicos teniendo un avance de 92% aproximado.
- Se continuan los colados de columnas de columblock teniendo un avance 88% aprox.
- Se inician los trabajos de colocacion del portan doble de 7x2.50 ml.
- Se inician los trabajos de colocacion de puerta pectoral.
- Se inician los trabajos de retiro y limpieza de obra para la entrega.
- Se continuan los trabajos de colocacion de capiteles en las columnas.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP.



Ing. Jonathan A. Martinez T.


NOTA #8 Con esta fecha se entrego la estimacion Dos Fumigato cobrandose las siguientes partidas.

- Preliminares	- - - - -	\$ -	1,618.59
- Cimentacion	- - - - -	\$	11,647.68
- obra Civil	- - - - -	\$	5,998.18
- Herreria	- - - - -	\$	8,640.96
- Limpieza y Fumigacion	- - - - -	\$	1938
- Extraordinarias	- - - - -	\$	54,803.85
		S/IVA.	\$ 79,491.96

- Quedando un saldo de contrato \$ 35.31 S/IVA.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Jonathan A. Martinez Taya
Contratista

- Anotado lo anterior se declare cerrado esta bitacora

