

CONT-0506-2023.

NOTA NO. 1 07/JUN/2023.

CON ESTA FECHA SE APERTORA ESTE LIBRO DE BITS
CON PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL
SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0506-2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

LA SECRETARIA ENCOMENDA A EL CONTRATISTA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE
PRESIDENTE CARLOS CHAVEZ, ENTRE AV. 21 MARZO Y AV.
PDE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. LAZARO CARDENAS, MUNI-
CIPIO DE COLLAHAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS.

MONTO DE CONTRATO: \$ 1'772,200.48

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO:

07/JUNIO/2023.

TERMINO:

07/SEPTIEMBRE/2023.

LA SECRETARIA ASIGNA AL C. ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA
YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1116-A-2023
COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGIS-
TRA SU FIRMA:

LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA
AL C. ING. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ, CON PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRE-
SENTE CONTRATO. A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 07/JUN/2023.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LEANAN A CARGO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SUP-1116-DE-2023.

NOTA NO. 3 07/JUNIO/2023.


CON ESTA FECHA DAN INICIO FORMAL LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 12/JUNIO/2023.

TENEMOS EN TIEMPO DEL Km OTORO AL Km 0+102.65 CON UN DUEÑO PARA APERTURA DE CAJA DE 10.0 ML. DEL CUAL TENEMOS EJECUTADO EL 30%.


NOTA NO. 5 19/JUNIO/2023.




PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DE LA EXCAVACION, SEGUN PROYECTO.
SE HA INICIADO EL ACARREO DE MATERIAL DE
BANCO PARA LA CAPA DE SUBRASANTE, DE 20CMS.
DE ESPESOR.




NOTA NO. 6 26/JUNIO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DE LA CAPA SUBRASANTE DE 20CMS. ESP.
SE ESTA ACARREANDO MATERIAL DE BASE HORDA
OLICA PARCIALMENTE TRITURADA.



NOTA NO. 7 17/07/2023.

PARA ESTA FECHA SE TIENE EJECUTADO EL 100%
DE LA CAPA DE BASE HCA. PARCIALMENTE TRITU
RADOS INCLUYENDO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN

NOTA NO. 8 18/JULIO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 07/JUNIO/2023 AL 17/JULIO/23
LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$	463,958.01
ASORT. ANTICIP	\$	0.00
DEDUCCIONES	\$	11,998.91
LIQUIDO A PAGAR	\$	451,959.10





NOTA NO. 9 31/JULIO/2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 50%
DE GUARNICION Y BANQUETA.





NOTA NO. 10 07/AGOSTO/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DE GUARNICION Y BANQUETA, Y EL 100% DE ALM
BARRIDO PUBLICO. ASI COMO EL 30% DE
LOSA DE PAVIMENTO.

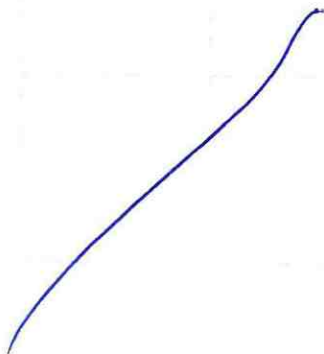






NOTA NO. 11 15/AGOSTO/2023.

SE AUTORIZA A LA CONTRATISTA ~~EJECUTAR~~ CANTIDADES ADICIONALES, DEBIDO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASI COMO TAMBIEN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.



NOTA NO. 12 15/AGOSTO/2023

PARA ESTA OPORTUNIDAD TENEMOS EJECUTADO EL PAV. DE LA LOSA DE PAVIMENTO DE 15 CMS. ESPESOR CONCRETO $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$



NOTA NO. 13 16/AGOSTO/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION AL
MEDIO DES NORMAL, CON UN PERIODO DE EFECTACION
DEL 16/JULIO/2023 AL 15/AGOSTO/2023.


LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:


IMPORTE TOTAL \$ 1'152,080.09


AMONT. ANTICIPO \$ 0.00

REDUCCIONES \$ 29,795.17

LIQUIDA PAGAR \$ 1'122,284.92.









NOTA NO. 14 31/AGOSTO/2023

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%
DE LAS CANTIDADES EJECUTADAS QUE CUBRAN VOL-
MEN EXTRA AL CONTRATADO

NOTA NO. 15 01/SEPT/2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO TRES ADICIONAL CON UN PERIODO DE
EJECUCION DEL 16/AGOSTO/2023 AL 31/AGOSTO/
2023. LA CON PRESENTA EL SIGUIENTE DES-
GLOSE:

Importe total	\$	46,181.99
Amort. anticipo	\$	0.00
DEDUCCIONES	\$	3,780.57
Liquidado a pagar	\$	42,401.42.




NOTA NO. 16 07/Sept/ 2023.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADOS EL TOTAL DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y EN CONSECUENCIA LA OBRA TERMINADA AL 100%.

NOTA NO. 17 07/Sept/ 2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO EXTRAORDINARIA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/Sept/2023 AL 07/Sept/ 2023, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL	\$ 7,771.25
AMONT. ANTICIPA	\$ 0.00
DEDUCCIONES	\$ 200.98
LÍQUIDO A PAGAR	\$ 7,570.27
SALDO A CANCELAR	\$ 2,289.14
ESTIMACION DE FINIQUITO.	

NOTA No. 18 07/sept/2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE
BITACORA, EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO LAS
METAS DE CONTRATO.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a prominent horizontal stroke and several vertical and diagonal strokes.A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a final horizontal stroke.
