

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2406B-2022.
NOTA No. 7 04/ Julio/ 2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITA
CORIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DEL —
SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2406B-2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA EJECU
CION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION EN
AV. CERRO BACHMENA, ENTRE CALLES PRIMERA Y CONSTI
TUYENTE RODOLFO FIENNO, UBICADA EN LA COLONIA BUENOS
AIRES, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO
DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATISTA: BOSCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE
C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARMANDO RAZUETA LEON.



MONTO DEL CONTRATO: \$ 6'558,759.62.

PLAZO DE EJECUCION:

INICIO: 04 DE JULIO 2022.

TERMINO: 04 DE DICIEMBRE 2022.

"LA SECRETARIA" ASIGNA AL C. ING. MARCO ENRIQUE ASTORGA
YANEZ, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DIR-SOP-1019-A-2022,
COMO PRESIDENTE DE OBRA. A CONTINUACION SE REGISTRA
SU FIRMA:



LA CONTRATISTA ASIGNA COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA AL
C. ING. HERIBERTO GUTIERREZ ARCE, CON PODER AMPLIO Y SUFICI
ENTE PARA DIRIGIR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.
A CONTINUACION SE REGISTRA SU FIRMA:

NOTA NO. 2 04/JULIO/ 2022.

LA SECRETARIA PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE SOBRE EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE OFICIO NO. SOP-DM-SUP-1019-DI-2022.

NOTA NO. 3 04/JULIO/ 2022.

NOTIFICA LA CONTRATISTA QUE CON ESTA FECHA DAN INICIO FORMAL LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA NO. 4 15/JULIO/ 2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO UN 75% DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION DEL DRENTE SANITARIO DE PVC 8" ϕ LINEA PRINCIPAL Y PVC 6" ϕ DIAM. DESCARGAS

NOTA NO. 5 22/JULIO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100% DE LA LINEA DE AGUA POTABLE PVC HCO. 3" Ø DIAM. ASI COMO EL TOTAL DE LA TOMAS DOMICILIARIAS.

POR OTRA PARTE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ALEJAR EL CUERPO DE TERRAPLEN. Km 0+000 AL Km 0+359.16.


NOTA NO. 6 04/AGOSTO/2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADA EL TOTAL DE LA EXCAVACION DEL Km 0+000 AL Km 0+359.16 CON UN ESPESOR APROX. PROMEDIO DE 55 CMS.

NOTA NO. 7 08/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO UNO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 04/JULIO/2022 AL 04/AGOSTO/2022, LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

Importe total	\$ 1'296,825.09
Amort. anticipo	\$ 453,886.78
DEDUC. EXTRAORDINARIO ^{CONTRATO}	\$ 33,538.58
Liquidado a pagar	\$ 809,397.73




Ing. Mario E. Astorga



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 8 25/AGOSTO/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUE SON NECESARIOS PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.



Ing. Mario E. Astorga



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 9 05/SEPT/ 2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS CONCLUIDAS LAS CAPAS DE TENDENCIAS QUE COMPLETAN EL CUERPO DEL PAU-
MENTO, DEL TRAMO DEL KM 0+00 AL KM
0+359.16, CONFORMADAS POR COMPLETACION DEL
TERRENO NATURAL (SUPERFICIE DESUBIERTA), CAPA DE
SUBRASANTE DE 20 CMS, CAPA DE BASE DE 20CMS.
PARCIALMENTE TANTUMAM, RIEGO DE IMPREGNACION CON
DRENEO DE PROTECCION.

Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 9 06/SEPT/ 2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION MONERO
DOS NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL
05 AGOSTO AL 05 SEPTIEMBRE 2022, LA CUAL PRE
SENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:



Importe TOTAL	\$ 1'307,310.44 incl. IVA.
Amort. anticipo	\$ 457,558.66
DEDUCC. CONTINUA	\$ 33,809.75
QUEDANDO A PAGAR	\$ 815,942.03

Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 10 06/SEPT/ 2022.

CONT-2406B-2022


CON ESTA FECHA SE ACEPTA LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS EXTRAORDINARIO, CON EL FIN DE QUE LA
OPERACION DE LA OBRA SEA CORRECTA. COBERTURA DE
TOMA DOMICILIARIA, ENTREGA A REGISTRO EXISTENTE
RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO, REMEDIACION DE
POZO DE VISITA.



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 11 06/OCT/ 2022.

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO EL 100%.
DE GUARNICION TIPO 'L' Y BANDERETAS, PARA LAS
LOSAS DE PAVIMENTO DE 15 CMS. ESPESOR CONCRE
TO FIC-330 KG/CM² DEL KM 0+000 AL KM
0+200.



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 12 07/OCT/2022.


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA EST. NORMAL CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 06/SEPT/2022 AL 06/OCT/22. LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

IMPORTE TOTAL \$ 2'377, 127.31

AMORT. ANTICIPO \$ 831, 994.56.

DEDUCC. D' CONTRATO \$ 61, 477.43


LÍQUIDO A PAGAR \$ 1'483, 655.32.

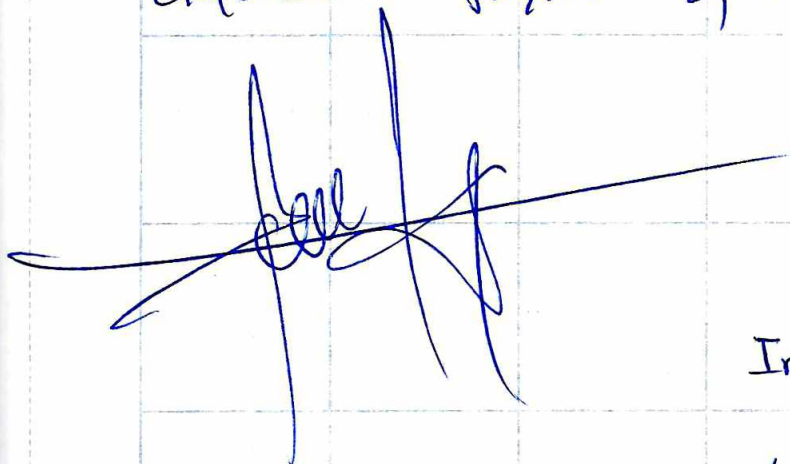

Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 13 07/NOV/2022

PARA ESTA FECHA TENEMOS EJECUTADO LOS VOLUMENES NORMALES DE CATALOGO, ES DECIR, SE TIENEN EJECUTADA TODA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y ALMENDRADO PUBLICO, DE ACUERDO AL PROYECTO ACEPTADO.

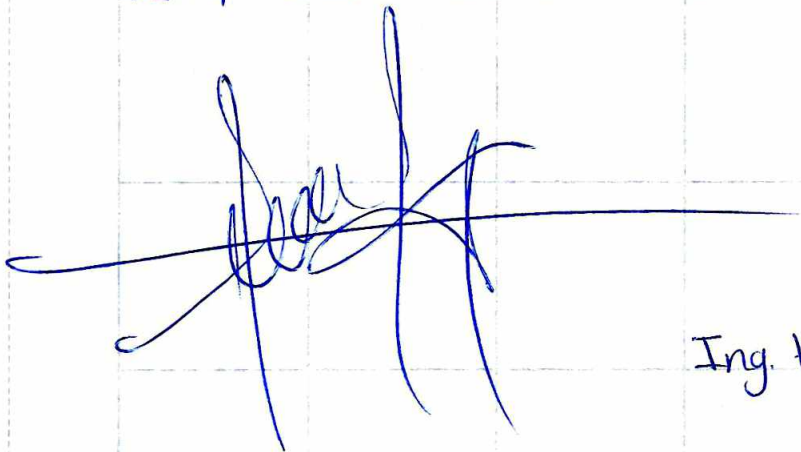


Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 14 07/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO CUATRO NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 07/OCT/2022 AL 07/NOV/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:



IMPORTE TOTAL	\$ 984,928.59.
IMPORTE ANTICIPO	\$ 344,725.01
DEDUCC. CONTRATO	\$ 25,472.79
Líquido a pagar	\$ 614,731.79.



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 15 27/NOV/2022.

PARA ESTA FECHA SE TIENEN EFECTUADAS LAS CANTIDADES ADICIONALES A LOS VOLUMENES CONTRATADOS.




Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 16 28/NOV/2022.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION CINCO ADICIONAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 08/NOV/2022 AL 24/NOV/2022 LA CUAL PRESENTA EL SIGUIENTE DESGLOSE:


Importe total	\$ 420,455.43
Import. anticipo	\$ 147,159.40
DEDUCC. CONTRATO	\$ 10,873.85
LIQUIDO A PAGAR	\$ 262,422.18.

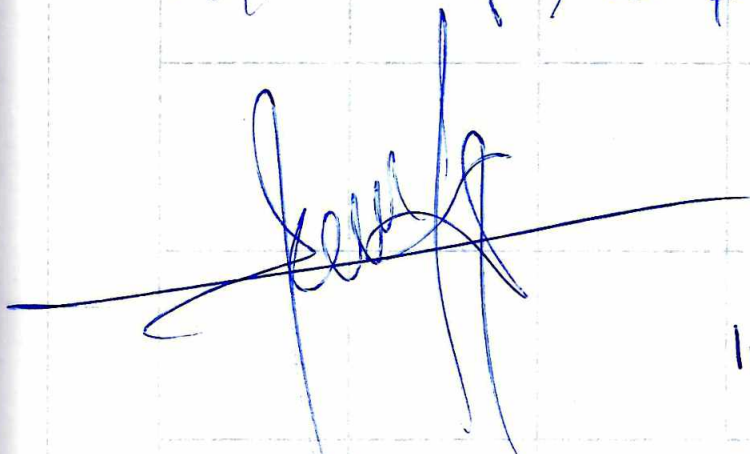

Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 17 04/DIC/2022.



PARA ESTA FECHA SE TIENEN EJECUTADOS TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA INCLUYENDO LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 18 05/DIC/2022.
CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION
NUMERO SEIS EXTRAORDINARIA FINIQUITO,
CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 28/NOV/2022
A 04/DIC/2022, LA CUAL PRESENTA EL SI-
GUIENTE DESGLOSE:



IMPORTE TOTAL \$	165,995.33
IMPORTE ANTICIPO \$	60,239.46
DEDUCC. CONTRATO \$	4,292.98
LÍQUIDO A PAGAR \$	101,462.89
SALDO A PAGAR \$	6,117.43



Ing. Heriberto Gutierrez

NOTA NO. 19 05/DIC/2022.

CON ESTA FECHA SE CIERNA LA PRESENTE
BITÁCORA EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO
LAS METAS DE CONTRATO.



Ing. Heriberto Gutierrez
