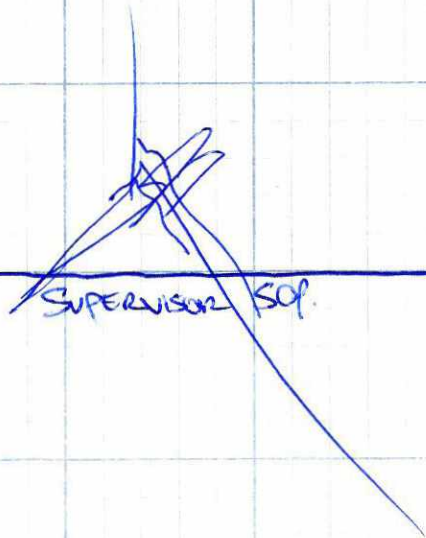



Nota #1, con fecha de hoy, se apertura la presente Bitacora para seguimiento de la obra: PAVIMENTACION EN CALLE ALONCHOFAS ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE BUENAVILLAS, UBICADA EN LA COL. VISTA HERMOSA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, NÚMERO DE CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0202-2023
Importe - \$ 2,466,454.61 c/wa
Anticipo 35% - \$ 863,259.11 c/wa
PERIODO DE CONTRATO. 13/02/2023 - 14/05/2023.




SUPERVISOR SQF.
CONTRATISTA

Nota #2. CON FECHA DE HOY SE HACE ENTREGA DE INVENTARIO PARA CONTRATISTA REALICE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CATALOGO.

Nota #3 SE INICIAN LOS TRABAJOS EN OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE.

17/02/2023
Nota #4 CONTINUAN LOS TRABAJOS, EXCAVACION EN CORTE EN MATERIAL TIPO "C" PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE.



Nota #5: MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.


Supervisor Sop
Contratista

Nota # 6. CON FECHA DE HOY, SE OBSERVAN
AVANCES, REGISTRO DE ABARAL DE O 40 X
Ø. 60 M DE CLARO LIBRE DE 1.00 M
DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE
DE BARRA ROJO, PLANTILLA $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$
T.M.A. $3/4"$ DE B.C.M.S., MADERA $1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{8}"$
CONTRAMURO TAPA DE CONCRETO ARMADO CON
VARILLAS $3/8"$ @ 15 CM

Nota # 7. - RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE
PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMLON DEVEDO,
A 10 KM DE DISTANCIA.

Nota # 8. - MEZCLADO, TENDIDO Y
21/02/2023
COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CUERPO DE
BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PEQUEÑO COMPACTADO AL 100% VOLUMEN
MEDIDO COM PACTO.




SUPERVISOR S.P.
CONTRALISTA

NOTA #9. RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 LT/M² DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT.

NOTA #10. SE OBSERVAN 02/Mar/2023
AVANCES
DE LOS TRABAJOS EN LAS PARTIDAS
DE REO DE DRENAGE Y AGUA POTABLE
INSTALACIONES,

NOTA #11. SE SUMINISTRAN PIERRES E INSTALACION 03/Mar/2023
DE LAS MISMAS, LYE DE 8" X 6" DE PVC.
TUBERIA PVC. 6" Y 8".

NOTA #12. SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE 06/Mar/2023
OBRAS DE CONSTRUCCION, BANDA PREVENTIVA EN
ZANGA OBRA, CONTRATISTA PREPARA EST 1 Norma
CON CARPETA CONTRALORIA, Y EST 2 ADICIONAL
PARA SU REVISION Y POSTERIORMENTE APROBACION.


Supervisor Sef.
Contratista

NOTA #13. CON FECHA DE HOY SE AUTORIZA LA ESTIMACION 1 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 1,000,739.80 C/IVA, PERIODO DEL 13/02/2023 AL 13/03/2023.

QUEDANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS.

- PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARIOS	\$ 125,739.64
P06 OBRAS VIALES	\$ 330,275.77.

- RED DE DRENAGE

P01 PRELIMINARIOS	\$ 58,094.27
P03 OBRA CIVIL.	\$ 108,211.62
P18 AGUA POTABLE	\$ 23,078.8
P22 ALICANTARILLADO	\$ 122,873.87
P34 SEÑALIZACION VIAL	\$ 8,978.02


- RED DE AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARIOS	\$ 28,141.32.
P18 AGUA POTABLE	\$ 117,551.22
P34. SEÑALIZACION VIAL	\$ 8727.63

← TOTAL SIN IVA \$ 931,672.24



COMPTROLLER



SUPERVISOR
SEP.

NOTA #14

13 / Marzo / 2023

SE AUTORIZA LA ESTIMACION 2

ADICIONAL, CON UN PERIODO DEL 13/02/2023

AL 13/03/2023, Y UN IMPORTE DE \$321,681.68 IVA

QUEDANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

- PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARES \$257,138.82

P06 OBRAS VIALES \$1438.97

- RED DE DRENAGE


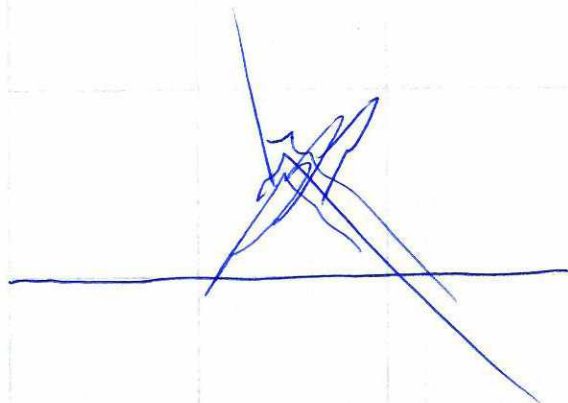
P01 PRELIMINARES \$8,529.37

P22 ALLANTOBILLAS \$311.20

- RED DE AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARES \$9,311.17

P34 SEÑALIZACION VIAL \$279.27

TOTAL SIN IVA = \$277,331.00

14/03/2023
 Nota # 15. CONTRATISTA PRESENTA
 OFICIO SOLICITUD CONVENIO MODIFICATORIO
 PRESUPUESTO MODIFICADO \$2,739,834.71
 DIFERENCIA \$273,370.00.

Nota # 16. SEGUEN CON TRABAJOS. 17/03/23
 GUARNICION TIPO "U" con concreto
 PROMEZCLADO $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ para losas
 de 15 cm DE ESPESOR

22/03/23
 Nota # 17. BAJERITA DE 10 cm DE ESPESOR
 con concreto HIDRAULICO PROMEZCLADO
 $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, ACABADO ESCOBILLADO

24/03/23
 Nota # 18. SUMINISTRO DE CONCRETO
 PROMEZCLADO $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ TMA 1 1/2"
 EN LOSAS DE 15 cm DE ESPESOR, CIMENTA
 COLADO, VIBRADO, TMA SE, ACABADO PAVADO
 CUANDO, ETC. CONTRATISTA PRESENTA A
 LEVISON ESTIMACION 3 normal.

Supervisor

CONTRATISTA



Nota #19- Con fecha de Hoy.

Se autoriza estimación 3 normal
comprende periodo del 14/03/2023
al 27/03/2023. Importe \$/vlt \$42,367.58
- pavimentación

p/s concreto HERRAUCLO \$444,297.06

~~p/s BANQUETAS~~ GUARNI-
ONES Y ANDARONES \$298,070.52

\$442,367.58



Nota #20-

31/03/2023

CONTINUAN LOS TRABAJOS, REGISTRO
PREFABRICADO DE CONCRETO 40 x 40 x 40 CM
CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR
CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO
DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" CONTRAMARQUE
ÁNGULO DE 1 1/4" x 1/8"

Nota #21

03/04/2023


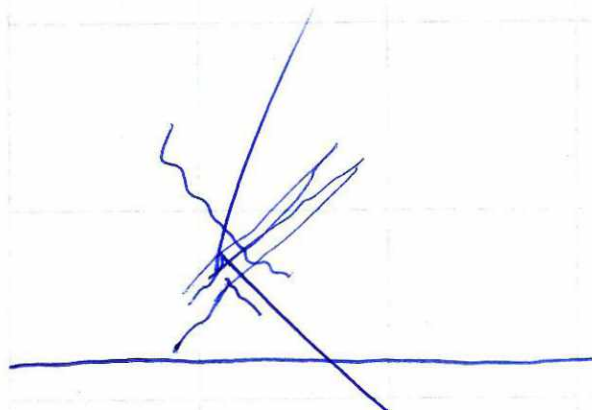
Con fecha de hoy,

Se suministren y coloquen luminarias
vial Elektra con chips LED tecnologia
SMD, con foto-sensor, 100 Watts,
(para calles principales), 4000/5000K
eficiencia de por lo menos 152 LM/W,
proteccion optica...

Nota #22 Suministro y colocacion de conducto

Naranja reforzado de (Ø 1-1/2") - ,

Cable AL XLP 2+1 cal. + subteraneo
para alimentar luminarias.



OPPU-~~DT~~-LP-PEST-VIAL-0202-2023

11/04/2023

Nota #23.

Se AUTORIZA LA ESTIMACION # 4 NORMAL
CON UN PERIODO DEL 20/03/2023 AL 11/04/2023
AUMENTANDO



P20 INSTALACION ELECTRICA

\$ 169,331.64

AMORTIZANDO TOTAL ANTICIPO



SIVA \$ 169,331.64

NETO A RECIBIR = \$ 120,334.40



Nota #24 - -

AUTORIZACION DE CONVENIO MODIFICATORIO
DE IMPORTE, CONV-01-2023 - M1-C0202-2023
POR \$ 273,358.46 CIVA.





#25.- SE AUTORIZAN PRECIOS EXTRAORDINARIOS CON NUMERO DE OFICIO: SOP/DEP/216/2023 EN RESPUESTA A L SOP-DIR-SUP-DIO-P-U-2023, CONTRATO OPLU-EST-REST-VIAL-0202-2023

EXT 01	SONDEO TUBERIAS ---	PZA	\$ 429.02
EXT 02	SONDEO TUBERIAS ---	PZA	\$ 715.01
EXT 03	REPARACION DE TUBIA ---	PZA	\$ 555.68
EXT 04	EXCAVACION CON MAQUINARIA M3		\$ 590.17
EXT 05	TRAZO Y NIVELACION ---	M2	\$ 13.80

SE ANEXA COPIA A ESTIMACION S EXT-FIN.

#26.- CONTINUAN LOS TRABAJOS.

RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS... BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'c 150 kg/cm²... PINTURA EN GUARNICION DE 20x15 cm, CON PINTURA tipo TOAFICO SCT COLOR AMARILLO, O BLANCO.

OPPU-EST-LP-REST-VIAL-0202-2023


#27.- CONTINUAN LOS TRABAJOS.-

PAGO A CFB POR CONTRATACION, PAGO
POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO,

#28.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, 21/04/2023

SONDEOS DETUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE
EXISTENTES (TOMAS Y DESCARGAS),REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES
EN REPOSICION DE RED Y TOMAS DOM.,

24/04/2023

#29.- EXCAVACION CON MAQUINA EN
ZANJAS EN MATERIAL "C" Roca D=0.00
A 2.00M DE PROFUNDIDAD, TRAZO
Y NIVELACION DEL TERRENO DEL TERRENO ESTA-
BLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA#30.- CONTRATISTA ENTREGA A REVISION
EST EXT-FIN #5.



SUPERVISOR SOL.



CONTRATISTA

OPV-EST-LP-POST-VIAL-0202-2023

#31.- CONFECTA DE HOY, SE
AUTORIZA ESTIMACION OS EXT-FINQUITO, CON
PERIODO DEL 12/04/2023 AL 08/05/2023,
IMPORTE 259,241.24 CLIVA, LIQUIDO AFAGAN
\$ 252,536.73, SALDO QUE SE CANCELA
\$ 20,579.7 CLIVA,, DOCUMENTAMENTE
COMPLETA, SE PROCEDE AL CIERRE DE
BITACORA.


SUPERVISOR
SOP.
CONTRATISTA
