

OFICIO No. OPDUyE/595/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 03 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$1,077,850.22 (UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- R.F.C. CAM-871226-MS5
- DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320
- No. DE FACTURA: # 149, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

03 NOV 2025

RECIBIDO

C.C.P. ARCHIVO.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226MS5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 149
Fecha: 1/11/2025 09:33:14
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

R.F.C.: MBA850101214

Domicilio fiscal: 80500

Uso CFDI: 101 - Construcciones.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN- 007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 3,562,812.95	953,849.75	002 - IVA - 152,615.96	953,849.75
				IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 953,849.75 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 0.00 TOTAL: \$ 953,849.75 (+) MAS 16% IVA: \$ 152,615.96 TOTAL: \$ 1,106,465.71 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 28,615.49			
				SALDO LIQUIDO: \$ 1,077,850.22			

Importe con letra

UN MILLON CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.

Subtotal	953,849.75
Impuestos Traslados	152,615.96
Ret. Local 3% SVICUT	0.00
Total	1,106,465.71

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

04 - Sustitución de los CFDI previos

CFDI Relacionados

5213ECBC-7754-4E92-9497-4CEE6DC19069



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000714582475
24162FBE-6B0C-4A48-B80A-E41C95B23F34
00001000000709182898
Noviembre 1 2025 - 10:33:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NRihzbBHOx9k6IZBG13IQVgDZp5fn7RpQhVg8MjvM7VnqslRSIYLAefmeB9JmflhdklJAtf8hldlk73EMllgNx
fpqkvbF1rZ44ToMO/gExY4lyhN1J2ty0hiPACRUyYdAKkfo94DuPPBLV9P4IZzG4N3q77viSKbGk477yGSapj
RkHV+PLXNRiK0BqswiSDwMs/oe5+d+2WCvIPsU4Dv1NcaOn4pYE984gttMB5W04uzLF4aiOIQUYBU2vHqObfAB
liuD9b22cFw7vr7ScwjHoMCK8rIskt1400iQj6GmOZONGHXSehaUveTKHt92iPc9b8iyQhuGfcm9APpbA41A==

Sello del SAT

UUDjt608EvFSnjdWe4iYBJV/r9RheOmr8ajPj8eQApZTPY0ehpK/BGQHWlkDcQFpsb8RnxYpEqO9sMR
kOwk0NQj6+KoiDMU/rJSPRSrEQ+ag3i7AdgdBjrvAsx3iXMIj3pkKSk7DuPjKkIFiCwXOALaKoPLXFKY
pqRIS5ePClyZFNsWnmKKB8jBjOoCBrQFj2EkJpP8vPnCTgG980yokfsmV9dXU9zi6ulsvpQ1lvcRop
cm7h181A5PW0dDGRqh0iE+Vu46cNChAR/OS1f025xbeHDSJSD1aKk4wXh5SCSx/1a/V3Gg2Q6eqSCS
Jra0WHY2H8fnnEskTQisew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|24162FBE-6B0C-4A48-B80A-E41C95B23F34|2025-11-01T10:33:16|MAS0810247C0|NRih
zbBHOx9k6IZBG13IQVgDZp5fn7RpQhVg8MjvM7VnqslRSIYLAefmeB9JmflhdklJAtf8hldlk73EMllg
NxfpqkvbF1rZ44ToMO/gExY4lyhN1J2ty0hiPACRUyYdAKkfo94DuPPBLV9P4IZzG4N3q77viSKbGk4
77yGSapjRkHV+PLXNRiK0BqswiSDwMs/oe5+d+2WCvIPsU4Dv1NcaOn4pYE984gttMB5W04uzLF4aiOI
QUYBU2vHqObfABliuD9b22cFw7vr7ScwjHoMCK8rIskt1400iQj6GmOZONGHXSehaUveTKHt92iPc9b8
iyQhuGfcm9APpbA41A=|00001000000709182898|}

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfd40.xsd" Version="4.0" Folio="149" Fecha="2025-11-01T09:33:14"
Sello="NR1h2BhIOx9K6J7B6G13IQYGDZp5fn7RQONvgh8jvM7Vnq5IRS1YAEfme89JmfIndkLjAt8h1dlk73EM1LgNkfpkvbf1rZ44tOmO/geXv4IyhM1Jj2ty0hiPACRUyDdAKft094DuPPBtV9P4IZZG6N3q7V1SKbGk47YGSapjRkHv+PLxNRik0BqswiSDmTs/
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="W1G6ZC8HegAW1BAgIUMDAMWEMWMDAM2MT01OD18NLUYMDQYJkOZihvGNMqE1BQAWG6VNTLWmWYVDQDDCxB0YBERHv8J0N5VKJDSU8gREUgURNSU5JUIRSQU
SubTotal="953849.75" Moneda="MXN" Total="1106465.71" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81320">
  <cfdi:Relacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:Relacionado UUID="5213ECBC-7754-4E92-9497-ACEE6DC19069"/>
  </cfdi:Relacionados>
  <cfdi:Relacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MS" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="WBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  </cfdi:Relacionados>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="501" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RITOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SIMALOA. CONTRATO No.: MB6RR-LP-FAISMN-007/2025 MONTO DEL
CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 953,849.75 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 953,849.75 (+) MAS 16% IVA: $ 152,615.96 TOTAL: $ 1,106,465.71 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $
28,615.49 SALDO LIQUIDO: $ 1,077,850.22" ValorUnitario="953849.75" Importe="953849.75" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="953849.75" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="152615.96"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="152615.96">
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="152615.96" Base="953849.75"/>
  </cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="152615.96" Base="953849.75"/>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv1.1.xsd" Version="1.1" UUID="24162FBE-680C-4A48-B80A-E41C95B23F34" FechaTimbrado="2025-11-01T10:33:16"
RfcProvCertif="WAS0810247C0"
SelloCFD="NR1h2BhIOx9K6J7B6G13IQYGDZp5fn7RQONvgh8jvM7Vnq5IRS1YAEfme89JmfIndkLjAt8h1dlk73EM1LgNkfpkvbf1rZ44tOmO/geXv4IyhM1Jj2ty0hiPACRUyDdAKft094DuPPBtV9P4IZZG6N3q7V1SKbGk47YGSapjRkHv+PLxNRik0Bqswi
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="UUDj60BEVf5njdm4LYB3JV/r9Rheom8aJfJ3eQAPZTPV0ehpk/8GQhwLKDcQfpsb8nxyPcqd95NRKowk0N06j6+K0IDWUvJ5PRSrEQ+ag3I7Adgd8JrVAsx3EXMLj3pKKSj7DuPJkIEtcwX0ALakOpLXfKYp0R1S50PCJyZFNsmnmKB8jBj0cCB
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 25-ago-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 01 (NORMAL)	
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 0		DEL	25-jul-25
CEL: 668 861 92 28		AL	25-ago-25
R.F.C. CAM-871226-MS5		FECHA DE CONTRATO:	
		21-jul-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	MUNICIPIO: BADIRAGUATO	INICIO:	25-jul-25
		TERMINACIÓN:	01-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$3,071,390.47	\$3,562,812.95	\$0.00	\$3,562,812.95
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 1,077,850.22
\$ 1,077,850.22 (SON UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (NORMAL)			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 953,840.75
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A. 16 %	\$ 152,615.96
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,106,456.71
3 % SVIFYC:	\$ 28,615.49	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 28,615.49
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 28,615.49		
		SALDO A PAGAR:	\$ 1,077,850.22

ELABORO

C. JOSÉ ERRIÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		Estimación:	
Fecha:				25 de agosto de 2025		01 (NORMAL)	
Periodo de la estimación:		25/07/2025	al	25/08/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:		25/07/2025	al	01/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$	3,562,812.95	\$	3,071,390.47	\$	-	\$ -	31%
						% Avance Total	31%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 953,849.75	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 152,615.96	\$ 1,106,465.71
	Sub- Total A (=) \$ 1,106,465.71	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ -	\$ -
	Total (=) \$ -	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 953,849.75	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 152,615.96	\$ 1,106,465.71
	Total (=) \$ 1,106,465.71	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 28,615.49	CONTRATADO
\$ -	Total Deducciones (=) \$ 28,615.49	\$ 3,562,812.95
	Importe T O T A L \$ 1,077,850.22	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,077,850.22	SALDO
\$0.00	Son: (SON UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N.)	\$ 2,456,347.24

ELABORO

C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHONE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.
C.P. 81320
R.F.C. CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:		BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:		01 (NORMAL)	
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
FECHA INICIO CONTRATO:		25-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	01-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025			FECHA CONTRATO:	21-jul-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$3,071,390.47		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:							
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			AL				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,562,812.95		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:			IMPORTE TOTAL CONTRATADO:			\$3,562,812.95	
No. DE ESTIMACIÓN		PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)		25-jul-25	25-ago-25	\$ 1,106,465.71	\$ 953,849.75	\$ 28,615.49		\$ 28,615.49		\$ 1,077,850.22	

ELABORO

C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORE

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

25/08/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**

R.F.C.

CAM-871226-MS5

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

OBRA	IMPORTE
PRELIMINARES	\$ 953,849.75
ESTRUCTURA	\$ -
OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 953,849.75
SUB TOTAL=	\$ 953,849.75
I.V.A AL 16 %	\$ 152,615.96
TOTAL =	\$ 1,106,465.71

ELABORO

C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025
HOJA: 1 DE 3

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MSS

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT.	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,218.76	\$ 20.25	\$ 44,929.89	2,218.76	0.00	0.00	2,218.76	\$ 44,929.89
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-PASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,220.32	\$ 126.43	\$ 154,285.06	1,220.32	0.00	0.00	1,220.32	\$ 154,285.06
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	1,677.60	\$ 31.34	\$ 52,575.98	1,677.60	0.00	0.00	1,677.60	\$ 52,575.98
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	1,677.60	\$ 194.00	\$ 325,454.40	1,677.60	0.00	0.00	1,677.60	\$ 325,454.40
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	1,677.60	\$ 224.49	\$ 376,604.42	1,677.60	0.00	0.00	1,677.60	\$ 376,604.42
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,677.60	\$ 52.80	\$ 88,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 953,949.75
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	336.10	\$ 800.47	\$ 269,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -

ELABORÓ:
C. JOSÉ EFFRÉN URIAS BOUJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ:
ING. ROBERTO RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025
HOJA: HOJA:2 DE 3

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP068	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	86.03	\$ 675.07	\$ 58,076.27	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP60	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,352.90	\$ 942.80	\$ 1,275,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	811.74	\$ 33.11	\$ 26,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	270.58	\$ 112.99	\$ 30,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	336.10	\$ 51.90	\$ 17,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.23	\$ 188.73	\$ 20,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	541.17	\$ 566.91	\$ 306,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ -
3	OTROS									

ELABORÓ
C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CANTERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ
ING. RUDOLFO RIVERO RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025
HOJA: HOJA:3 DE 3

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA, C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR071	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,718.12	\$ 4,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,218.76	\$ 8.79	\$ 19,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE MUROS:										\$ -

TOTAL ESTIMACION	\$ 953,849.75
I.V.A.	\$ 152,615.96
TOTAL	\$ 1,106,465.71

ELABORO
C. JOSÉ EFREN URBAS DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. ROBEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

<div>COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV</div> <div>CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUAYVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320</div>									
<div>NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA</div> <div>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</div>									
01 (NORMAL)									
GENERADORES ESTIMACION:									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES						PARCIAL	TOTAL	
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	270.58	8.20			2,218.76		
							TOTAL	2,218.76	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	270.58	8.20	0.55		1,220.32		
							TOTAL	1,220.32	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	270.58	6.20			1,677.60		
							TOTAL	1,677.60	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	270.58	6.20			1,677.60		
							TOTAL	1,677.60	

ELABORO

ING. ORLANDO MURRAY CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

<div>COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV</div> <div>CALLE MANZANA 18 LOTES 4,5 Y 6, VILLA CUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320</div>									
NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA									
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	270.58	6.20			1,677.80		
							TOTAL	1,677.80	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LARA MANCERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA BLOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUAYABO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP16	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LARA SANCERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUAYO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
3	OTROS								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PIR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LAURIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, AHONIE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DEPENDENCIA:

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: **COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**
OBRA:

ESTIMACION: **01 (NORMAL)**

1 PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

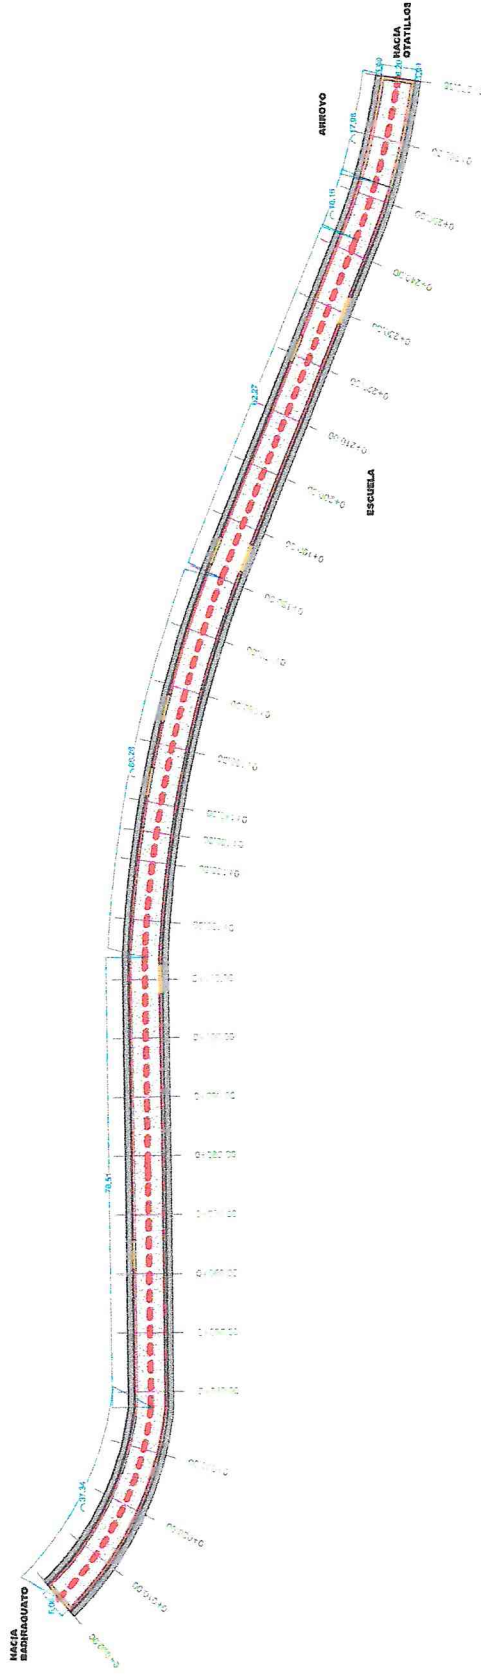

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN PERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 19 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ, AHOENE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/08/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRÁFICO


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V. OBRA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

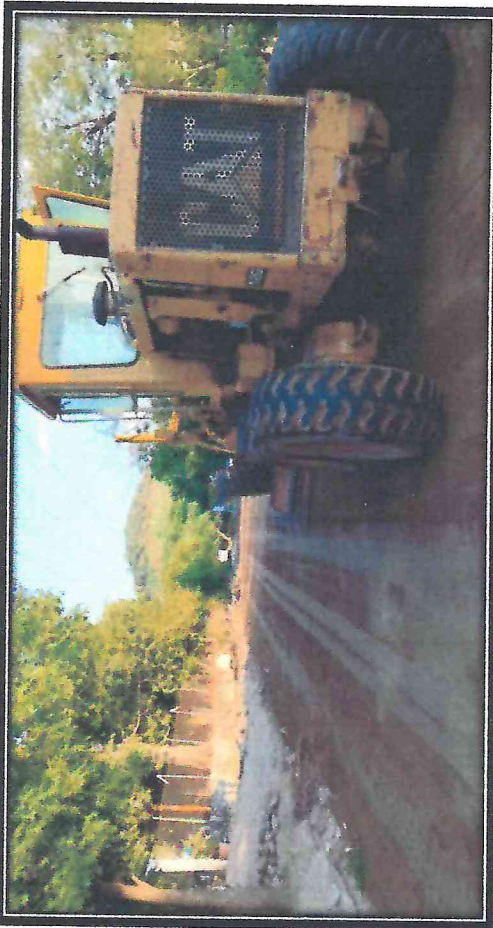

ELABORO

ING. ORLANDO LARREA CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta

03/11/2025 8:40:43 PM

Contrato

00798320

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM LP 007

Importe de la operación: 1,077,850.22 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha valor: 04/11/2025

Fecha de creación: 03/11/2025

Fecha de aplicación: 03/11/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM LP 007

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 20:40:32

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000731279

Clave de rastreo: 002601002511040000731279

Folio de firma: 0031890056

Folio único: I401202511032040320031890062

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
