

OFICIO No. OPDUyE/604/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 05 de Noviembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$1,022,355.34 (UN MILLON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- R.F.C. CAM-871226-MS5
- DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320
- No. DE FACTURA: # 150, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226MS5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago

Método de pago

Moneda:

Exportación:

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

01 - No aplica

Folio

Fecha

Tipo de cambio:

- 150

4/11/2025 07:32:22

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

R.F.C.: MBA850101214

Domicilio fiscal: 80500

Uso CFDI: 101 - Construcciones.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 3,562,812.95	904,739.24	002 - IVA - 144,758.28	904,739.24
				IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 904,739.24 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 0.00 TOTAL: \$ 904,739.24 (+) MAS 16% IVA: \$ 144,758.28 TOTAL: \$ 1,049,497.52 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 27,142.18 SALDO LIQUIDO: \$ 1,022,355.34			

Importe con letra

UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.

Subtotal

Impuestos Traslados

Ret. Local 3% SVICUT

Total

904,739.24

144,758.28

0.00

1,049,497.52

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000714582475

3E44CD61-B3ED-479B-AE6D-8DDE0AFC4CB5

00001000000709182898

Noviembre 5 2025 - 08:27:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LsWAackKebAH8brCwPRmH4fByX0yAVX4NOILpNKsz1mFgXFW2rYz2sY31rBNmL3En4Jha/vVnuZzIViB19kLH
B9eNN02MhkiUQH06B4JC7/cs1DQoLqCldRg1XECb+bgWqJrpsCimJnm+y6CYG1iFP+B1n/AubR+km5OyX92+7v
J/P6SaBoTWNuxHdRpsAQGLzP+oekv/lnkZisdH/RiadcNTZTo4QUWL9CnWoU59QIABCFqVPNlosQd1lw2o2c
FSE/YRVeyDaH5bj8UrKBy+bcOIBmcH9gfhwisfQdviYnIU1va4GhlitxHngODjDFUZHw16GOArRp6GQCfw==

Sello del SAT

BCMMFXXOmYZqa8L9KF9GPzx34haf2n05EvMhK6vqf6uDaxnof8bamnc857bjZqa0oHmUUFx/nwilejNo
ZdndGINGvOanLW+ro1T4svIRYrdUfQeftOrcnq9Hr2JDvnrRoVoKoKA1aSKLDz6r7chudTAD22NJYhDe
mwGrB8rOb6MDEDCoggDYDPCZi9NDGMnSszTGma8ZSoqYtOidZgtUVAhxUyOGLVoyf1TNZ5Pr9FKcb1a1
PSK64B7JK7K7cXkIT8jg17/mZc2Jh5lcVilnG9apk3yOofvsGetMPefm371X15Z6IMGHJIG3t8uguGA
X1cfy9giGa1QXckYZQmjaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][3E44CD61-B3ED-479B-AE6D-8DDE0AFC4CB5]2025-11-05T08:27:24[MAS0810247C0]LsWA
ackKebAH8brCwPRmH4fByX0yAVX4NOILpNKsz1mFgXFW2rYz2sY31rBNmL3En4Jha/vVnuZzIViB19k
LH9eNN02MhkiUQH06B4JC7/cs1DQoLqCldRg1XECb+bgWqJrpsCimJnm+y6CYG1iFP+B1n/AubR+km5
OyX92+7vJ/P6SaBoTWNuxHdRpsAQGLzP+oekv/lnkZisdH/RiadcNTZTo4QUWL9CnWoU59QIABCFqV
PNlosQd1lw2o2cFSE/YRVeyDaH5bj8UrKBy+bcOIBmcH9gfhwisfQdviYnIU1va4GhlitxHngODjDFU
ZHw16GOArRp6GQCfw==[00001000000709182898]

Figure 1

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="150" Fecha="2025-11-
04T07:32:22"
Sello="LsWAscKebAH8brCwPrmH4fByX0yAVX4NOILpNkszmFgXFW2rYz2sY31irBNmL3En4Jha/vVnuZz1vB19kLHB9eNNo2MhkiUQH06B4jC7/cs1DQoLqCldRg1XECb+bgWqJrpsCimJnm+y6CY
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGjzCCBHeGawIBAgIUMDAWMDewMDAmdA3HTQ1ODI0NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMAYDVQ0DCx8QyBFRIUgwU0VSVk1DSUs8REUeQUJRNUSUJ1RSQUNJNT04gVFJJQ1VU
SubTotal="904739.24" Moneda="MXN" Total="1049497.52" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="81320">
<cdfi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MS5" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
<cdfi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cdfi:Conceptos>
<cdfi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="501" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 02
(NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE
LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGQR-LP-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 904,739.24 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 904,739.24 (+) MAS 16% IVA: $ 144,758.28 TOTAL: $ 1,049,497.52 DEDUCCIONES 3%
SVIFYC: $ 27,142.18 SALDO LIQUIDO: $ 1,022,355.34" ValorUnitario="904739.24" Importe="904739.24" ObjetoImp="02">
<cdfi:Impuestos>
<cdfi:Traslados>
<cdfi:Traslado Base="904739.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="144758.28"/>
</cdfi:Traslados>
</cdfi:Impuestos>
</cdfi:Concepto>
</cdfi:Conceptos>
<cdfi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144758.28">
<cdfi:Traslados>
<cdfi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="144758.28" Base="904739.24"/>
</cdfi:Traslados>
</cdfi:Impuestos>
</cdfi:Complemento>
<cdf:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3E44CD61-B3ED-479B-AF6D-8DDE0AFC4CB5"
FechaTimbrado="2025-11-05T08:27:24" RfcProvCertif="MAS0010247C0"
SelloCFD="LsWAscKebAH8brCwPrmH4fByX0yAVX4NOILpNkszmFgXFW2rYz2sY31irBNmL3En4Jha/vVnuZz1vB19kLHB9eNNo2MhkiUQH06B4jC7/cs1DQoLqCldRg1XECb+bgWqJrpsCimJ
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="BCMFMX0XmYza8L9KF9GPz34haf2n05EvMhK6vqf6uDsxn0fBbamnc857bJzqa0HmUUFx/nwiejNoZnddG1NGv0anLw+r01T4av1RYRdUQeflOrCnqgHr2JDvnrVoVoKaA1aSK
</cdfi:Complemento>
</cdfi:Comprobante>
```



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 25-sep-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320
TELÉFONO: 0 CEL: 668 861 92 28
R.F.C. CAM-871226-MS5

ESTIMACIÓN No: 02 (NORMAL)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 25-ago-25

AL 25-sep-25

FECHA DE CONTRATO:

21-jul-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 25-jul-25

TERMINACIÓN: 01-nov-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA \$3,071,390.47

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA \$3,562,812.95

35% ANTICIPO DE LA OBRA \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$3,562,812.95

BUENO POR:

\$ 1,022,355.34

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 1,022,355.34 (SON UN MILLÓN VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

MAS I.V.A.:

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

3 % SVIFYC:

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ -
\$ -
\$ -
\$ 27,142.18
\$ 27,142.18

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

MAS I.V.A 16 %

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 904,739.24
\$ 144,758.28
\$ 1,049,497.52
\$ 27,142.18

SALDO A PAGAR:

\$ 1,022,355.34

ELABORO

C. JOSE EFREN VILLAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		Estimacion:	
				Fecha: 25 de septiembre de 2025		02 (NORMAL)	
Periodo de la estimacion: 25/08/2025 al 25/09/2025				Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución: 25/07/2025 al 01/11/2025				BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 3,562,812.95		\$ 3,071,390.47		\$ -		\$ -	29%
							% Avance Total
							61%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 904,739.24	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 144,758.28	\$ 1,049,497.52
	Sub- Total A (=) \$ 1,049,497.52	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo -35% \$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ -	\$ 1,106,465.71
	Total (=) \$ -	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 904,739.24	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 144,758.28	\$ 2,155,963.23
	Total (=) \$ 1,049,497.52	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 27,142.18	CONTRATADO
\$ -	Total Deducciones (=) \$ 27,142.18	\$ 3,562,812.95
	Importe T O T A L \$ 1,022,355.34	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,022,355.34	SALDO
\$0.00	Son: (SON UN MILLÓN VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.)	\$ 1,406,849.72

ELABORO

G. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 25/09/2025

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	25-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	01-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025	FECHA CONTRATO:	21-jul-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$3,562,812.95		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	25-jul-25	25-ago-25	\$ 1,106,465.71	\$ 953,849.75	\$ 28,615.49		\$ 28,615.49	\$ 1,077,850.22
02 (NORMAL)	25-ago-25	25-sep-25	\$ 1,049,497.52	\$ 904,739.24	\$ 27,142.18		\$ 27,142.18	\$ 1,022,355.34
TOTALES:			\$ 2,155,963.23	\$ 1,858,588.99	\$ 55,757.67	\$ -	\$ 55,757.67	\$ 2,100,205.56
SALDO DEL CONTRATO:			\$1,406,849.72	SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

25/09/2025

CONTRATISTA:**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.****DOMICILIO:** MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320**R.F.C.**
CAM-871226-MS5**DEPENDENCIA:****MUNICIPIO DE BADIRAGUATO****DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

OBRA**IMPORTE**

PRELIMINARES	\$ 50,830.03
ESTRUCTURA	\$ 853,909.21
OTROS	\$ -

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 904,739.24**SUB TOTAL=** \$ 904,739.24
I.V.A AL 16 % \$ 144,758.28
TOTAL = \$ 1,049,497.52

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URRUTIA BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/09/2025
HOJA: HOJA:1 DE 2

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320
R.F.C. CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP06	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,677.60	\$ 52.80	\$ 88,577.28	962.69	0.00	0.00	962.69	\$ 50,830.03
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 50,830.03
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	336.10	\$ 800.47	\$ 269,037.97	131.06	0.00	0.00	131.06	\$ 104,900.60
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	86.03	\$ 675.07	\$ 58,076.27	182.30	0.00	0.00	182.30	\$ 123,065.26
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,352.90	\$ 942.80	\$ 1,275,514.12	663.91	0.00	0.00	663.91	\$ 625,934.35
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	811.74	\$ 33.11	\$ 26,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	270.58	\$ 112.99	\$ 30,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -

ELABORÓ
C. JOSÉ EFREN UBIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
 SINALOA. C.P. 81320
 R.F.C.
 CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	336.10	\$ 51.90	\$ 17,443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.23	\$ 188.73	\$ 20,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	541.17	\$ 566.91	\$ 306,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE ESTRUCTURA:									\$ 853,909.21	
3	OTROS									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,718.12	\$ 4,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,218.76	\$ 8.79	\$ 19,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE MUROS:									\$ -	

TOTAL ESTIMACION	\$ 904,739.24
I.V.A.	\$ 144,758.28
TOTAL	\$ 1,049,497.52

ELABORO

 C. JOSÉ CONTRERAS LÓPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

 ING. JOSÉ CONTRERAS LÓPEZ
 COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

 ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ, AHOVE, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
1	PRELIMINARES								
GP06	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACION, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2			AREA SEGÚN CROQUIS	962.69	962.69		
							TOTAL	962.69	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	20.96			1.00	20.96		LADO DERECHO
			22.69			1.00	22.69		
			43.26			1.00	43.26		
			48.50			1.00	48.50		
			20.72			1.00	20.72		
			22.16			1.00	22.16		LADO IZQUIERDO
			22.81			1.00	22.81		
			44.37			1.00	44.37		
			47.73			1.00	47.73		
			20.16			1.00	20.16		
			182.30			-1.00	-182.30		MENOS PATIN
							TOTAL	131.06	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	182.30			1.00	182.30		
							TOTAL	182.30	

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISOR

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2		AREA SEGÚN CROQUIS		663.91	663.91		
						TOTAL	663.91		
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML			NO SE HA EJECUTADO	0.00	0.00		
						TOTAL	0.00		
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML			NO SE HA EJECUTADO	0.00	0.00		
						TOTAL	0.00		
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML			NO SE HA EJECUTADO	0.00	0.00		
						TOTAL	0.00		

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

REVISÓ
SUPERVISOR DE OBRA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOYME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
3	OTROS								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA


REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

		COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV		FECHA: 25/09/2025	
CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320				MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	
				DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	
		CROQUIS			
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHO GADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		OBRA:	
CONTRATISTA:	ESTIMACION: 02 (NORMAL)				
1	PRELIMINARES				
GP06	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				

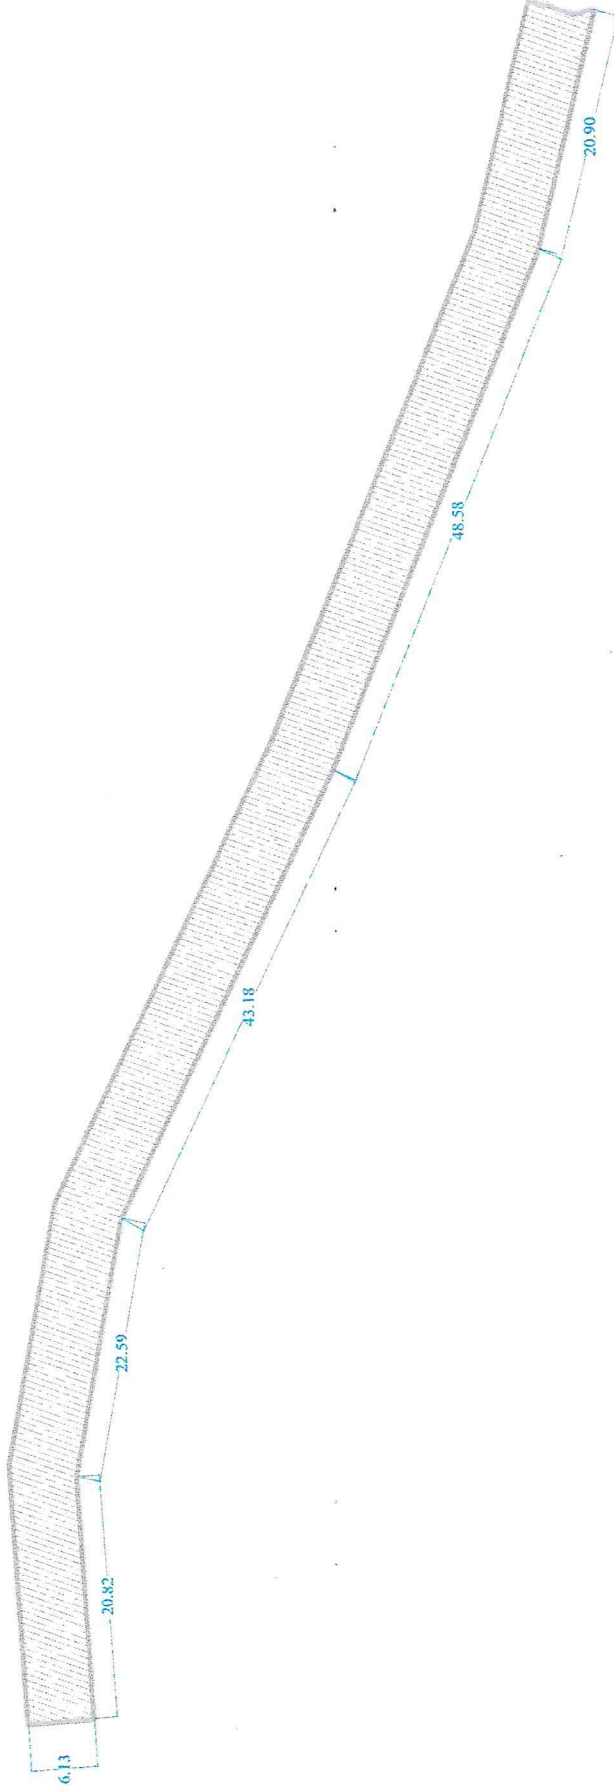


REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/09/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA: OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP08 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

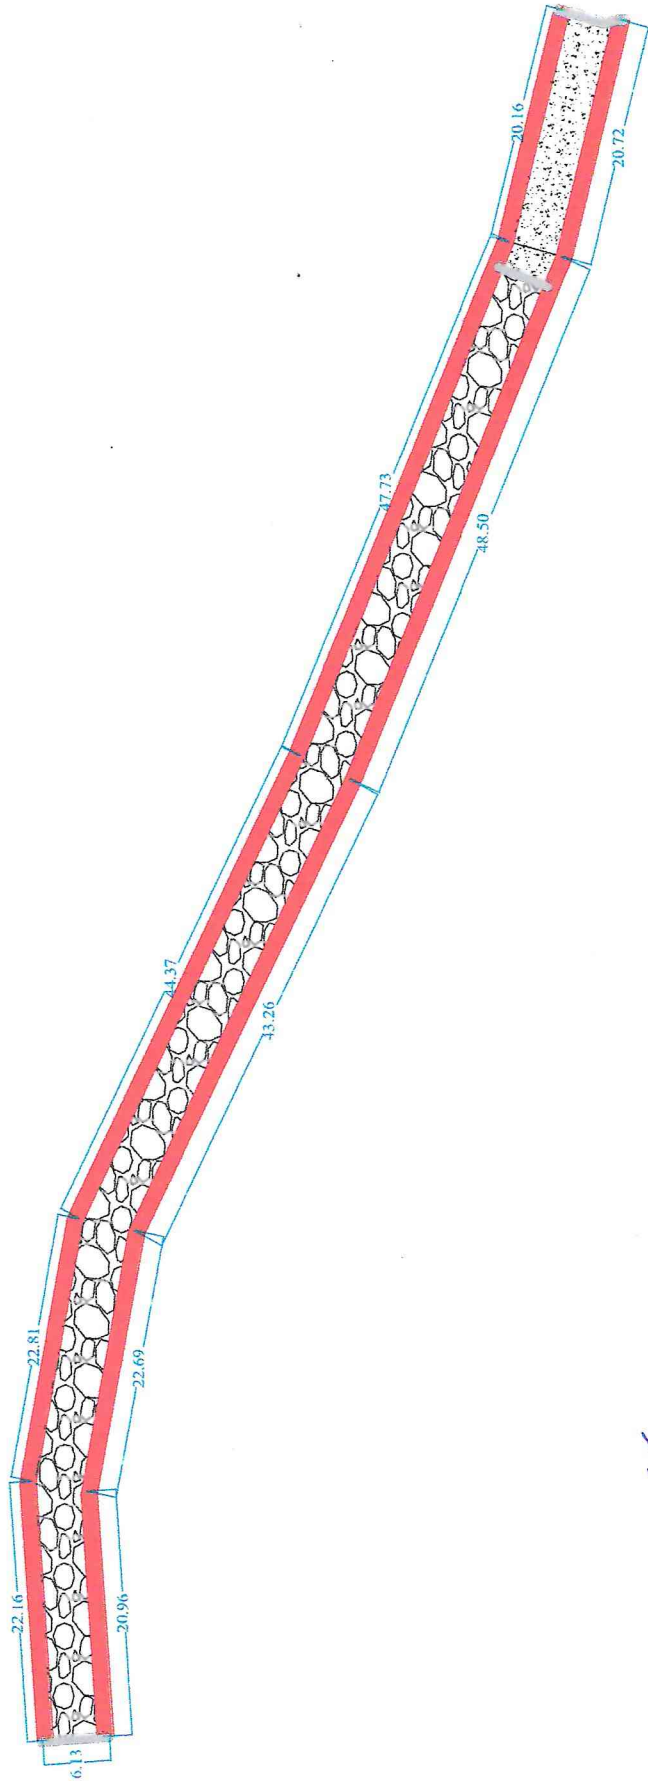

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV
CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/09/2025

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.


OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION:

02 (NORMAL)

GP56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

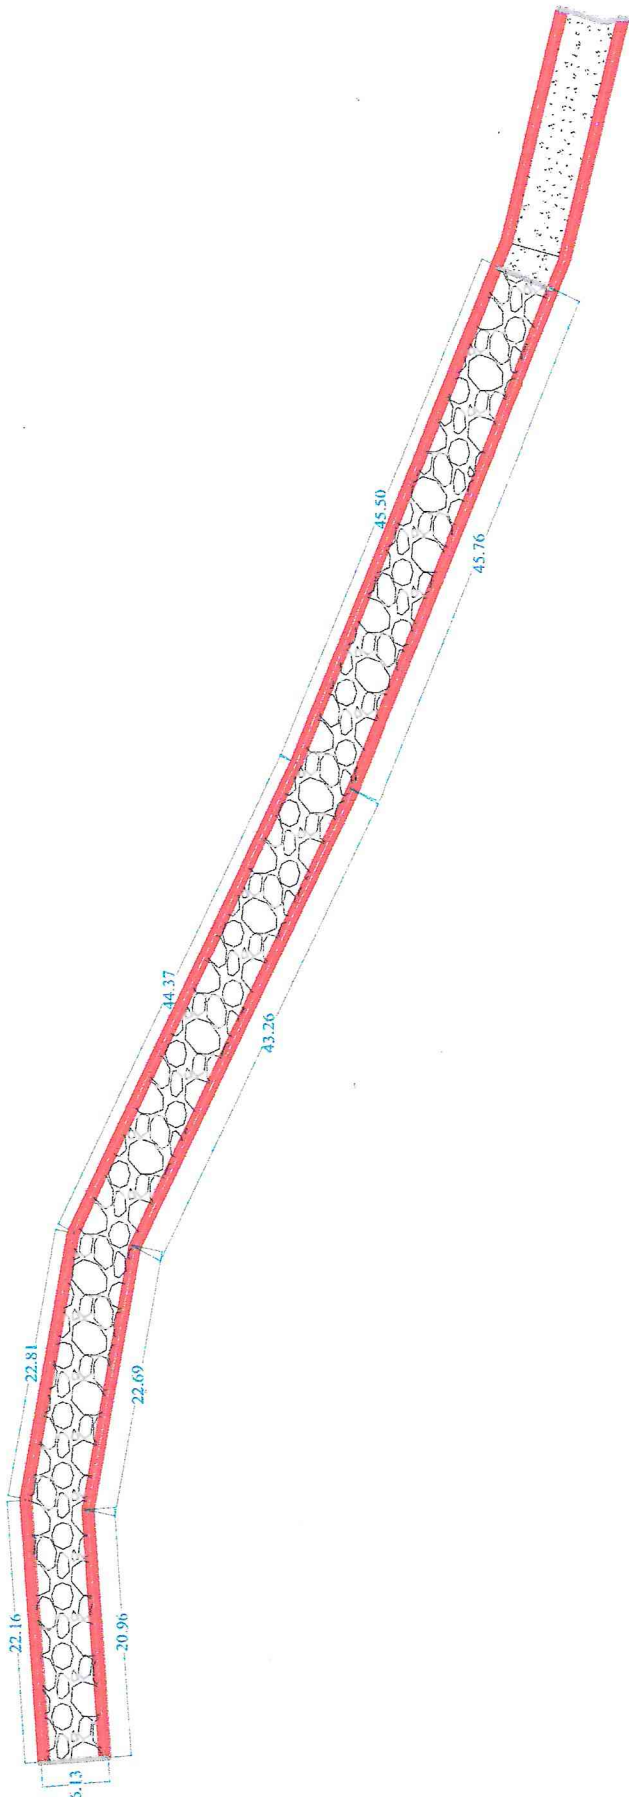

ELABORO


ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO


ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOVE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/09/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

GP06

SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

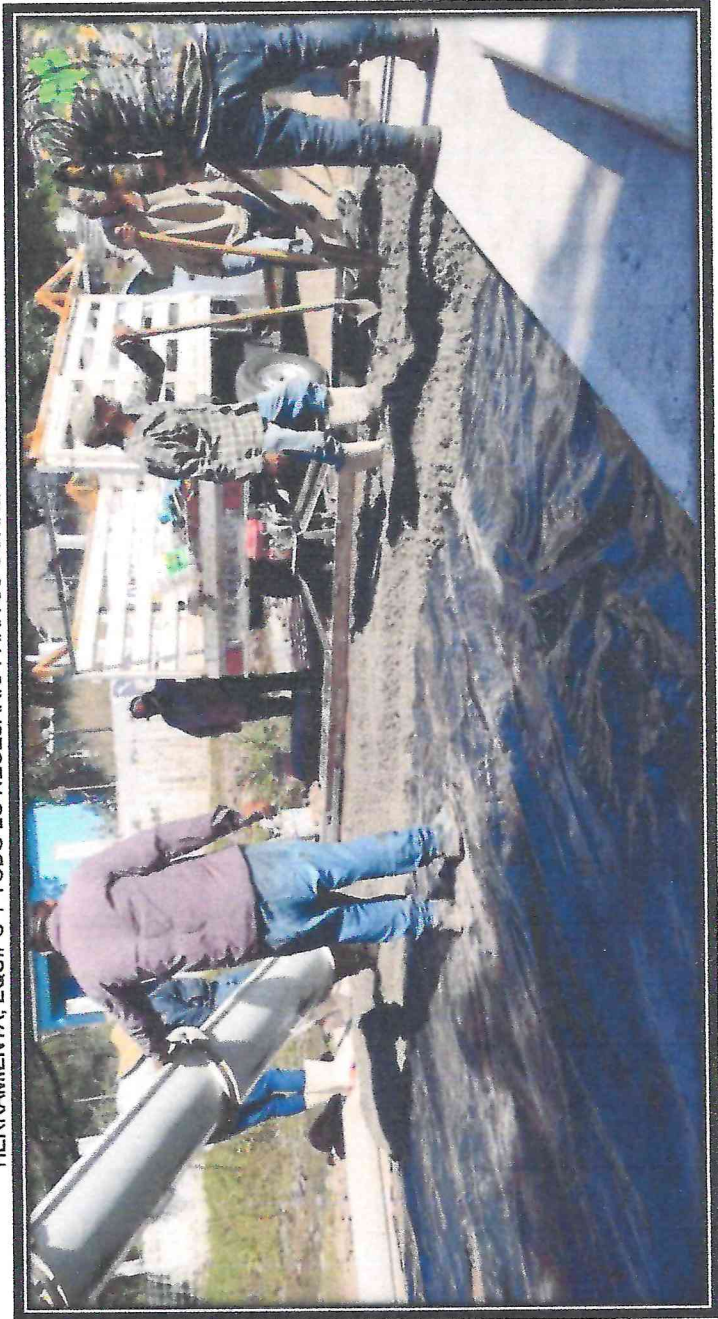

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/09/2025

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.




ESTIMACION: 02 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

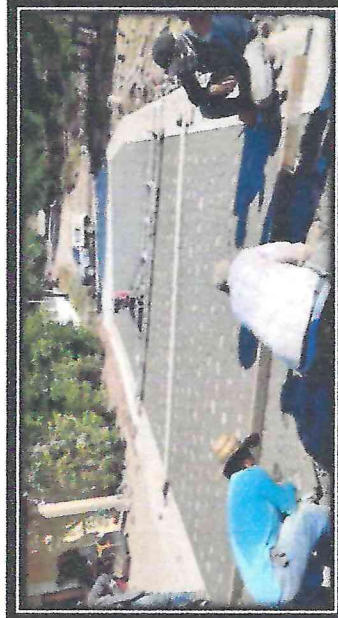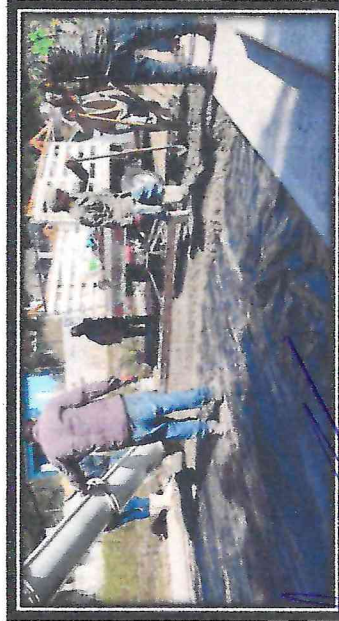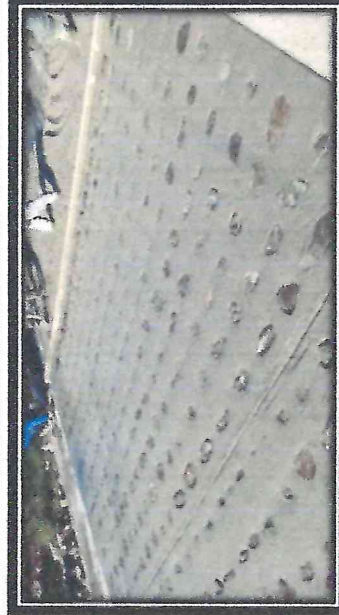

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta

14/11/2025 1:59:16 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR LP 007

Importe de la operación: 1,022,355.34 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 14/11/2025

Fecha de aplicación: 14/11/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR LP 007

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 13:59:08

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000967354

Clave de rastreo: 002601002511140000967354

Folio de firma: 0074774098

Folio único: I401202511141359080074774104

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	14/11/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
