

OFICIO No. OPDUyE/624/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 03 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 02 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$727,550.87 (SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- R.F.C. CAM-871226-MS5
- DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320
- No. DE FACTURA: # F3F2, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

11:30 Am
02 DIC 2025
Rodony
RECIBIDO

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226M55

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 152
Fecha: 2/12/2025 09:22:07
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
R.F.C.: MBA850101214
Domicilio fiscal: 80500

Uso CFDI: I01 - Construcciones.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	SERVICIO ESTIMACION 03 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN- 007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 643,850.33 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 0.00 TOTAL: \$ 643,850.33 (+) MAS 16% IVA: \$ 103,016.05 TOTAL: \$ 746,866.38 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 19,315.51 SALDO LIQUIDO: \$ 727,550.87	643,850.33	002 - IVA - 103,016.05	643,850.33

Importe con letra

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.

Subtotal	643,850.33
Impuestos Traslados	103,016.05
Ret. Local 3% SVICUT	0.00
Total	746,866.38

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000714582475
Folio fiscal: D7373CAB-C179-4955-AF9E-112D4E7AF3F2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Diciembre 2 2025 - 10:22:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gpmCBkX4AAPBIE9xVpLIToF+FOZNBXjCZnas/L6ITFykG55r8Yss0PIQEzd9krZr1urLTM8MkeLmXlwGg
Hffox0tUNVDoNpaZv+Qok/DAHilCQqvAIAYKuij+XZRe4TGFCowWx33VLx5ZsekvLBkh29eHVapDNZ2I
dYNECPgF2t6XsK8F86Onz9JH8ap5Kt3Dn2+6XY5b7JdQt+BfrjRM6y+RAOmAdLu4UMDX6Igu1JP1IWH9CK9WL3
GGAgnat7JiOEsla2wwrTyNAZ901n9JvKMI2RKz4RmSvkiwRrBo1fzTIDiWxr8JPv3F/HuSrtF2gsRKVZdg==

Sello del SAT

VwS5Cix9ipe/UklcvtygKGAuFN2SuhPKx51HG1jxZLVn0O7/9QfEHxwEVdwFGS70h9H8claHK4rm6P5P
Hffox0tUNVDoNpaZv+Qok/DAHilCQqvAIAYKuij+XZRe4TGFCowWx33VLx5ZsekvLBkh29eHVapDNZ2I
dYNECPgF2t6XsK8F86Onz9JH8ap5Kt3Dn2+6XY5b7JdQt+BfrjRM6y+RAOmAdLu4UMDX6Igu1JP1IWH9CK9WL3
GGAgnat7JiOEsla2wwrTyNAZ901n9JvKMI2RKz4RmSvkiwRrBo1fzTIDiWxr8JPv3F/HuSrtF2gsRKVZdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7373CAB-C179-4955-AF9E-112D4E7AF3F2|2025-12-02T10:22:09|MAS0810247C0|gpm
CBkX4AAPBIE9xVpLIToF+FOZNBXjCZnas/L6ITFykG55r8Yss0PIQEzd9krZr1urLTM8MkeLmXlwGg
Lg0uPtvPj4WoMtzqDHT6TkmMU11fKCuHoj9RDFUkcg/T7DphE0bMxL58AK4Vbp6E+O8ISvhEXV8WcZTN
AULdiqsTdYNECPgF2t6XsK8F86Onz9JH8ap5Kt3Dn2+6XY5b7JdQt+BfrjRM6y+RAOmAdLu4UMDX6Igu
1JP1IWH9CK9WL3GGAgnat7JiOEsla2wwrTyNAZ901n9JvKMI2RKz4RmSvkiwRrBo1fzTIDiWxr8JPv
3F/HuSrtF2gsRKVZdg==||00001000000709182898||

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="152" Fecha="2025-12-
02T09:22:07"
Sello="gpmCBkX4AAPBIE9xVpLlToF+FOfZNBXjCZNas/L6lTFyxKGSr8Yss0PIQEzd9krZr1urLTm8MkeLMxlwglGouPtvPJ4WoMtqzDHT6TkMu1fKCuhOj9RDFUkc/T7DphE0bmXL5A8KV
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGJzCCBHegAwIBAgIUMDAwMEWMDAwMDA3MTQ1ODI0NzUwOVQyKjoKIzhvcNAQLBAQggGVMTUMwMwYDVQDDC8BgYBERUwgU0VSvkIDSUo8REUGQUQSUSU7UIRSUNJT0g4VFJJzQ1
SubTotal="643850.33" Moneda="MXN" Total="746866.38" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81320">
<cfdi:Emissor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MS5" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850181214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="S01" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 03
(NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE
LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 643,850.33 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 643,850.33 (+) MAS 16% IVA: $ 103,016.05 TOTAL: $ 746,866.38 DEDUCCIONES 3% SVIFYC:
$ 19,315.51 SALDO LIQUIDO: $ 727,550.87" ValorUnitario="643850.33" Importe="643850.33" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="643850.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="103016.05"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="103016.05">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="103016.05" Base="643850.33"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D7373CAB-C179-4955-AF9E-112D4E7AF3F2"
FechaTimbrado="2025-12-02T10:22:09" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="gpmCBkX4AAPBIE9xVpLlToF+FOfZNBXjCZNas/L6lTFyxKGSr8Yss0PIQEzd9krZr1urLTm8MkeLMxlwglGouPtvPJ4WoMtqzDHT6TkMu1fKCuhOj9RDFUkc/T7DphE0bmXL5A8KV
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="VVSSCiX9pe/UkkcvtygKGaFN2SuHpkX51HG1jxZLVn007/9QCFeHWEvDWFG570h9H8JaHK4rm6P5PHffox0tUNVDONpaZv4Qok/DAHilCQqvAIAYKuuj+xZR4TGFCowlwX33VL
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		Estimacion: 03 (NORMAL)		
Fecha: 25 de octubre de 2025							
Periodo de la estimación:		25/09/2025	al	25/10/2025	Localidad:	No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:		25/07/2025	al	01/11/2025	BADIRAGUATO	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 3,562,812.95		\$ 3,071,390.47		\$ -		\$ -	21%
							% Avance Total
							81%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 643,850.33	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ 103,016.05	\$ 746,866.38
	Sub- Total A (=)	\$ 746,866.38	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ -	\$ 2,155,963.23
	Total (=)	\$ -	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 643,850.33	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ 103,016.05	\$ 2,902,829.61
	Total (=)	\$ 746,866.38	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 19,315.51	CONTRATADO
\$ -	Total Deducciones (=)	\$ 19,315.51	\$ 3,562,812.95
	Importe T O T A L	\$ 727,550.87	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 727,550.87	SALDO
\$0.00	Son:		\$ 659,983.34
	(SON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.)		

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 25-oct-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 03 (NORMAL)	
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 0	CEL: 668 861 92 28	DEL	25-sep-25
R.F.C. CAM-871226-MS5		AL	25-oct-25
		FECHA DE CONTRATO:	
		21-jul-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		INICIO:	25-jul-25
		TERMINACIÓN:	01-nov-25
DESCRIPCIÓN:			
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$3,071,390.47	\$3,562,812.95	\$0.00	\$3,562,812.95
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR: \$ 727,550.87
\$ 727,550.87 (SON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 03 (NORMAL)			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 643,850.33
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$ 103,016.05
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 746,866.38
3 % SVIFYC:	\$ 19,315.51	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 19,315.51
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 19,315.51		
		SALDO A PAGAR:	\$ 727,550.87

ELABORO

C.JOSÉ EFREN MARTÍNEZ BOJORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

25/10/2025

CONTRATISTA:**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.****DOMICILIO:**MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320**R.F.C.**

CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO****DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

OBRA**IMPORTE**

PRELIMINARES	\$ 32,397.02
ESTRUCTURA	\$ 611,453.31
OTROS	\$ -

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 643,850.33

SUB TOTAL=	\$ 643,850.33
I.V.A AL 16 %	\$ 103,016.05
TOTAL =	\$ 746,866.38

ELABORO

C. JOSÉ EFRÉN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025
HOJA: 1 DE 2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP06	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,677.60	\$ 52.80	\$ 88,577.28	1,576.27	962.69	0.00	613.58	\$ 32,397.02
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 32,397.02
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	336.10	\$ 800.47	\$ 269,037.97	259.75	131.06	0.00	128.69	\$ 103,012.48
GP08B	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	86.03	\$ 675.07	\$ 58,076.27	86.03	182.30	0.00	-96.27	\$ 64,988.99
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,352.90	\$ 942.80	\$ 1,275,514.12	1,272.13	663.91	0.00	608.22	\$ 573,429.82
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	811.74	\$ 33.11	\$ 26,876.71	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE-OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	270.58	\$ 112.99	\$ 30,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -

ELABORÓ:
C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ:
ING. RUBIEL RINCÓN RAMO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025
HOJA: 2 DE 2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	336.10	\$ 51.90	\$ 17,443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.23	\$ 188.73	\$ 20,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	541.17	\$ 566.91	\$ 306,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
3	OTROS									
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 611,453.31
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,718.12	\$ 4,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,218.76	\$ 8.79	\$ 19,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE MUROS:										\$ -

TOTAL ESTIMACION	\$ 643,850.33
I.V.A.	\$ 103,016.05
TOTAL	\$ 746,866.38

ELABORO

C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.

C.P. 81320

REF.

CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	25-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	01-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025		FECHA CONTRATO:	21-jul-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$3,071,390.47		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$0.00		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$3,562,812.95		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$3,562,812.95
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	25-jul-25	25-ago-25	\$ 1,106,465.71	\$ 953,849.75	\$ 28,615.49		\$ 28,615.49	\$ 1,077,850.22
02 (NORMAL)	25-ago-25	25-sep-25	\$ 1,049,497.52	\$ 904,739.24	\$ 27,142.18		\$ 27,142.18	\$ 1,022,355.34
03 (NORMAL)	25-sep-25	25-oct-25	\$ 746,866.38	\$ 643,850.33	\$ 19,315.51		\$ 19,315.51	\$ 727,550.87
TOTALES:			\$ 2,902,829.61	\$ 2,502,439.32	\$ 75,073.18	\$ -	\$ 75,073.18	\$ 2,827,756.43
SALDO DEL CONTRATO:			\$659,983.34	SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URIAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISION

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA BLANCOS 4.5 Y 6. VHLA CUSTAS DIAZ ORDIZ. AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

03 (NORMAL)

GENERADORES ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACION, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2							
GP06					AREA SEGÚN CROQUIS	1,272.13			EMPEDRADO
			506.90	0.60			304.14		GUARNICION Y PATIN
						TOTAL		1,576.27	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		962.69	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		613.58	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	24.18			1.00	24.18		LADO DERECHO
			20.54			1.00	20.54		
			32.14			1.00	32.14		
			21.18			1.00	21.18		
			20.96			1.00	20.96		
			22.69			1.00	22.69		
			43.26			1.00	43.26		
			48.50			1.00	48.50		
			20.72			1.00	20.72		
			13.05			1.00	13.05		LADO IZQUIERDO
			17.63			1.00	17.63		
			11.72			1.00	11.72		
			14.73			1.00	14.73		
			21.05			1.00	21.05		
			17.32			1.00	17.32		
			22.16			1.00	22.16		
			22.81			1.00	22.81		

ELABORO

ING. ORLANDO PARRA CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA BIOTRES 4,5 Y 6, VILLA GUATEVOBIÁZ OBDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 83320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			44.37			1.00	44.37		
			47.73			1.00	47.73		
			20.16			1.00	20.16		
			247.15			-1.00	-247.15		MENOS PATIN
							TOTAL	259.75	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	131.06	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	128.69	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	247.15			1.00	247.15		
							TOTAL	247.15	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	182.30	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	-96.27	
							ADICIONAL	161.12	
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				AREA SEGÚN CROQUIS	1,272.13		
							TOTAL	1,272.13	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	663.91	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	608.22	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANABLOTES 4, 5 Y 6, VILLA CUSTAVO DIAZ ORDÁZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
								0.00	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP11	PINTURA EN GUARNIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2			NO SE HA EJECUTADO		0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREANO GERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 13 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUAYODIAZ ORDÁZ, AHOTÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
3	OTROS								
	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA: OBRA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

GP06

SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

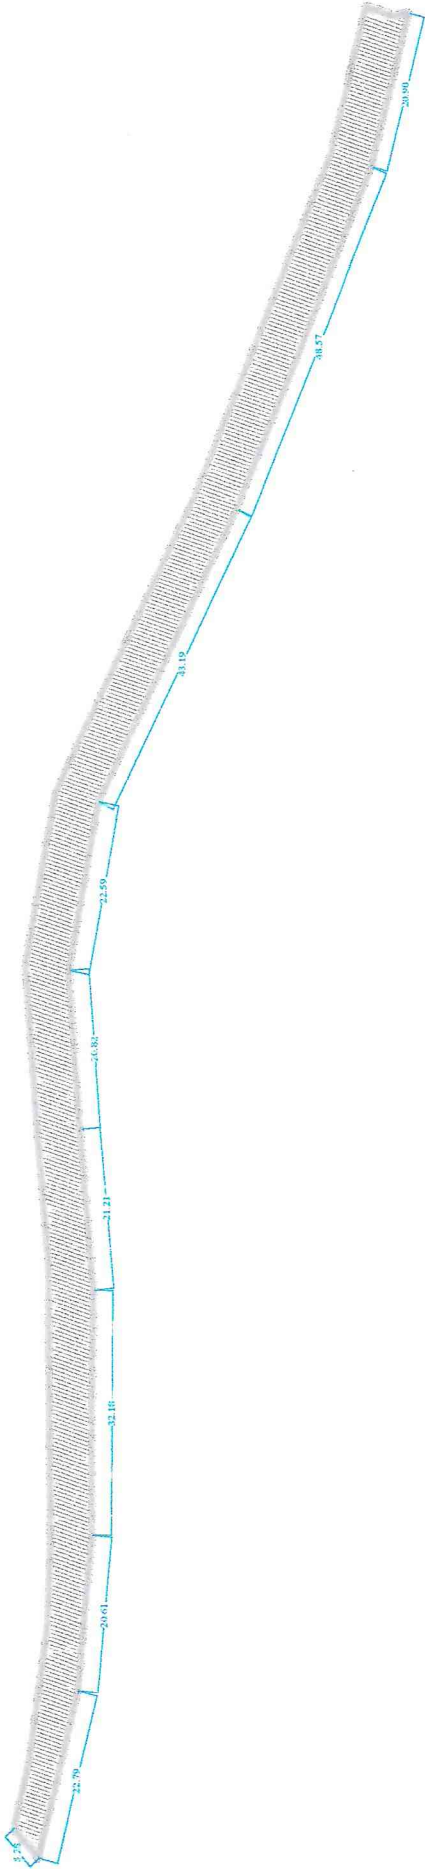

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

FECHA: 25/10/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


**COMERCIAL DE ACERO Y
CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.**

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

ESTRUCTURA

GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

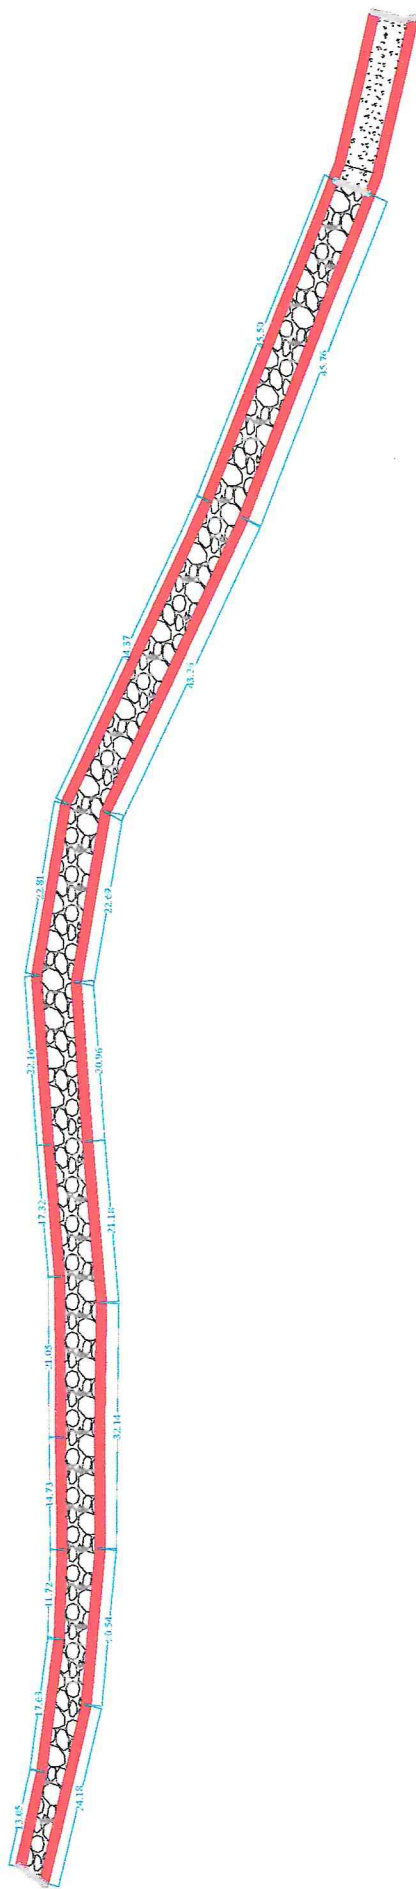

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.


CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. OBRA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

GP56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

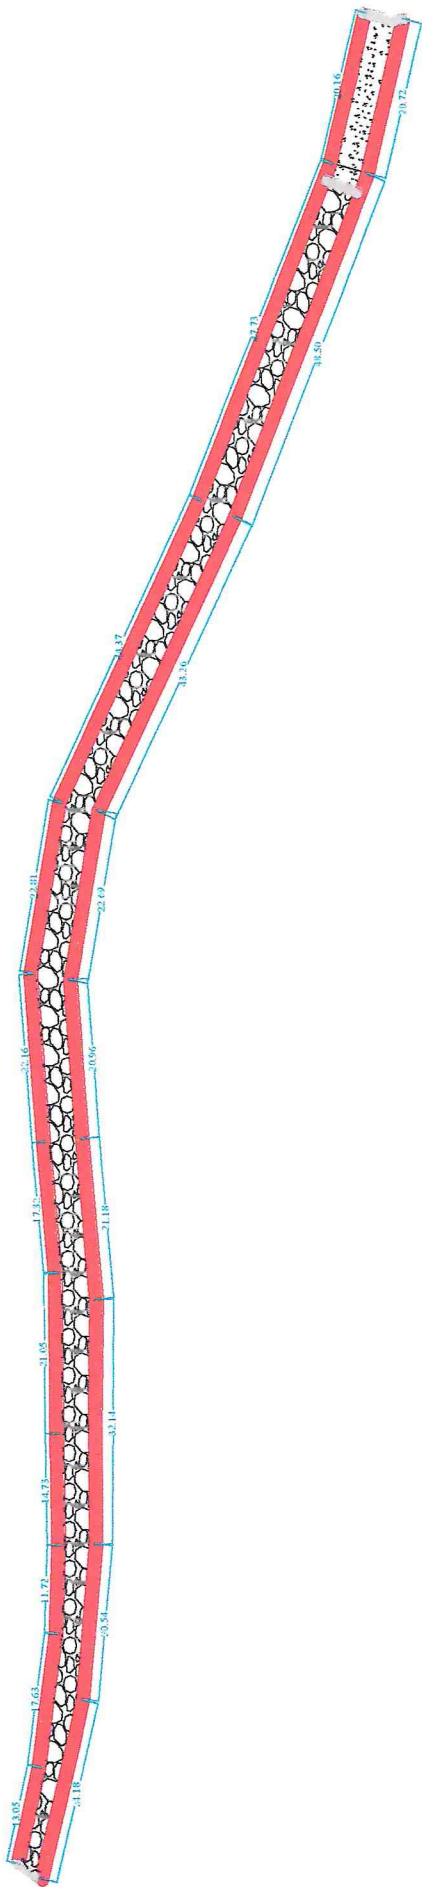

ELABORO

ING. ORLANDO LAURENTI
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHONTE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 25/10/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

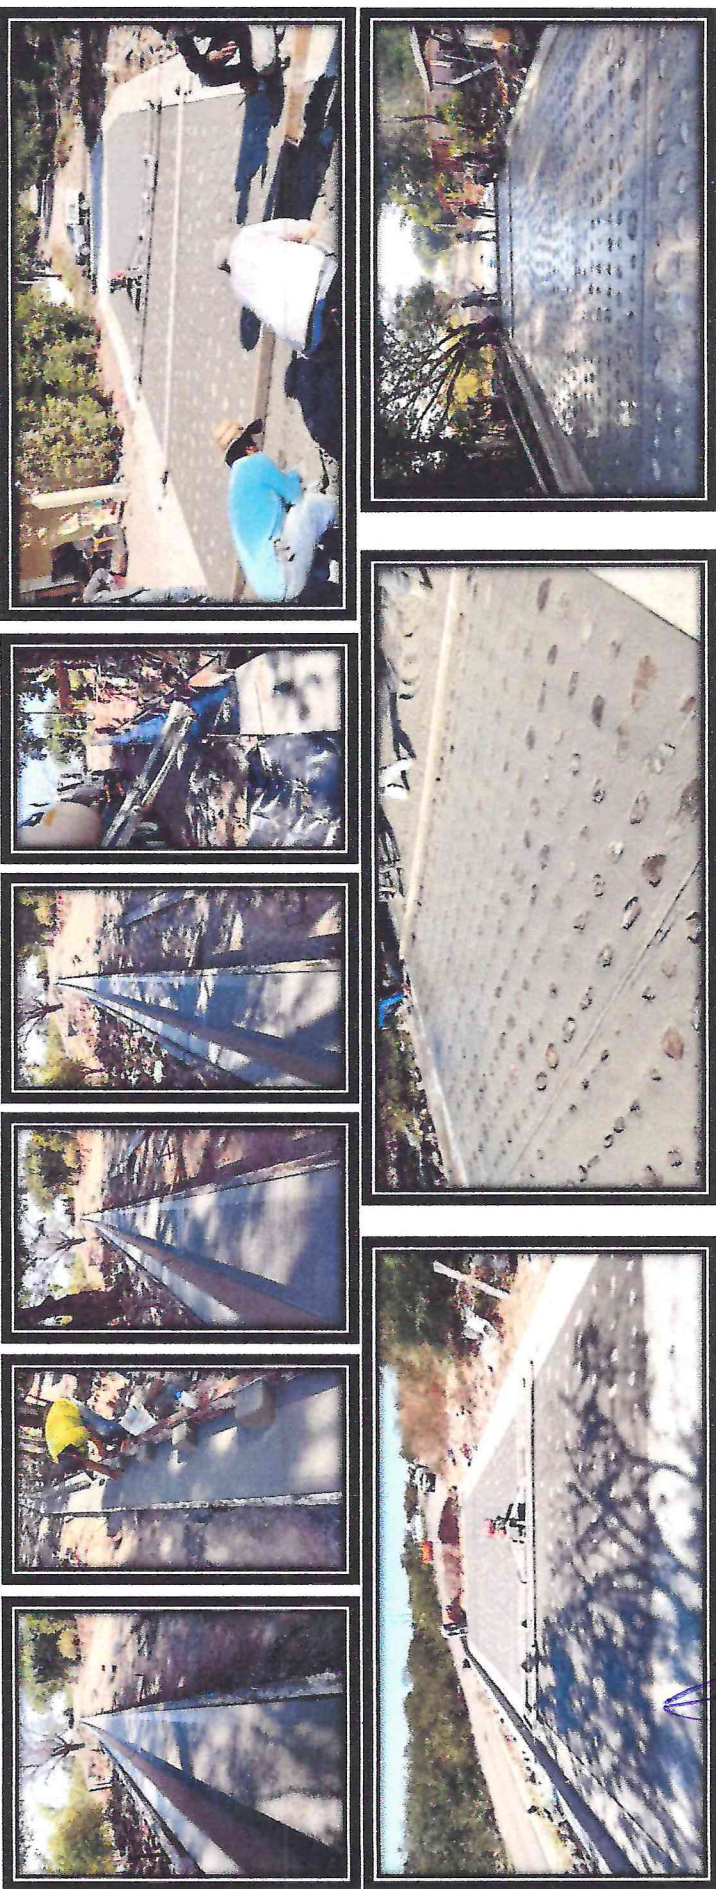

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN GERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta02/12/2025 4:15:20 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación:Pago Interbancario

Descripción:EST 03 NORM LP007Importe de la operación:727,550.87 MXP

Cuenta de retiro:0124174836Cuenta de depósito:002743700452705974

Divisa de la cuenta:MXPDivisa de la cuenta:MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATOTitular de la cuenta:COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino:BANAMEX

Fecha de creación:02/12/2025Fecha de aplicación:02/12/2025

Concepto de pago:EST 03 NORM LP007Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382Hora de captura en el canal:16:15:13

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000470753Clave de rastreo:002601002512020000470753

Folio de firma:0043518170Folio único:I401202512021615130043518176

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	02/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/12/2025
