

OFICIO No. OPDUyE/777/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 04 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 04 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$389,403.43 (TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- R.F.C. CAM-871226-MS5
- DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO SAN LORENZO, LOTES 4,5 Y 6, MANZANA 18, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320
- No. DE FACTURA: # 4547, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrian G
RECIBIDO
17:52

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

RFC: CAM871226MS5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 81320

Régimen Fiscal: 603 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 156

Fecha: 13/12/2025 13:15:57

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

R.F.C.: MBA850101214

Domicilio fiscal: 80500

Uso CFDI: I01 - Construcciones.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
		SAT		SERVICIO ESTIMACION 04 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 3,562,812.95	344,604.80	002 - IVA - 55,136.77	344,604.80
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 344,604.80 (-) MENOS AMORTIZACIÓN: \$ 0.00 TOTAL: \$ 344,604.80 (+) MAS 16% IVA: \$ 55,136.77 TOTAL: \$ 399,741.57 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 10,338.14 SALDO LIQUIDO: \$ 389,403.43			

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.

Subtotal: 344,604.80

Impuestos Traslados: 55,136.77

Ret. Local 3% SVICUT: 0.00

Total: 399,741.57

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000714582475

54500035-2E19-4BCF-A8F9-AEB209164547

00001000000709182898

Diciembre 13 2025 - 14:16:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hn92CUU+pm5B45zgv3IAwmdf8jns9It9ptHdzkYR5ZB/zjhGjo+goKClOIh6sowA2rjsgD55/pUZcLlz2pYZjYmAl/O/A1pUlx5d1oNTX1G4EdhfvQc2937Zzvs5IHxOcn7FVQTSkx/HQFzR8SehXu0HFgbx8HEA2tF9vN3TyjywP8hX+MFQW7ndQ2ocXRtUu6rm8PAZQEhHJHcRZHGsZCW70Db2/eah5VRRJBclLz3odJ8FAH9k2ec8YEIS1Pzn0G eW+coxEX+P5NNCuyyHf+E3819NKvTCwgmhfdhw6gyCrsD9GpYeSOhD6WhVMzBL/IKsFgFbEpFxmR2U2REuFw==

Sello del SAT

QT/5ng40eDeu527W66jDToazgfCZUIAOXduISIElMEPFQqbJWKJRPSoxLZ1Zn3qNEJ0Uw1pToqEUkuGa8rehldkZXIBT7jCkqSQUuMcA9vQOfsQNRUuoteyrgGSV/5ThNSB8EWSuFysMBkW4YilbD+ldbsmT4xMVLc2LXEwzY8+Muc5oP1/TEDpxyVWERLIAbLz76CXDo9BMmpEA88M/mKxtO8m907g8Y6JlyhwzHWcjPrURTs04Y9CObG2gZtQ2SRubheVrLcNuxLMm8t4DeAWn04kx0G6z4U3tBx2MhpwcibZ25ofjFtdWpHjr/Kps7ByVsEch2yCVU5H2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.1]54500035-2E19-4BCF-A8F9-AEB209164547|2025-12-13T14:16:00|MAS0810247C0|hn92CUU+pm5B45zgv3IAwmdf8jns9It9ptHdzkYR5ZB/zjhGjo+goKClOIh6sowA2rjsgD55/pUZcLlz2pYZjYmAl/O/A1pUlx5d1oNTX1G4EdhfvQc2937Zzvs5IHxOcn7FVQTSkx/HQFzR8SehXu0HFgbx8HEA2tF9vN3TyjywP8hX+MFQW7ndQ2ocXRtUu6rm8PAZQEhHJHcRZHGsZCW70Db2/eah5VRRJBclLz3odJ8FAH9k2ec8YEIS1Pzn0GeW+coxEX+P5NNCuyyHf+E3819NKvTCwgmhfdhw6gyCrsD9GpYeSOhD6WhVMzBL/IKsFgFbEpFxmR2U2REuFw==|00001000000709182898|]

```
<cdfi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="156" Fecha="2025-12-
13T13:15:57"
Sello="h92CUU+pm5B45zgv3JAwmdf8jns9Jt9ptHdzKYR5ZB/zjhGjo+goKCI0IH6sowA2rjsgD55/pUZclIz2pYZJYmAJ/O/A1pUJxSd1oNTx1G4EdhfVcQ2937Zzvs5IHxOcn7FVQT8kx/HQFzRBS
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000714582475"
Certificado="MIIGjzCCBHegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTQ1ODI0NzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGVMUWMyYDVzQDCCBQYBERUwU0VSvklDSUSgREUgOURNSUS3U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="344604.80" Moneda="MXN" Total="399741.57" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81320">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="CAM871226MSS" Nombre="COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVICIO NoIdentificacion="S01" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 04
(NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AMUGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE
LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95 IMPORTE DE ESTA
ESTIMACION: $ 344,604.80 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 TOTAL: $ 344,604.80 (+) MAS 16% IVA: $ 55,136.77 TOTAL: $ 399,741.57 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $
10,338.14 SALDO LIQUIDO: $ 389,403.43" ValorUnitario="344604.80" Importe="344604.80" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="344604.80" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55136.77"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55136.77">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="55136.77" Base="344604.80"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5450D035-2E19-4BCF-A8F9-AE0209164547"
FechaTimbrado="2025-12-13T14:16:00" RfcProvCertif="MAS0818247C0"
SelloCFD="h92CUU+pm5B45zgv3JAwmdf8jns9Jt9ptHdzKYR5ZB/zjhGjo+goKCI0IH6sowA2rjsgD55/pUZclIz2pYZJYmAJ/O/A1pUJxSd1oNTx1G4EdhfVcQ2937Zzvs5IHxOcn7FVQT8kx/
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="QT/sng40zDeUs27W66jDToazgFCZiuiAOXdhJuiS1ELmEPFQ0bJWKJRP50xLZ1zn3QNEJ0Uw1pToEuKuga8rehJdkZKIBT7jcXqSQJwMcA9vQ0fSQRuUoteyzgGSV/5THN508EWSuf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Fecha: 01-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No:	04 (NORMAL)
DOMICILIO:	MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. C.P. 81320		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	25-oct-25
0	668 861 92 28		AL	01-nov-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
CAM-871226-MS5				21-jul-25
DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO:
				25-jul-25
DESCRIPCIÓN:			TERMINACIÓN:	01-nov-25
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
CONTRATO No:	MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$3,071,390.47	\$3,562,812.95	\$0.00	\$3,562,812.95	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR:	\$ 389,403.43
\$ 389,403.43 (SON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.)				
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 04 (NORMAL)				
DEDUCCIONES:	CALCULO DE ESTIMACIÓN			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ -	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	344,604.80
MAS I.V.A.:	\$ -	MAS I.V.A 16 %	\$	55,136.77
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ -	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	399,741.57
3 % SVIFYC:	\$ 10,338.14	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	10,338.14
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 10,338.14			
SALDO A PAGAR:			\$	389,403.43

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Control de Estimaciones

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimación: 04 (NORMAL)	
Fecha: 1 de noviembre de 2025				
Periodo de la estimación: 25/10/2025 al 01/11/2025		Localidad: BADIRAGUATO	No. De contrato: MBGGR-LP-FAISMUN-007/2025	
Periodo de Ejecución: 25/07/2025 al 01/11/2025				
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I,V,A	% de Avance
\$ 3,562,812.95	\$ 3,071,390.47	\$ -	\$ -	11%
				% Avance Total
				93%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 344,604.80	ESTA ESTIMACION
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ 55,136.77	\$ 399,741.57
	Sub- Total A (=)	\$ 399,741.57	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35%	\$ -	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ -	\$ 2,902,829.61
	Total (=)	\$ -	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL	\$ 344,604.80	TOTAL ACUMULADO.
\$ -	16 % I.V.A (+)	\$ 55,136.77	\$ 3,302,571.18
	Total (=)	\$ 399,741.57	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	\$ 10,338.14	CONTRATADO
\$ -	Total Deducciones (=)	\$ 10,338.14	\$ 3,562,812.95
	Importe TOTAL	\$ 399,403.43	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 389,403.43	SALDO
\$0.00	Son: (SON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 43/100 M.N.)		\$ 260,241.77

ELABORO

C.JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

CONTRATISTA:

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.

C.P. 81320

R.F.C. CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**ESTADO DE CUENTA**

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD:

BADIRAGUATO

ESTIMACIÓN:

04 (NORMAL)

FECHA INICIO

25-jul-25

FECHA
TERMINACIÓN
CONTRATO:

01-nov-25

CONTRATO:

MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025

FECHA CONTRATO:

21-jul-25

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$3,071,390.47

CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

AL

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$3,562,812.95

IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

\$3,562,812.95

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	25-jul-25	25-ago-25	\$ 1,106,465.71	\$ 953,849.75	\$ 28,615.49	\$ 28,615.49	\$ 1,077,850.22
02 (NORMAL)	25-ago-25	25-sep-25	\$ 1,049,497.52	\$ 904,739.24	\$ 27,142.18	\$ 27,142.18	\$ 1,022,355.34
03 (NORMAL)	25-sep-25	25-oct-25	\$ 748,868.38	\$ 643,850.33	\$ 19,315.51	\$ 19,315.51	\$ 727,550.87
04 (NORMAL)	25-oct-25	01-nov-25	\$ 399,741.57	\$ 344,604.80	\$ 10,338.14	\$ 10,338.14	\$ 389,403.43

TOTALES:

\$ 3,302,571.18

\$ 2,847,044.12

\$ 85,411.32

\$ -

\$ 85,411.32

\$ 3,217,159.86

SALDO DEL CONTRATO:

\$260,241.77

SALDO POR AMORTIZAR:

\$0.00

ELABORO

C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

**COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV**

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA

01/11/2025

CONTRATISTA:**DEPENDENCIA:****COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.****MUNICIPIO DE BADIRAGUATO****DOMICILIO:** MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA. C.P. 81320**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****R.F.C.****CAM-871226-MS5****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

	LOCALIDAD: BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN: 04 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$3,071,390.47**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00****IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$3,562,812.95****OBRA****IMPORTE**

PRELIMINARES	-\$ 6,171.35
ESTRUCTURA	\$ 326,555.13
OTROS	\$ 24,221.02

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 344,604.80**SUB TOTAL= \$ 344,604.80****I.V.A AL 16 % \$ 55,136.77****TOTAL = \$ 399,741.57**

ELABORO

**C. JOSÉ EFRÉN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISÓ

**ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS**

AUTORIZO

**ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025
HOJA: HOJA:1 DE:2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA, C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,218.76	\$ 20.25	\$ 44,920.89	2,218.76	2,218.76	43.88	0.00	\$ -
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,220.32	\$ 126.43	\$ 154,285.06	1,129.19	1,220.32	0.00	-91.13	\$ 11,521.57
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	1,677.60	\$ 31.34	\$ 52,575.98	1,677.60	1,677.60	204.37	0.00	\$ -
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	1,677.60	\$ 194.00	\$ 325,454.40	1,677.60	1,677.60	204.37	0.00	\$ -
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	1,677.60	\$ 224.49	\$ 376,604.42	1,677.60	1,677.60	204.37	0.00	\$ -
GP06	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,677.60	\$ 52.80	\$ 88,577.28	1,677.60	1,576.27	204.37	101.33	\$ 5,350.22
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15x30x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	336.10	\$ 800.47	\$ 269,037.97	257.86	259.75	0.00	-1.89	\$ 1,512.89
GP088	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	86.03	\$ 675.07	\$ 58,076.27	86.03	86.03	161.12	0.00	\$ -
TOTAL DE PRELIMINARES: - \$										6,171.35

ELABORO
C. JOSÉ EFREN URRÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025
HOJA: 2 DE 2

CONTRATISTA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME,
SINALOA, C.P. 81320
R.F.C.
CAM-871226-MS5

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	04 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$3,562,812.95

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANI	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,352.90	\$ 942.80	\$ 1,275,514.12	1,294.42	1,272.13	0.00	22.29	\$ 21,015.01
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	811.74	\$ 33.11	\$ 26,876.71	811.74	0.00	207.34	811.74	\$ 26,876.71
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	270.58	\$ 112.99	\$ 30,572.83	270.58	0.00	0.00	270.58	\$ 30,572.83
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	336.10	\$ 51.90	\$ 17,443.59	257.86	0.00	0.00	257.86	\$ 13,382.93
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	108.23	\$ 188.73	\$ 20,426.25	108.23	0.00	25.00	108.23	\$ 20,426.25
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	541.17	\$ 566.91	\$ 306,794.68	380.65	0.00	0.00	380.65	\$ 215,794.29
3	OTROS									
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 326,555.13
GBR071	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,718.12	\$ 4,718.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,718.12
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,218.76	\$ 8.79	\$ 19,502.90	2,218.76	0.00	43.86	2,218.76	\$ 19,502.90
TOTAL DE MUROS:										\$ 24,221.02

TOTAL ESTIMACION	\$ 344,604.80
I.V.A.	\$ 55,136.77
TOTAL	\$ 399,741.57

ELABORO
C. JOSÉ EFREN URÍAS BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 161 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.28	6.59			120.47		EMPEDRADO Y GUARNICIÓN
			16.21	6.52			105.69		
			16.00	6.15			98.40		
			47.18	6.12			288.74		
			21.50	6.22			133.73		
			22.82	6.31			143.99		
			43.66	6.25			272.88		
			48.12	12.30			591.88		
			20.62	6.12			126.19		
			13.60	2.00			27.20		BANQUETA
			12.00	2.00			24.00		
			0.86	1.08			0.93		
			328.52	1.00			328.52		
							TOTAL	2,262.62	
							EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	2,218.76	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	
							ADICIONAL	43.86	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	18.28	6.59	0.60		72.28		EMPEDRADO Y GUARNICIÓN
			16.21	6.52	0.60		63.41		
			16.00	6.15	0.60		59.04		
			47.18	6.12	0.60		173.24		
			21.50	6.22	0.60		80.24		

ELABORO

REVISÓ

ING. ORLANDO LAUREN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 41320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			22.82	6.31	0.60		86.40		
			43.66	6.25	0.60		163.73		
			48.12	12.30	0.60		355.13		
			20.62	6.12	0.60		75.72		
						EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	TOTAL	1,129.19	
						EN ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	1,220.32	
								-91.13	
GF05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.		18.28	6.59			120.47		EMPEDRADO Y GUARNICIÓN
			16.21	6.52			105.69		
			16.00	6.15			98.40		
			47.18	6.12			288.74		
			21.50	6.22			133.73		
			22.82	6.31			143.99		
			43.66	6.25			272.88		
			48.12	12.30			591.88		
			20.62	6.12			126.19		
						EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	TOTAL	1,861.97	
						EN ESTA ESTIMACIÓN	EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	1,677.60	
								0.00	
							ADICIONAL	204.37	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO. COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP05:	1,861.97		
							TOTAL	1,861.97	
						EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	1,677.60	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	
							ADICIONAL	204.37	
ELABORO						REVISÓ			

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 41320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

04 (NORMAL)

GENERADORES ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP05:	1,881.97		
							TOTAL	1,881.97	
							EN ESTIMACIÓN 01(NORMAL)	1,677.60	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	
							ADICIONAL	204.37	
GF08	SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP05:	1,881.97		EMPEDRADO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,881.97	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	962.89	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	613.58	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	101.33	
							ADICIONAL	204.37	
2	ESTRUCTURA								
	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	14.80			1.00	14.80		LADO DERECHO
GF08			16.20			1.00	16.20		
			16.00			1.00	16.00		
			47.30			1.00	47.30		
			20.90			1.00	20.90		
			22.75			1.00	22.75		

ELABORO

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			43.10			1.00	43.10		
			48.50			1.00	48.50		
			20.85			1.00	20.85		
			18.15			1.00	18.15		LADO IZQUIERDO
			16.19			1.00	16.19		
			16.00			1.00	16.00		
			47.06			1.00	47.06		
			22.10			1.00	22.10		
			22.88			1.00	22.88		
			44.21			1.00	44.21		
			47.74			1.00	47.74		
			20.28			1.00	20.28		
			247.15			-1.00	-247.15		MENOS PATIN
							TOTAL	257.86	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	131.06	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	128.89	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	-1.89	
GP088	PATIN DE 15x60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F/C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	247.15			1.00	247.15		
							TOTAL	247.15	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	182.30	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	-96.27	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	0.00	
							ADICIONAL	161.12	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81326

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	18.28	5.63			102.92		EMPEDRADO
			16.20	5.32			86.18		
			16.00	4.95			79.20		
			47.18	4.90			231.18		
			21.50	5.00			107.50		
			22.82	5.10			116.38		
			43.66	5.05			220.48		
			48.12	4.93			237.23		
			2.49	4.88			12.15		LOSA
			20.57	4.92			101.20		
							TOTAL	1,294.42	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	663.91	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	608.22	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	22.29	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	14.80			1.00	14.80		LADO DERECHO
			16.20			1.00	16.20		
			16.00			1.00	16.00		
			47.30			1.00	47.30		
			20.90			1.00	20.90		
			22.75			1.00	22.75		
			43.10			1.00	43.10		
			48.50			1.00	48.50		
			20.85			1.00	20.85		

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			18.15			1.00	18.15		LADO IZQUIERDO
			16.19			1.00	16.19		
			16.00			1.00	16.00		
			47.06			1.00	47.06		
			22.10			1.00	22.10		
			22.88			1.00	22.88		
			44.21			1.00	44.21		
			47.74			1.00	47.74		
			20.28			1.00	20.28		
			5.90			1.00	5.90		TRANSVERSALES
			5.99			1.00	5.99		
			6.09			1.00	6.09		
			6.18			1.00	6.18		
			6.28			1.00	6.28		
			6.66			1.00	6.66		
			6.76			1.00	6.76		
			6.64			1.00	6.64		
			6.52			1.00	6.52		
			6.40			1.00	6.40		
			6.28			1.00	6.28		
			6.18			1.00	6.18		
			6.17			1.00	6.17		
			6.15			1.00	6.15		
			6.13			1.00	6.13		
			6.11			1.00	6.11		
			6.10			3.00	18.30		
			6.11			7.00	42.77		
			6.12			6.00	36.72		
			6.15			1.00	6.15		
			6.16			3.00	18.48		
			6.17			2.00	12.34		

ELABORO

REVISÓ

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			6.33			1.00	6.33		
			6.39			7.00	44.73		
			6.14			1.00	6.14		
			6.12			1.00	6.12		
			6.13			1.00	6.13		
			6.14			2.00	12.28		
			6.15			1.00	6.15		
			6.16			2.00	12.32		
			6.17			1.00	6.17		
			6.18			2.00	12.36		
			6.19			2.00	12.38		
			6.20			1.00	6.20		
			6.21			1.00	6.21		
			6.25			1.00	6.25		
			6.24			1.00	6.24		
			6.23			1.00	6.23		
			6.22			1.00	6.22		
			6.21			1.00	6.21		
			6.20			1.00	6.20		
			6.19			1.00	6.19		
			6.18			1.00	6.18		
			6.17			1.00	6.17		
			6.16			1.00	6.16		
			6.15			1.00	6.15		
			6.14			1.00	6.14		
			6.13			1.00	6.13		
			6.12			1.00	6.12		
			6.06			1.00	6.06		
			6.10			7.00	42.70		
							TOTAL	1,019.08	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	811.74	
							ADICIONAL	207.34	

ELABORO

REVISÓ

ING. ORLANDO LAUREAN-CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA CUSTAYO DÍAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION:

04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	270.58			1.00	270.58		
							TOTAL	270.58	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	14.80			1.00	14.80		LADO DERECHO
			16.20			1.00	16.20		
			16.00			1.00	16.00		
			47.30			1.00	47.30		
			20.90			1.00	20.90		
			22.75			1.00	22.75		
			43.10			1.00	43.10		
			48.50			1.00	48.50		
			20.85			1.00	20.85		
			18.15			1.00	18.15		LADO IZQUIERDO
			16.19			1.00	16.19		
			16.00			1.00	16.00		
			47.06			1.00	47.06		
			22.10			1.00	22.10		
			22.88			1.00	22.88		
			44.21			1.00	44.21		
			47.74			1.00	47.74		
			20.28			1.00	20.28		
			247.15			-1.00	-247.15		MENOS PATIN
							TOTAL	257.86	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LACREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 OTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13.60	2.00	0.35		9.52		
			12.00	2.00	0.35		8.40		
			0.86	1.08	0.35		0.33		
			328.52	1.00	0.35		114.98		
						EN ESTA ESTIMACIÓN	TOTAL	133.23	
						ADICIONAL		108.23	
								25.00	
GF10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	13.60	2.00			27.20		
			12.00	2.00			24.00		
			0.86	1.08			0.93		
			328.52	1.00			328.52		
							TOTAL	380.65	
3	OTROS								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
ELABORO						TOTAL		1.00	

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUAYO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

GENERADORES ESTIMACION: 04 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	18.28	6.59			120.47		EMPEDRADO Y GUARNICIÓN
			16.21	6.52			105.69		
			16.00	6.15			98.40		
			47.18	6.12			288.74		
			21.50	6.22			133.73		
			22.82	6.31			143.99		
			43.66	6.25			272.88		
			48.12	12.30			591.88		
			20.62	6.12			126.19		
			13.60	2.00			27.20		BANQUETA
			12.00	2.00			24.00		
			0.86	1.08			0.93		
			328.52	1.00			328.52		
							TOTAL	2,262.62	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	2,218.76	
							ADICIONAL	43.86	

ELABORO

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,

DEPENDENCIA:

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: MATERIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. OBRA:

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

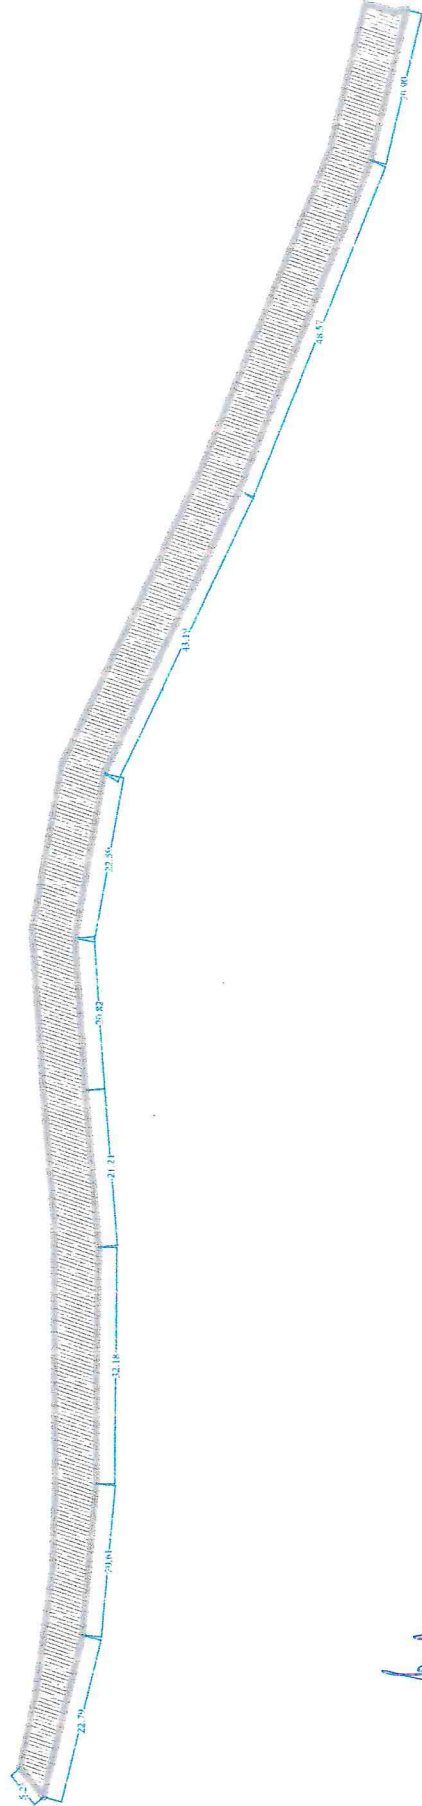

ELABORO

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

ING. ORLANDO LAURIDIAN-CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

CROQUIS

COMERCIAL DE ACERO Y

CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

S.A. DE C.V.

ESTIMACION: 04 (NORMAL)


ESTRUTURA

GP08

GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088

PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM²
MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

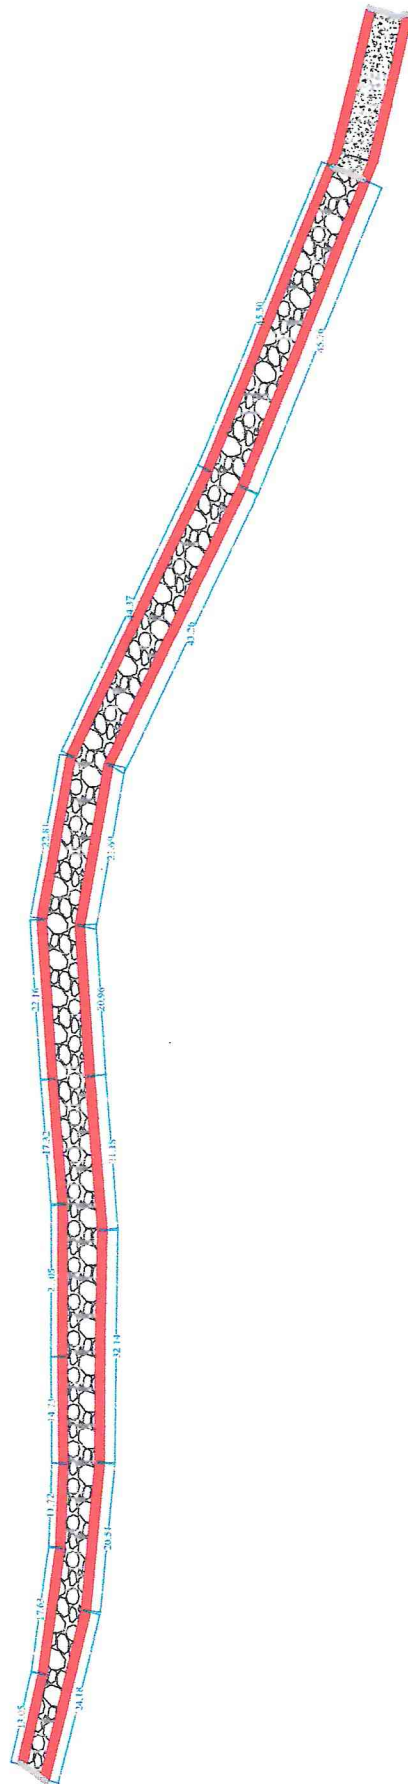

LABORO

DR. ORLANDO LAUREAN CERVANTES

SUPERINTENDENTE DE OBRA


REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

		FECHA: 01/11/2025	
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	
CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
		DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	
CONTRATISTA: MATERIALS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		CROQUIS	
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	
OBRA: S.A. DE C.V.			
ESTIMACION: 04 (NORMAL)			
GP56		EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

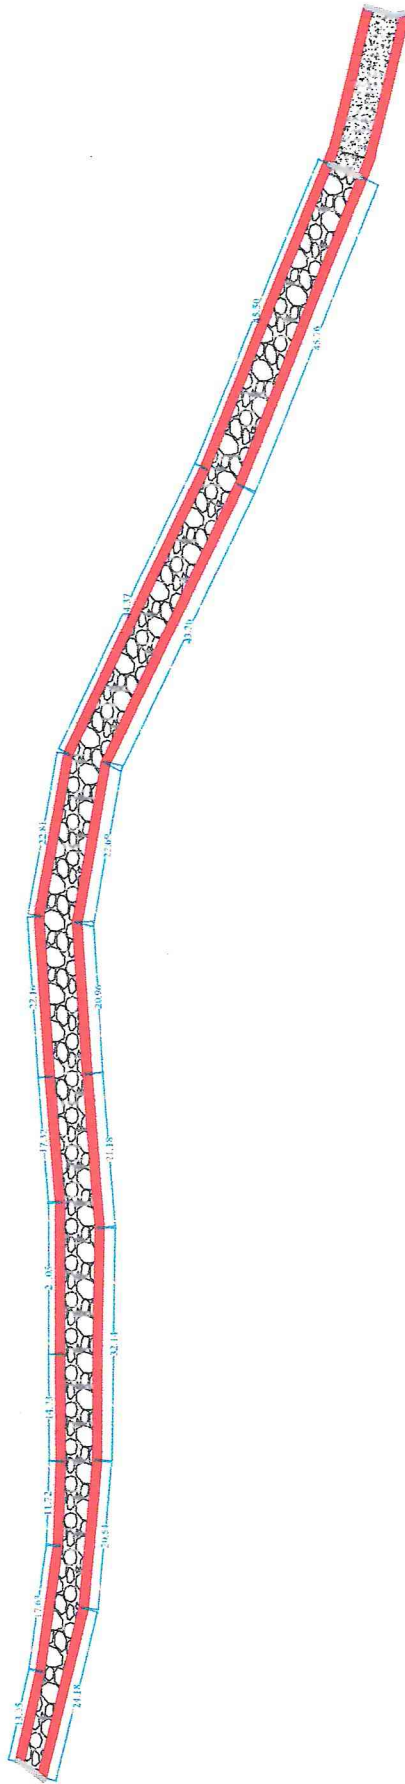

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DEPENDENCIA:

CROQUIS

COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA: S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

GP13

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

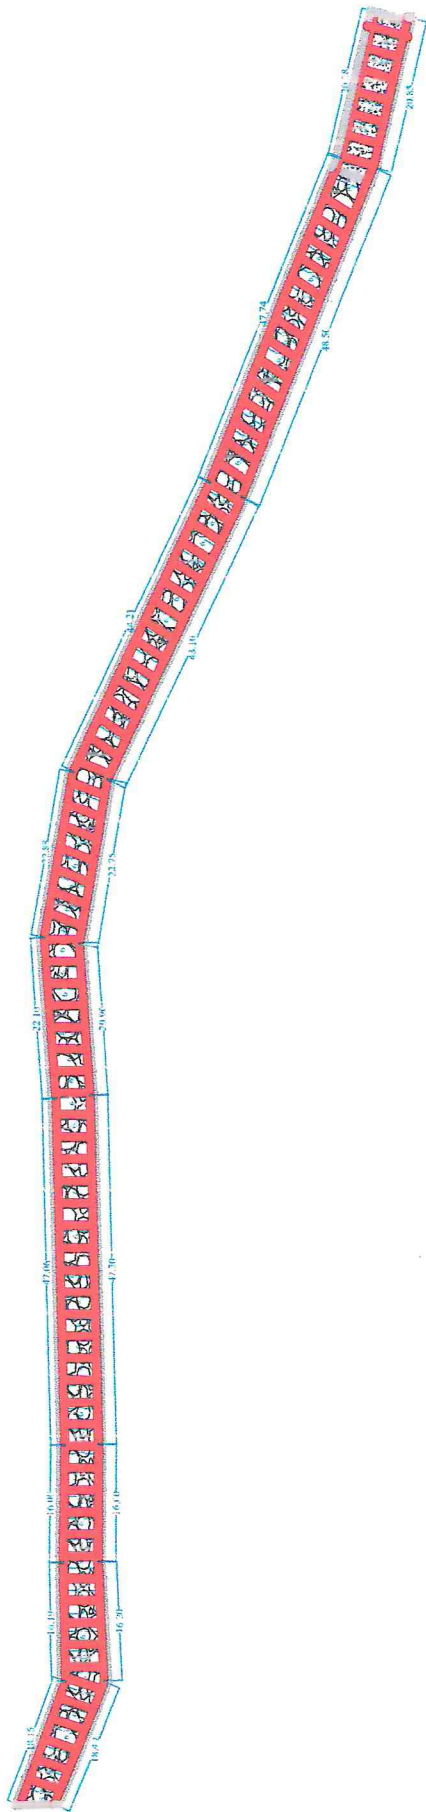

ELABORÓ

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 181 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

CROQUIS

COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:

S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: 04 (NORMAL)

GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GP11 PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

GP26 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GP10 BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.

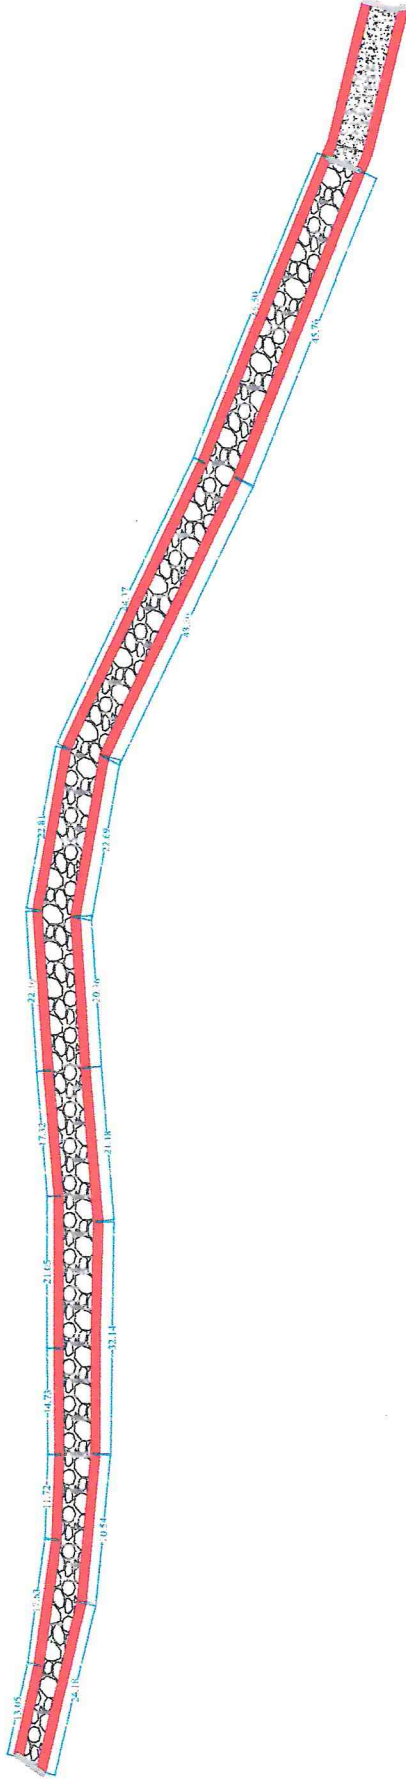

ELABORO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A DE CV

CALLE MANZANA ISLOTES 4,5 Y 6. VILLA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: MATERIALS DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. OBRA:

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

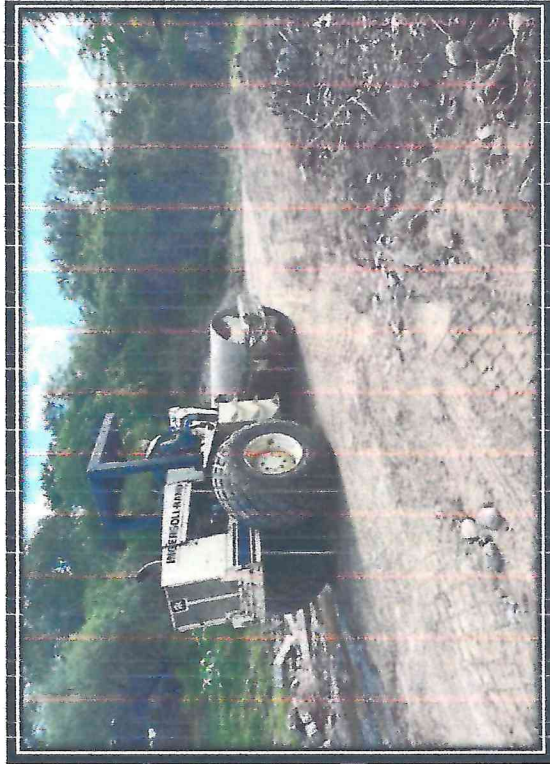

ELABORO

ING. ORLANDO NAVARRAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

		FECHA: 01/11/2025	
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	
CALLE MANZANA 18 LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,	
CONTRATISTA: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		REPORTE FOTOGRÁFICO	
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	
OBRA:			
ESTIMACION: 04 (NORMAL)			
GP06			

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HULE NEGRO PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

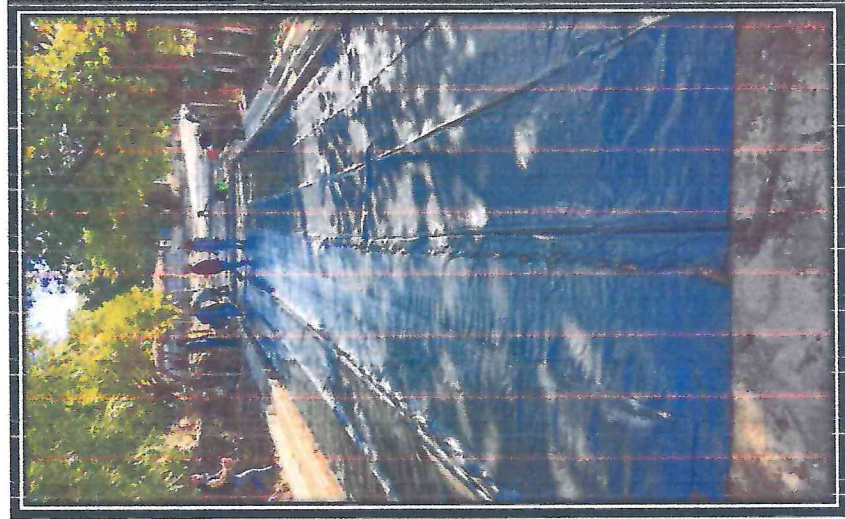

ELABORO


ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ


SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO


ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA. DE C.V.
OBRA:

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP56 EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORO

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

ING. ORLANDO LAUREAN GERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV

CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ, AHOMIE, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL
PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
SINALOA.

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

GP13

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y
BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

GP15

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

GP11

PINTURA EN GUARNIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.



ELABORO

ING. ORLANDO JUAN DE AN-CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 18 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
OBRA:

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

GP26 RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GP10 BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.



ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

ING. ORLANDO LARREA CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SA DE CV



CALLE MANZANA 181 LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOMÉ, SINALOA C.P. 81320

FECHA: 01/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RÍOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: COMERCIAL DE ACERO Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
S.A. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 04 (NORMAL)

3

OTROS

GBR671

LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP101

LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO

REVISO

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



Fecha y hora de consulta24/12/2025 4:44:51 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 04 NORM LP 007

Importe de la operación: 389,403.43 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 002743700452705974

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 24/12/2025

Fecha de aplicación: 24/12/2025

Concepto de pago: EST 04 NORM LP 007

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 16:44:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000716162

Clave de rastreo: 002601002512240000716162

Folio de firma: 0050525201

Folio único: I401202512241644420050525207

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
