



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
7532

FECHA DE EXPEDICION
28/07/2026

CTA. CARGO: 000000 - CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN SA DE CV

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026 / (001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CTA. CARGO

2113/1/000911/009847/000000/00
0000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS,	1,179,348.97	1,179,348.97

2026-9-0911-222-10-10-21-56-614964-123540000090009110 Falsmun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614964 Falsmun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)

ACUSE



FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026
ESTIMACION 1 (UNICA)

Cargo: (001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

SUB- TOTAL: 1,016,680.15

DESCUENTO:

I VA: 162,668.82

RETENCIONES: 46,923.70

TOTAL: 1,132,425.27

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Ricardo Cota
RICARDO COTA TORRES

SECRETARÍA
DE
BENESTAR
JOSÉ GUILLERMO PÁEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/DOP/1196-26
Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 27 de julio del 2026.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (única)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fecha, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones contractuales, de la siguiente obra:


Importe contratado: \$ 1'814,383.04
Importe contratado de la obra: \$ 1'814,383.04
Importe total estimado: \$ 1'814,383.04
Importe total a pagar: \$ 1'132,425.27

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026	(001AH26PR) Rehabilitación de red de alumbrado público en la localidad de Compuertas, sindicatura Central, municipio de Ahome, Sinaloa.	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
JETC/MYRG



CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN
CCE220215159

601 - General de Ley Personas Morales

Cliente

MUNICIPIO DE AHOME
MAH1701013C0

Domicilio fiscal: 81280 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

3387529c-51dc-4be7-9cac-94352f023e21

Número de serie del CSD

00001000000700944622

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 80050

25/07/2026 12:27:55 PM

Serie y folio sinube

A - 165

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
-----------	--------	----------	------------	--------	-------------	-----------------	---------	------------------

72151500	72151500	1	E48	E48	EST 1(UNICA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026, POR LA REALIZACION DE LA OBRA: (001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. IMPORTE ESTIMACION NETA: \$ 1'814,383.04 AMORTIZACION ANTICIPO 35%: \$ 635,034.07 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 2% A.S.E: \$ 31,282.47 RET. VERIF. INSPECCION FISC. CONTROL 1% O.I.C.: \$ 15,641.23 TOTAL DEDUCCIONES: \$681,957.77 IMPORTE A PAGAR: \$ 1'132,425.27	\$1,016,680.15	\$1,016,680.15	02
----------	----------	---	-----	-----	--	----------------	----------------	----

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$1,016,680.15	\$162,668.82

Importe con letra:

UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
97/100 M.N.

Subtotal	\$1,016,680.15
Descuento	\$0.00
IVA 16.0%	\$162,668.82
TOTAL	\$1,179,348.97

CONTADO | 99 - Por: definir | PPD - Pago en parcialidades o diferido

Sello digital del CFDI:

CEISJWcNexeb11QMsO7KMYvpCYYo52mcPPKRAix7Fsqm/9GLn+u4cUAIHkNXgTAfqm7+eQf7USwCwx+kz3cpaSWsl2SQKfZuZhQs0iVr5KV9FS9FOodVHQC9iAOA4DzuKR2hi74ma7SsZbQOGdtAq+xKChH2MQgHXj7izjakVVMOFNZTS1nlvJFqx5srAPK4wmJNLumK0VjKKhsthu4xslBUAnAzvk0oTDhobnXmymCGSAPnyn5LkLxHVBtKQAaX/uy9hJNcl8FjFNyg18CGAX+2dVsVBGFz4m6KnLnTsoSxeEsWsKlmWRxEAZZXPxaaQj+U939+8W0tuidfu4PDQ==

Sello del SAT:

NV1TK4QZ77VrkJKbfnPx1toZ7/2HV/ACIFsJxSXCqdl45/nYqUXJJDf7QbGT+ajKW+uacLCsYiRZTJXJ665ZPHfUoKjRWISet0N
YADTg951995YBocgkagiXDl2+yjXSAyNQ3lJ0UstuFWIHGs/JoONQJnJFAPxpC4InvlvA6Ug7iOlgulebT2FhXW6inPD8yB
vPP+DHzzFkYLwPpYvr6PmX7oXoEXcYxWrxehpnRpsDCad2vMnRTICmeMdTDn3177I03ZiV94qMhnyGiPE3KSBsSiSeQ7TsrUSZ3P
PHIQ9WxEQDXkfEhh0mnlSPF2IH91mG5LII7EhaxtQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3387529c-51dc-4be7-9cac-94352f023e21|2026-07-25T13:28:56|LSO1306189R5|CEISJWcNexeb11QMsO7KMYvpCYYo52mcPPKRAix7Fsqm/9GLn+u4cUAIHkNXgTAfqm7+eQf7USwCwx+kz3cpaSWsl2SQKfZuZhQs0iVr5KV9FS9FOodVHQC9iAOA4DzuKR2hi74ma7SsZbQOGdtAq+xKChH2MQgHXj7izjakVVMOFNZTS1nlvJFqx5srAPK4wmJNLumK0VjKKhsthu4xslBUAnAzvk0oTDhobnXmymCGSAPnyn5LkLxHVBtKQAaX/uy9hJNcl8FjFNyg18CGAX+2dVsVBGFz4m6KnLnTsoSxeEsWsKlmWRxEAZZXPxaaQj+U939+8W0tuidfu4PDQ==|00001000000719545303||


No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:

25/07/2026 13:28:56 PM

Daniel Acosta L





SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCE220215159	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3387529C-51DC-4BE7-9CAC-94352F023E21	2026-07-25T12:27:55	2026-07-25T13:28:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,179,348.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Daniela Acosta





ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)





Los Mochis, Sinaloa., a 23 de mayo de 2026

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$1,815,992.05 (Son: Un Millón Ochocientos Quince Mil Novecientos Noventa y Dos pesos 05/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:


<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-001/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2026	56	614964	1235/4/9/911/9294

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal TESORERÍA MUNICIPAL
DE AHOME

C.c.p. LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
1 (UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.			
	DOMICILIO	Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
	CIUDAD:	CULIACAN	ESTADO:	SINALOA	TELEFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	01 DE JUNIO DE 2026.	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026			\$1,814,383.04
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			IMPORTE DE LA OBRA
	(001AH26PR)-REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			\$1,814,383.04 AÑO 2026.

BUENO POR: \$1,132,425.27

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE: \$1,132,425.27

(Son: Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos con 27/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 29 DE JUNIO DE 2026. AL 23 DE JULIO DE 2026.
DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$1,016,680.15		\$1,564,123.31
I.V.A. 16%:	\$162,668.82		\$250,259.73
SUMA:	\$1,179,348.97		\$1,814,383.04
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:			\$635,034.07
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.:			\$31,282.47
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.:			\$15,641.23
TOTAL DE DEDUCCIONES:			\$681,957.77
IMPORTE A PAGAR:			\$1,132,425.27
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 23 DE JULIO DE 2026.			


RECIBI

Daniela Acosta

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

AUTORIZO

[Signature]
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR:	\$1,179,348.97
IMPORTE A PAGAR:	\$1,132,425.27



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE
ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)

OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

PERIODO DEL : 29 DE JUNIO DE 2026. AL 23 DE JULIO DE 2026.

FECHA: 23 DE JULIO DE 2026.

NO.

PARTIDA

DE ESTIMACIONES ANTERIORES

DE ESTA ESTIMACIÓN

OBSERVACIONES

1 (UNICA)
(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

\$1,564,123.31

ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA

CLAVE

MONTO DE LA OBRA	(001AH26PR)	\$1,814,383.04
MONTO ESTIMADO	(001AH26PR)	\$1,814,383.04
MONTO POR CANCELAR	(001AH26PR)	\$0.00
MONTO DEL ANTICIPO	(001AH26PR)	\$635,034.07
MONTO AMORTIZADO	(001AH26PR)	\$635,034.07
MONTO POR AMORTIZAR	(001AH26PR)	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	(001AH26PR)	\$635,034.07
ESTIMACION	1 (UNICA) (001AH26PR)	\$635,034.07
TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:		\$635,034.07

SUBTOTAL

\$0.00

\$1,564,123.31

I.V.A.

\$0.00

\$250,259.73

TOTAL

\$0.00

\$1,814,383.04

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$635,034.07
TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$635,034.07
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.	
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$31,282.47
TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$31,282.47
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.	
EST. ANTERIOR	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$15,641.23
TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$15,641.23

GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA

\$681,957.77

IMPORTE DE ESTIMACIÓN:

\$1,814,383.04 Son: Un Millón Ochocientos Catorce Mil Trescientos Ocho y Tres Pesos con 04/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DEL CONTRATO

ESTIMADO A LA FECHA

SALDO POR ESTIMAR:

CONTRATO

\$1,814,383.04

ANTICIPO OTORGADO

\$1,814,383.04

AMORTIZADO A LA FECHA

\$0.00

SALDO A AMORTIZAR

ANTICIPO

CONTRATO

\$635,034.07

\$635,034.07

\$0.00

CONFORME

REVISÁ

AUTORIZO

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES

HOJA 1

DE 1

ESTIMACIÓN No. # 1 (UNICA)

OBRA: (001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA: 23 DE JULIO DE 2026.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	RED DE ALUMBRADO											
01	LUMINARIAS											
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,	PZA							204	204	204	
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							1	1	1	



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Ing. Glenda Alvarez

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS	
	SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026	
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)

001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,



Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO

HOJA1

DE1

OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

PERIODO DEL :

29 DE JUNIO DE 2026

AL

23 DE JULIO DE 2026.

FECHA:

23 DE JULIO DE 2026.

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,	PZA	204	204.00	0	204.00	0.00	\$7,664.49	\$0.00
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$567.35	\$0.00
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$0.00
SUBTOTAL:									\$0.00
IVA:									\$0.00
TOTAL									\$0.00
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$1,814,383.04
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$1,814,383.04
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00

CONFORME

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA,		



001




002



003



004



005



006




007



008



009



010

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V. ✓		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS ✓		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026 ✓		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026. ✓	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA) ✓
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, ✓		



011




012




013




014

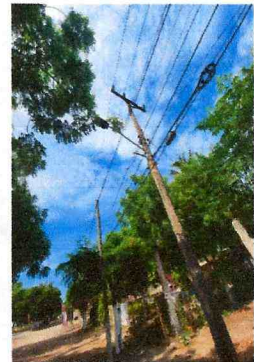

015



016




017



018



019

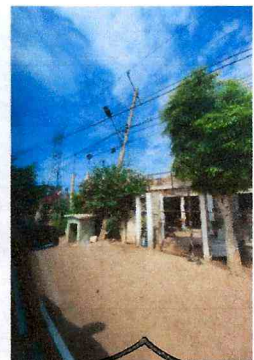

020

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS		
	SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



021




022



023




024

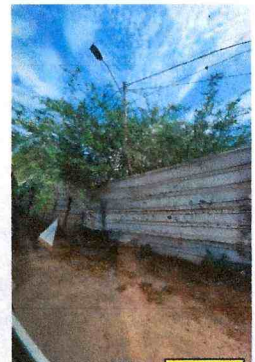

025



026



027



028



029



030

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A.
DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,




031




032



033




034

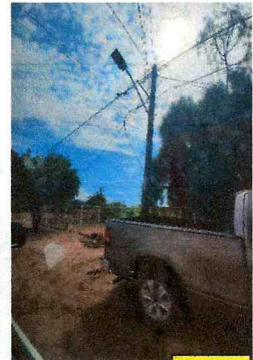

035



036



037



038



039




040

Daniela Acosta

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

001

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,



041



042



043



044



045



046




047



048



049

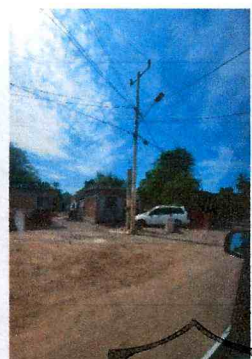


050

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



051




052



053



054

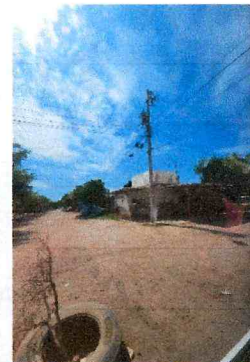


055



056



057



058



059




060

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



061




062




063



064

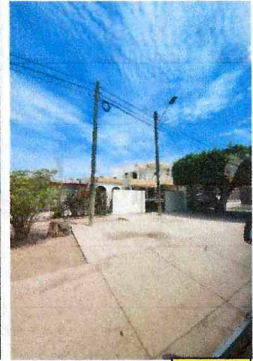

065



066




067



068



069

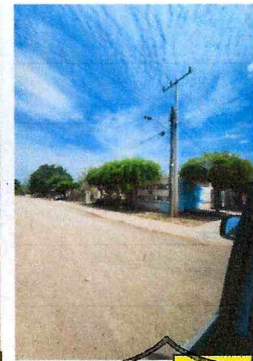

070

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)

001


SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,



071



072




073




074



075



076



077



078



079




080

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SF POTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SF POTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



081



082



083



084



085



086



087



088



089



090

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		




091



092



093



094



095



096



097



098



099



100



Daniela Acosta L

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



101



102



103



104




105




106




107



108



109




110

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



111




112



113



114

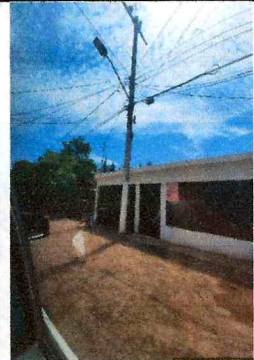

115



116



117



118



119




120

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SF POTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SF POTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



121



122



123




124



125




126



127



128




129



Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



131




132




133



134



135



136



137



138



139



140

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



141




142



143




144



145



146



147



148



149



150

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



151



152



153




154



155



156



157



158



159



Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



161



162




163



164



165



166



167



168



169




170

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



171



172



173




174



175



176




177



178



179

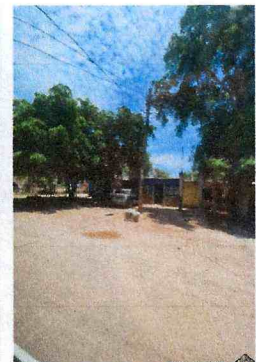


180

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



181




182



183



184

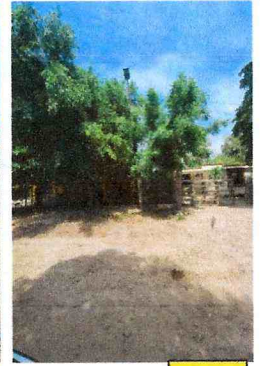

185



186



187



188



189




190

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		



191




192



193



194



195



196



197



198



199




200

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA,		

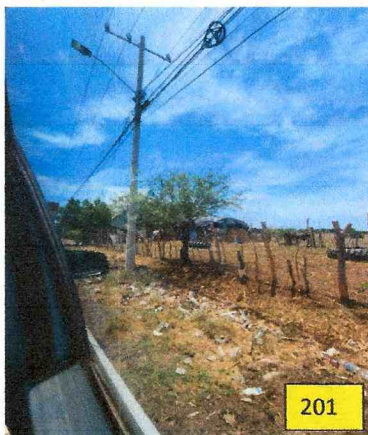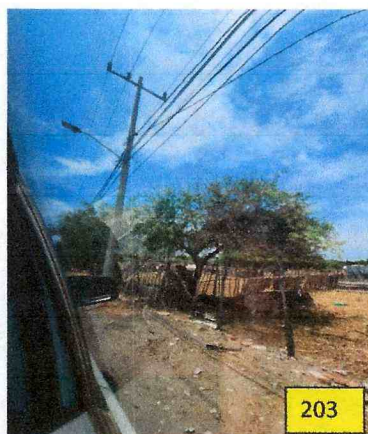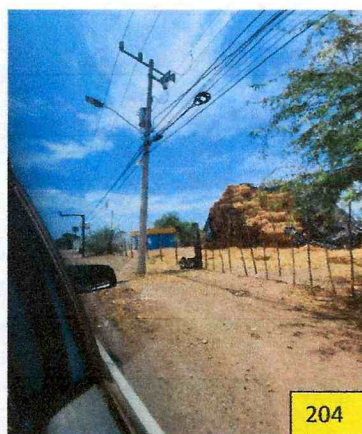

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
No. CONTRATO:	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 1,814,383.04	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-001/2026 de fecha 23 de mayo de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2026 con número O-098. Y aprobada para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/105/2026 de fecha 23 de mayo de 2026.
MONTO DE LA OBRA:	\$ 1,814,383.04		SUBPROGRAMA
FECHA DE INICIO:	02 DE JUNIO DE 2026.	REAL:	29 DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	01 DE JULIO DE 2026.	REAL:	23 DE JULIO DE 2026.
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO:	Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(667) 243 96 76		
TIPO DE TRABAJO:	REHABILITACION DE LUMINARIAS		
REPRESENTANTE:	C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1. <u>Daniela Acosta L.</u> C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA	
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.			
CONTRATISTA			
2. <u>Francisco Villegas Jesus H.</u>			
3. _____			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

29/06/2026

Inicio

CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA ESTA
BITACORA DE LA OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE
COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNI-
CPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Francisco Villalobos
Jesus M.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

1

TRABAJO

(60 P2A)

COLOCACION CON GRA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIA PROMETEO
80W, 100-277V, SEGUN ESPECIFICACIONES
DEL CATALOGO DE CONCEPTOS

02/07/2026

1

TRABAJO

(50 P2A)

COLOCACION CON GRA Y SUMINISTRO
E INSTALACION DE LUMINARIA PROMETEO
80W, 100-277V, SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS

08/07/2026

1

TRABAJO

(60 P2A)

COLOCACION CON GRA Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIA PROMETEO
80W, 100-277V, SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

Franco Villegas Jesus M.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONTRANT

RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

1


13/07/2026
TRABAJO
(34 PZA)

COLOCACION CON GRUA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIA PROMETEO
30 W, 100-227 V, SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Fraile Villegas Jesus M.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

4

UBICACIÓN:

LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

CONTRATO:


FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	23/07/2026 ESTIMACION	CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA ESTIMACION PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PAGO CON UNA CANTIDAD DE: \$ 1,814,383.04
	CERRAR	CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA DE LA OBRA (001AH26PR) CONTRATO: FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

Fraire U. Negras Jesus M.

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



Ing. Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.		
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PB) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS		
	SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026		
FECHA	23 DE JULIO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNICA)


UBICACIÓN	COORDENADAS
LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	25.841021°, -109.019650°



Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



CONTRATO:

FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

DATOS DEL PROYECTO

PROPIETARIO:
MUNICIPIO DE AHOME
UBICACIÓN:
LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS
- NIVELES EN METROS
- NO SE TOMARAN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LAS COTAS INDICADAS SON A PISO DE ALBANILERIA
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL
CONTRATISTA
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON LA DIRECCION DEL
PROYECTO ASI COMO LA INTERPRETACION QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE
AL DISEÑO

MODIFICACIONES

NUM.	COMENTARIO	FECHA

FIRMAS Y SELLOS

Daniela Acosta
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RECIBIENTE DE OBRAS PUBLICAS
REVISOR

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DEL PROYECTO

(001AH26PR) REHABILITACION
DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE
COMPUERTAS SINDICATURA
CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

CONTENIDO DEL PLANO

- PLANO DE OBRA TERMINADA

FECHA:
JULIO 2026

01

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: LOCALIDAD DE COMPUERTAS, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRA: (001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026)-1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$1'814,383.04 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V. CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, EL CONTRATISTA INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 29 DE JUNIO DE 2026.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 26 DE JUNIO DE 2026

ELABORÓ Y REVISÓ




**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBO

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la moral denominada **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.**, representada por la ciudadana **DANIELA ACOSTA LAZCANO**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 01 de junio de 2026, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad la obra: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:



TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 02 de junio de 2026 y a terminarlos a más tardar el día 01 de julio de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$1'564,123.31 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS 31/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$250,259.73 (SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.)
TOTAL: \$1'814,383.04 (SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 26 de junio de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
02 de junio de 2026	01 de julio de 2026	29 de junio de 2026	28 de julio de 2026

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026)-1

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.


SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por **"LAS PARTES"** que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día **26 de junio de 2026**.

Por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**


C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

Por **"EL CONTRATISTA"**



C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

TESTIGOS:


C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME




C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


C. JOAQUÍN PAEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**


C. MARÍA LUISA GÓMEZ LIZARRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la moral denominada CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., representada por la ciudadana DANIELA ACOSTA LAZCANO, celebrado con fecha 26 de junio de 2026.


**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
ERKN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A 29 DE JUNIO DE 2026

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

Nº. FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

CON EL NOMBRE DE:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO:	02 DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	01 DE JULIO DE 2026.
PLAZO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO:	29 DE JUNIO DE 2026.
FECHA DE TERMINO:	28 DE JULIO DE 2026.
PLAZO DE EJECUCION:	30 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta Lazcano

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán
Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1031-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 02 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada según contrato número: **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026**, misma que se detalla a continuación: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuya obra le fue adjudicada al contratista de nombre: **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del: **26 de junio del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(001AH26PR)	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	02/06/2026	29/06/2026
Fecha de termino:	01/07/2026	28/07/2026
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPPA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V. /Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx

Daniela Agosto L
03/07/2026

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA, A 26 DE JUNIO DE 2026.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 26 DE JUNIO DE 2026, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

(001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚM. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

Hola, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN

Se recibió una transferencia interbancaria SPEI del Banco BANORTE, de la cuenta *****6906, a la cuenta CLABE *****2856.

Clave de Rastreo:	8846APR2202606265464240128
Hora y Fecha:	11:58:52 26 JUN 2026
Numero de Referencia:	260626
Banco Origen:	BANORTE
Ordenante:	MUNICIPIO DE AHOME
Concepto del Pago:	PAGO ANT35PORAP 6154 FACTA154
Nombre del Beneficiario:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN
Banco Destino:	BANCO VE POR MAS, SA
Importe:	635034.07

Si tienes alguna duda, llama a Línea B++ al 01800-8376-7627, en donde uno de nuestros ejecutivos con gusto te atenderá

No responder a este mensaje.

Agradecemos tu preferencia.



SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: contructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 29/JUNIO/2026.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 29/JUNIO/2026.
FECHA DE TERMINACION: 28/JULIO/2026.

OBRA: (001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2026	
								01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	(001AH26PR) REHABILITACION DE RED ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$1'564,123.31	\$130,296.33	\$1'433,826.98
1	RED DE ALUMBRADO			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$1'564,123.31	\$130,296.33	\$1'433,826.98
01	LUMINARIAS			29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$1'564,123.31	\$130,296.33	\$1'433,826.98
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR,	PZA	204.00	29/Jun/2026	30c	28/Jul/2026	\$1'563,555.96	\$130,296.33	\$1'433,259.63

ATENTAMENTE

Daniela Acosta
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: contructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 29/JUNIO/2026.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 29/JUNIO/2026.
FECHA DE TERMINACION: 28/JULIO/2026.

OBRA: (001AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS
SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramacion de Obra de Montos

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	Total	Año 2026	
								01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
002	BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	22/Jul/2026	7c	28/Jul/2026	\$567.35		\$567.35
TOTAL PARCIAL:							\$1'564,123.31	\$130,296.33	\$1'433,826.98
TOTAL ACUMULADO:								\$130,296.33	\$1'564,123.31

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL

BLVD. CONQUISTADORES #2213 FRACC. CONQUISTA DEL REY, C.P. 80058 CULIACAN, SINALOA.
RFC: CCE220215159, TEL 667 243 9676 COREO: contructycomercerk@gmail.com



CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

01 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL
FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Fraire Villegas Jesus M.

ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS
SUPERINTENDENTE

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA


**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.


CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

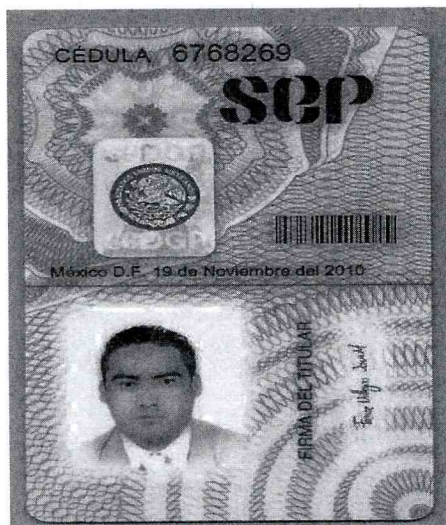

Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 29 de mayo del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**


Número de contrato: **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.**

Fecha: **01 de junio de 2026.**

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO T...
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

Daniel L. Acosta 29/mayo/2026
29/05/2026 

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

29 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEL 29 DE JUNIO DE 2026.

EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán
Rosales, Culiacán, Sinaloa.




H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1030-26.

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 02 de julio de 2026.



C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obra que fue contratada, según contrato número: **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.**, consistentes específicamente en: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**, cuya obra le fue adjudicada a **"EL CONTRATISTA" CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.,** con un importe total de hasta: **\$ 1,814,383.04,** identificándose como origen del recurso el correspondiente a: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026).**

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a la obra antes señalada, quedaron establecidos como a continuación se indica:


(001AH26PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
29/06/2026	28/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, me despido de usted.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CABECERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Pérez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga /Síndica Procuradora
c.c.p. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V. /Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx

Daniela Acosta L.
03/07/2023

CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN,
S.A. DE C.V.

LOS MOCHIS, SINALOA A

23 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL FINAL DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 23 DE JULIO DE 2026.

EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:
FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
DIRECTOR GENERAL



Boulevard Conquistadores #2213, colonia Conquista del Rey, entre calle Conquistadores y calle Carlos V, código postal 80058, localidad Culiacán
Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

22ND8223947

Clave de R.F.C.

CCE220215159

Nombre, Denominación o Razón social

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de julio de 2026, a las 10:14 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

Cadena Original

||CCE220215159|22ND8223947|01-07-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

vJBKSBjYMcgwnhLLrEKnSR9nkvVgkBHIVNmwdHZwmUXfNSCEXUYH4FIJ3hi5lehgaiPvAtIaKYFF95K5PKI-6c64T5
bKBxgWtNf3xYykZwhtTzpwTS1lqgP3gA8rfzJu4D4E1cSfJp3HvvLDzVlwcniHiPThGqEu/Kh



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.



Cadena Original

||CCE220215159|22ND8223947|01-07-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

vjBKSBJYMcgwnhLLrEKnSR9nkvVgkBHIVNmwdHZwmUXfNSCEXUYH4FIJ3hi5lehgaiPvATlaKYfTJ5K5PKI+6c64T5
bKBxgWtNf3xYykZwhtTzpwTS1lqgP3gA8rfzJu4D4E1cSfJp3HvvLDrZvLwcnIHIPThGqEu/Kk4HKygiQ=

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-006855

Los Mochis, Sinaloa, 7 de julio de 2026

C. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al corriente
JAPAMA		
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS




TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Cadena de Seguridad
OpA08wG9bIRna8baGLGUH6WW3ls=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1191-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 25 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de contrato: **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 23 de julio de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día jueves 30 de julio de 2026 a las **09:00 a.m.** horas.

Se anexa croquis de localización.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P.- Joaquín Paez Roiz/Secretaría de Bienestar
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
C.C.P.- CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V./Contratista
C.C.P.- Ing. Alejandro Gonzalez Connant/Residente De Obra
C.C.P.- Archivo
JETC/AARF



AYUNTAMIENTO
DE AHOME


MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
NOMBRE DE LA OBRA	(001AH26PB) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS
NUMERO DE CONTRATO	SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
FECHA	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026
	23 DE JULIO DE 2026.
	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)

UBICACIÓN	COORDENADAS
LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	25.841021°, -109.019650°

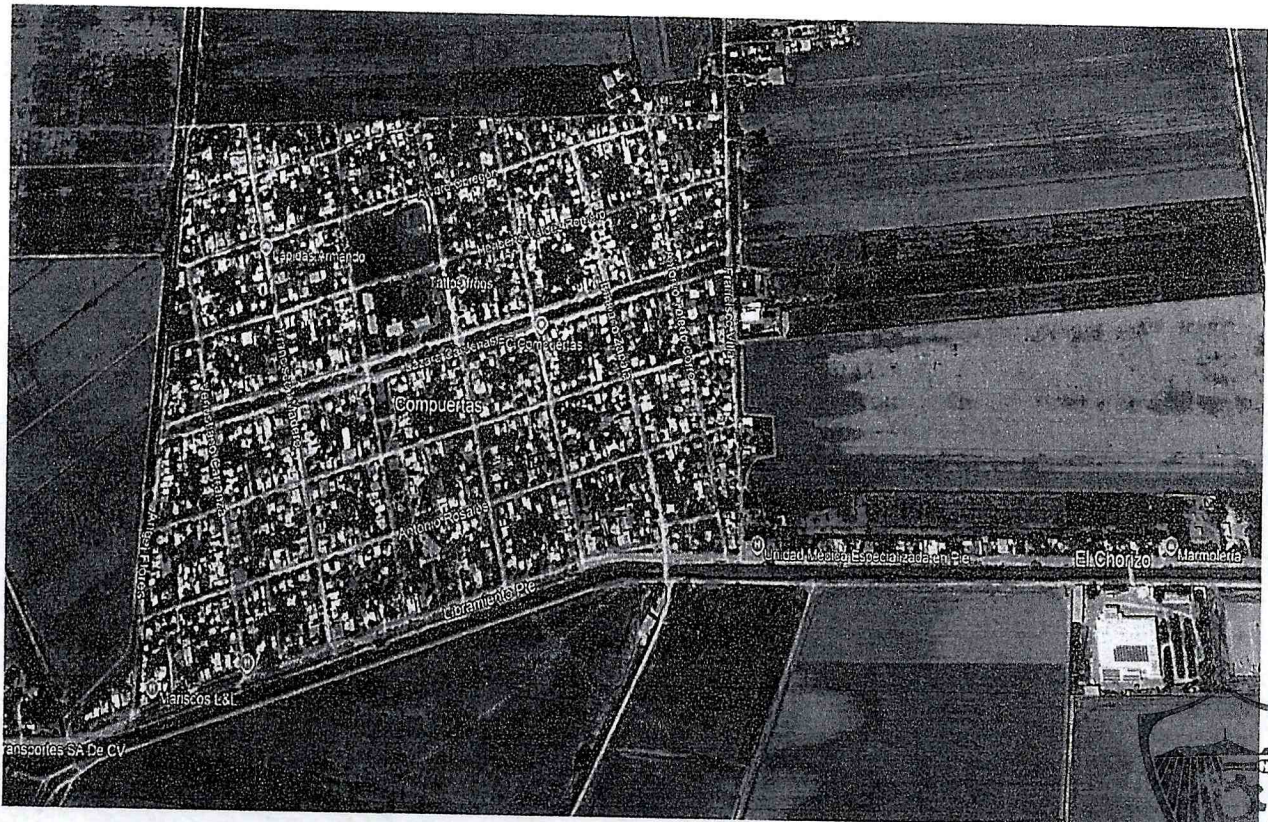

Daniela Acosta L.

C. DANIELA ACOSTA LAZCANO.
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Localidad	COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Municipio	AHOME				
Num. De contrato	FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.				
Contratista	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.				
Importe de la obra	\$1,814,383.04				
Anticipo entregado	\$635,034.07				
Fianza de anticipo	26A24964, DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.				
Fianza de cumplimiento	26A24970, DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A.				
Inicio de los trabajos	29 DE JUNIO DE 2026				
Termino de los trabajos	23 DE JULIO DE 2026				
Plazo de dias de ejecución de la obra	25 DIAS				

En Los Mochis Sinaloa siendo las: 09:00 horas del dia 30 de JULIO del 2026

Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

Residente de Obra

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)	29/06/2026	23/07/2026	\$1,814,383.04	\$1,814,383.04	\$1,132,425.27	\$1,132,425.27
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:


RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGO EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra

Daniela Acosta L.
C. DANIELA ACOSTA LAZCANO
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V.





Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Datos generales de la Obra:

Obra:

(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. de contrato: **FAISMUN-ALP-001PR-AH-2026.**
Fecha de contrato: **01 de junio de 2026**
Inversión contratada: **\$ 1,814,383.04**
Inversión ejercida: **\$ 1,814,383.04**
Fecha de inicio: **29 de junio de 2026**
Fecha de término: **23 de julio de 2026**

Siendo las **10:00** hrs. del día **30 de julio** del año **2026** se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

Nombre

Cargo

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

Director de Obras Públicas

C. Daniela Acosta Lazcano
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

Contratista

Daniela Acosta L.

Declaraciones

I.-EI H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó a CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S.A. DE C.V., "El Contratista" la realización de la obra: **(001AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.





Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

II.-EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 30 de julio de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 23 de julio de 2026.

III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 10:15 horas del día 30 del mismo mes y año arriba señalado.

Por "El Contratante"

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

C. Daniela Acosta Lazcano
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.

Daniela Acosta L.

