



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
8371

FECHA DE EXPEDICION
13/08/2026

CTA. CARGO: 000000 - ACOSTA RUESTRA ROTHXANA YANETH

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026/012PR / (012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CTA. CARGO

2113/1/000911/009337/000000/00
0000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA	439,653.97	439,653.97

026-9-0911-222-10-10-21-56-614964-123540000090009110 Falsmun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)- FONDOS FEDERALES- APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614964 Falsmun-progr.urbanizacion, (red Alumbrado Publico)

Nombre de los Trabajos: (012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
No. de Contrato: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026/012PR

ACUSE

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Autorización Presupuestal
- Autorización de trámite de pago con la Secretaría de Bienestar
- Factura Original
- Verificación de comprobantes fiscales originales con el SAT
- Estado de Cuenta

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026
ESTIMACION 1 (UNO)

Cargo: (012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

SUB- TOTAL: 379,012.04

DESCUENTO:

I VA: 60,641.93

RETENCIONES: 17,492.86

TOTAL: 422,161.11

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO
Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Ricardo Cota
RICARDO COTA TORRES

SECRETARÍA
DE
BIENESTAR

JOAQUIN PAEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/1311-26
Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 11 de agosto del 2026.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 1 (uno)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, oficio de transferencia para verificar fechas, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, acta administrativa de derechos y obligaciones contractuales, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 763,936.09
Importe contratado de la obra \$ 676,390.72
Importe total estimado: \$ 676,390.72
Importe total a pagar: \$ 422,161.11

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	(012AH26PR) Rehabilitación de red de alumbrado público en la localidad Paredones, sindicatura Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa.	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"AHOME, LA CASA DE TODOS"

DR. OLIVER GABRIEL LEAL AYALA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
OGLA/MYRG





ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA

AORR790910815

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

VARSOVIA, 2130/B, LOMAS DEL SOL, 80016, CULIACAN, Sinaloa, México
Tel. 6671530861

CLIENTE

MUNICIPIO DE AHOME

MAH1701013C0

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 81280

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 258

FOLIO FISCAL (UUID)

BBF34076-B3A7-4B73-8B7C-34A8D3EF3F21

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000720820568

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-08-10T16:26:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-08-10T15:15:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80016


CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	\$ 379,012.04	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 379,012.04
POR LA REALIZACION DE OBRA CONSISTENTE EN: (012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
IMPORTE ESTIMACION NETO: \$ 676,390.72					
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35%: \$ 236,736.75					
RET VERIF INSPECCION, FISC. CONTROL 2% A.S.E. \$ 11,661.91					
RET VERIF INSPECCION, FISC. CONTROL 1% O.I.C. \$ 5,830.95					
TOTAL DE DEDUCCIONES: \$ 254,229.61					
IMPORTE A PAGAR: \$ 422,161.11					
Clave Prod. Serv. - 72151500 Servicios de sistemas eléctricos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 379012.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60,641.93					

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 97/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SUBTOTAL \$ 379,012.04
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 60,641.93
TOTAL \$ 439,653.97



SELLO DIGITAL DEL CFDI

KmTWZzZDoGgG5hZBzSuiR1XjeoPRzdW+o1JjGubpu3PKAq9JUzpyq+r8wHsgt70nfdQ79DzXwzyP2qJ6KgmwgcY0DxPGULutnHpAgo4zJ+8AA8sKyU3rV197298plhdA+LNzjypElapYz+7Gjym7XHjoCnEdi9YPHM5+WUllknGpHfNK949apWC1Gjg/mqQ1bvBOA0wdQMjcoLajIRULRTLAS6uJe1158wi5jTeB/obxVPxnKnfmq1ct5PZQn9P2Mgtjg6DtxcdjWk+wdbi823AIY67gp5MRLJ8imRj46h5W+VIRRHTrJUXz1qD6NKRcRkPhnfjqKdI/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1NbYg1vZwJ9b0tdpAZ9pr6VxhcYOGSNNQRRO+c0BBD3S3TB5y3oDforKaz1W8Qkfkzb5PhS4/JD39umDvD77t6qK9OMe5+F+hAG6NvIE1sJ29/36xwx53sD0rBlmGRsAWnhUe+frRk7JQRd+WYyODTDanaoIU9obSB4IOk3+nsniiXY4LL6Uaw6JYTJxwGacGzHfllr2AgfMbilwbsUWVZVO7nyxZBhMh4hg1x2kD1dpUOGNfIdJqQ7Y9iAn7la5qku8A+TiqEPIKB1mmFjcWe/PEK9nuHy676WpZp4S1nAlI1dnHPGDI1UwToZs8pQ7JJuai5E8Jggc7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BBF34076-B3A7-4B73-8B7C-34A8D3EF3F21|2026-08-10T16:26:07|STA0903206B9|KmTWZzZDoGgG5hZBzSuiR1XjeoPRzdW+o1JjGubpu3PKAq9JUzpyq+r8wHsgt70nfdQ79DzXwzyP2qJ6KgmwgcY0DxPGULutnHpAgo4zJ+8AA8sKyU3rV197298plhdA+LNzjypElapYz+7Gjym7XHjoCnEdi9YPHM5+WUllknGpHfNK949apWC1Gjg/mqQ1bvBOA0wdQMjcoLajIRULRTLAS6uJe1158wi5jTeB/obxVPxnKnfmq1ct5PZQn9P2Mgtjg6DtxcdjWk+wdbi823AIY67gp5MRLJ8imRj46h5W+VIRRHTrJUXz1qD6NKRcRkPhnfjqKdI/g=|00004000000711762511||

Rothxana Y. Acosta R

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Página 1 de 1




Versión 4.5.1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AORR790910815	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BBF34076-B3A7- 4B73-8B7C- 34A8D3EF3F21	2026-08- 10T15:15:59	2026-08- 10T16:26:07	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$439,653.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ROTHXANA Y. ACOSTA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Los Mochis, Sinaloa., a 30 de mayo de 2026

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$676,960.40 (Son: Seiscientos Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta pesos 40/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN- 012/2026	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2026	56	614964	1235/4/9/911/9303

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
TESORERÍA MUNICIPAL
DE AHOME
C.c.p. LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.

1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA			
	DOMICILIO	Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
	CIUDAD:	CULIACAN	ESTADO:	SINALOA.	TELEFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2026.	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026			\$763,936.09
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD			IMPORTE DE LA OBRA
	PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			\$676,390.72
				AÑO 2026.

BUENO POR: \$422,161.11

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: \$422,161.11

(Son: Cuatrocientos Veintidos Mil Ciento Sesenta y Un Pesos con 11/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 06 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026.

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$379,012.04	\$583,095.45	
I.V.A. 16%:	\$60,641.93	\$93,295.27	
SUMA:	\$439,653.97	\$676,390.72	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35%:		\$236,736.75	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$11,661.91	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$5,830.95	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$254,229.61	
IMPORTE A PAGAR:		\$422,161.11	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 04 DE AGOSTO DE 2026.			

RECIBI

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR: \$439,653.97

IMPORTE A PAGAR: \$422,161.11



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)

OBRAS:	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026
		CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
	PERIODO DEL :	06 DE JULIO DE 2026.	AL 04 DE AGOSTO DE 2026.
		FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2026.
NO.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN
1 (UNO) (012AH26PR)	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		\$583,095.45
ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA		CLAVE	
MONTO DE LA OBRA	(012AH26PR)	\$676,390.72	
MONTO ESTIMADO	(012AH26PR)	\$676,390.72	
MONTO POR CANCELAR	(012AH26PR)	\$0.00	
MONTO DEL ANTICIPO	(012AH26PR)	\$236,736.75	
MONTO AMORTIZADO	(012AH26PR)	\$236,736.75	
MONTO POR AMORTIZAR	(012AH26PR)	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$267,377.63	SUBTOTAL \$0.00 \$583,095.45
		I.V.A.	\$0.00 \$93,295.27
ESTIMACION	1 (UNO) (012AH26PR)	\$236,736.75	TOTAL \$0.00 \$676,390.72
TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:		\$236,736.75	
IMPORTE DE ESTIMACIÓN:		\$676,390.72	Son: Seiscientos Setenta y Seis Mil Trescientos Noventa Pesos con 72/100 M.N.)
ESTADO CONTABLE	CONTRATO	ANTICIPO	CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO	\$763,936.09	ANTICIPO OTORGADO	\$267,377.63
ESTIMADO A LA FECHA	\$676,390.72	AMORTIZADO A LA FECHA	\$236,736.75
SALDO POR ESTIMAR:	\$87,545.37	SALDO A AMORTIZAR	\$30,640.88
GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$254,229.61			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>CONFORME</p>  <p>C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA CONTRATISTA</p> </div> <div> <p>REVISÓ</p>  <p>ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA</p> </div> <div> <p>AUTORIZÓ</p>  <p>ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p> </div> </div>			



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

<div>  <div> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> <div>  <div> ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) HOJA 1 DE 1 </div> </div> </div>									
OBRA: (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
						CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
PERIODO DEL: 06 DE JULIO DE 2026						AL	04 DE AGOSTO DE 2026.		
						FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2026.		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO								
01	LUMINARIAS								
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1 DE 1	76	76	0	76	\$7,664.77	\$582,522.52
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1 DE 1	1	1	0	1	\$572.93	\$572.93
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$583,095.45
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$583,095.45
IVA									\$93,295.27
TOTAL									\$676,390.72

CONFORME

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

REVISÓ

[Firma]

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONINANT
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


[Firma]

ROQUE SUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME												GENERADORES	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA												HOJA 1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												DE 1	
ESTIMACION No. # 1 (UNO)													
OBRA:		(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:		FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	
										CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2026.	
											TOTAL	OBSERVACIONES	
1	RED DE ALUMBRADO												
01	LUMINARIAS												
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM 003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA											
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							76	76.00	76.00		
											1.00	1.00	

Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
CONTRATISTA

Adán Rogelio Rios Jimenez
Arq. Adán Rogelio Rios Jimenez



Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
PRESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)

001


SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA




DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA 1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE 1	
OBRA:	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									CONTRATO:	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026
										CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
PERIODO DEL : 06 DE JULIO DE 2026. AL 04 DE AGOSTO DE 2026.										FECHA:	04 DE AGOSTO DE 2026.
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	TOTALES					
1	RED DE ALUMBRADO										
01	LUMINARIAS										
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	76	76.00	0	76.00	0.00	\$7,664.77	\$0.00		
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	1.00	0	1.00	0.00	\$572.93	\$0.00		
SUBTOTAL DE LUMINARIAS									\$0.00		
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO									\$0.00		
SUBTOTAL:									\$0.00		
IVA:									\$0.00		
TOTAL									\$0.00		
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$676,390.72		
INVERSIÓN EJERCIDA:									\$676,390.72		
SALDO NO EJERCIDO:									\$0.00		

CONFORME

 C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
 ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
 CONTRATISTA

REVISADO

 ING. JESUS ERNESTO CASTRO
 RESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZADO

 ARO. JESUS ERNESTO CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
NOMBRE DE LA OBRA		(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	
FECHA		04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



01



02



03



04



05



06



07



08




09



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

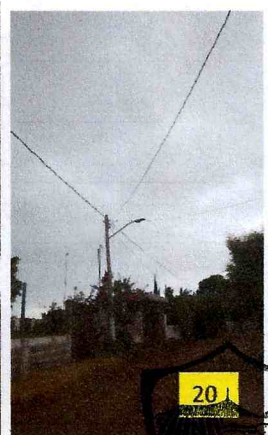

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA








AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

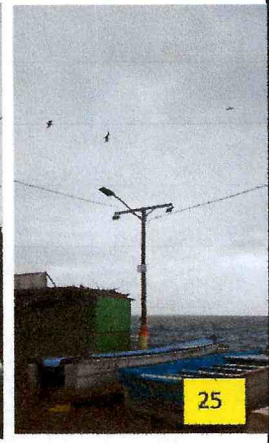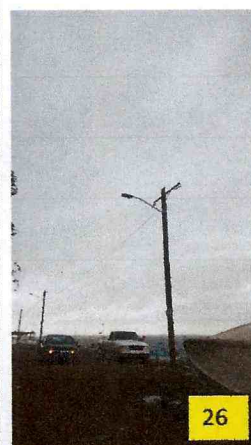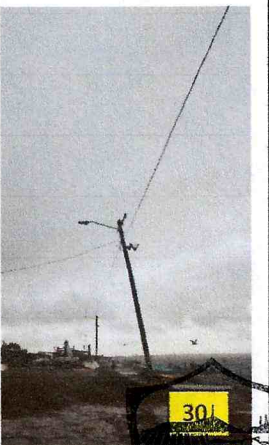

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

[Signature]
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

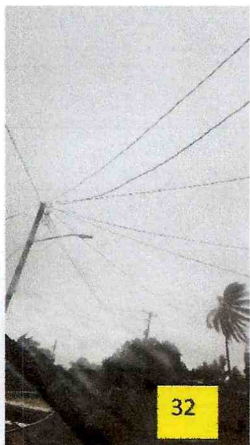

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RUESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS






AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra	
NOMBRE DE LA OBRA		(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	
FECHA		04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE:LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA,PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		




Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	
NOMBRE DE LA OBRA		(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	
NUMERO DE CONTRATO		FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026	
FECHA		04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		



61



62



63



64



65



66



67



68



69




70

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L 5FPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L 5FPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

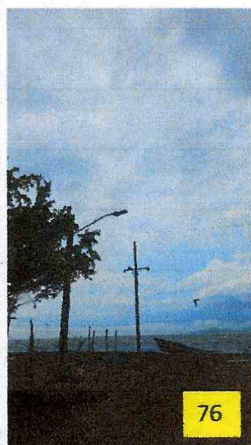


Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA			HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
UBICACIÓN:	LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
No. CONTRATO:	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 763,936.09	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FAISMUN-005/2026 Y FAISMUN-012/2026 ambos de fecha 30 de mayo de 2026. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluida en el Programa Anual de Inversión en Obra Pública 2026 con número O-102 y O-109. Y aprobada para su ejecución mediante oficio con número AHO/PRES/115/2026 y AHO/PRES/120/2026 ambos de fecha 30 de mayo de 2026.	
MONTO DE LA OBRA:	\$ 676,390.72		SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	15 DE JUNIO DE 2026.	REAL:	06 DE JULIO DE 2026.	
FECHA DE TERMINO:	14 DE JULIO DE 2026.	REAL:	04 DE AGOSTO DE 2026.	
DATOS DEL CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
DOMICILIO:	Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
TELÉFONOS:	(667) 258 3826			
TIPO DE TRABAJO:	LUMINARIAS			
REPRESENTANTE:	C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:				
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME		
1.- C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		
2.- FRAIRE VILLEGAS JESUS M. SUPERINTENDENTE				
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:				





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

1

UBICACIÓN:

LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ,

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

06/07/2026

APERTURA

CON ESTA FECHA SE DECLARA ABIERTA
ESTA BITACORA DE LA OBRA (012AH26PR)
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO
DE AHOMÉ, SINALOA


CONTRATO:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.

SUPERINTENDENTE



ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

2

UBICACIÓN:

LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	09/07/2026 TRABAJO (25 PZA)	SUMINISTRO Y COLOCACION CON GRUA DE 25 LUMINARIAS LED PROMETEO 80W 100-277V, 12,800 LUMENS, CON SUPRESOR DE PICO 10KV, FOTOCELDA, BRAZO DE 1.80m. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS
1	17/07/2026 TRABAJO (25 PZA)	SUMINISTRO Y COLOCACION CON GRUA DE 25 LUMINARIAS LED PROMETEO 80W 100-277V, 12,800 LUMENS, CON SUPRESOR DE PICO 10KV, FOTOCELDA, BRAZO DE 1.80m. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.

SUPERINTENDENTE



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

3

UBICACIÓN:

LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,

CONTRATISTA:

ROTHXANA YANETH ACOSTA RÍESTRA

CONTRATO:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	27/07/2026 TRABAJO (26 PZA)	SUMINISTRO Y COLOCACION CON GRUA, DE LUMINARIA LED PROMETEO, 80W 100-277V, 12,800 LUMENS, CON SUPRESOR DE Picos 10KV, CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.80m, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CATALOGO DE CONCEPTOS.
	04/08/2026 ESTIMACION	CON ESTA FECHA SE PRESENTA ESTA ESTIMACION PARA SU REVISION Y TRAMITE DE PASO, CON UNA CANTIDAD DE: \$ 676,390.72
	CIERRE	CON ESTA FECHA SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA DE LA OBRA (012AH26PR) CONTRATO: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

Fraire Villegas Jesus M.

FRAIRE VILLEGAS JESUS M.

SUPERINTENDENTE



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Ing. Alejandro Gonzalez Connant

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT

RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA		
NOMBRE DE LA OBRA	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES,		
	SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026		
FECHA	04 DE AGOSTO DE 2026.	ESTIMACIÓN NO.	1 (UNO)


UBICACIÓN	COORDENADAS
LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	25.667048°, -108.989328°




Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro Gonzalez Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA





CONTRATO:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

DATOS DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE AHOME
LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

NOTAS GENERALES

- COTAS EN METROS
- NIVELES EN METROS
- NO SE TOMARÁN COTAS A ESCALA DE ESTE PLANO
- LAS COTAS INDICADAS SON A PISO DE ALBANILERIA
- TODAS LAS COTAS Y NIVELES DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA POR EL
CONTRATISTA
- CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERÁ CONSULTARSE CON LA DIRECCIÓN DEL
PROYECTO ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN QUE EL PROPIO CONTRATISTA DE
AL DISEÑO

MODIFICACIONES

NUM	COMENTARIO	FECHA

FIRMAS Y SELLOS

Rothxana V. Acosta

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
CONTRATISTA

Alejandro González Connant
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RECIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
REVISOR

NOMBRE DEL PROYECTO

(012AH26PR) REHABILITACIÓN
DE RED DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN LA LOCALIDAD
PAREDONES, SINDICATURA
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

CONTENIDO DEL PLANO

- PLANO DE OBRA TERMINADA

FECHA:
AGOSTO 2026 01

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: CAMPO GUADALUPE ESTRADA Y PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: 1).- (005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y 2).- (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026)-1

CONTRATISTA: ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$763,936.09 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y LA CIUDADANA ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, CELEBRARON "EL CONTRATO PRINCIPAL" IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 03 DE JULIO DE 2026, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 06 DE JULIO DE 2026.



III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 03 DE JULIO DE 2026

ELABORÓ Y REVISÓ




**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte la ciudadana **ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 12 de junio de 2026, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: 1).- (005AH26PR) **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; y 2).- (012AH26PR) **REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

CP

Rothxana Y. Acosta R.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 15 de junio de 2026 y a terminarlos a más tardar el día 14 de julio de 2026, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL: \$658,565.60 (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)
I.V.A. (16%): \$105,370.49 (SON: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 49/100 M.N.)
TOTAL: \$763,936.09 (SON: SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.)

I.6.- Se otorgo el anticipo a "EL CONTRATISTA" al que por Ley tiene derecho, con fecha 03 de julio de 2026.

I.7.- Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Diferimiento, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de los trabajos.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de la obra que se encuentra en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de los trabajos, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de los trabajos.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de la obra contratada, quedando de la siguiente manera:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
		INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
1	(005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
		15 de junio de 2026	14 de julio de 2026	06 de julio de 2026	04 de agosto de 2026
2	(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
		15 de junio de 2026	14 de julio de 2026	06 de julio de 2026	04 de agosto de 2026

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente Convenio de Diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio de Diferimiento, continuaran vigentes todas las estipulaciones de "EL CONTRATO PRINCIPAL".

QUINTA. - El presente Convenio de Diferimiento comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por "LAS PARTES" que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de tres testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día 03 de julio de 2026.

Por "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

Por "EL CONTRATISTA"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

Rothxana Y. Acosta R.
C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

TESTIGOS:

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PAEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

MARÍA LUISA GÓMEZ LIZÁRRAGA
SÍNDICA PROCURADORA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte la ciudadana ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, celebrado con fecha 03 de julio de 2026.



ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra

LOS MOCHIS, SINALOA A 06 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO A USTED Y MANDARLE UN CORDIAL SALUDO REFERENTE A EL CONTRATO:

N°. FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

CON EL NOMBRE DE:

(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ESTOY SOLICITANDO UN DIFERIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 15 DE JUNIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRAZO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2026.

FECHA DE TERMINO: 04 DE AGOSTO DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Rothxana Y. Acosta R.

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra
DIRECTOR GENERAL

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1082-26

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificaran a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato número: **FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.**, mismas que se detallan a continuación: **(005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del: **03 de julio del 2026**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(005AH26PR)-(012AH26PR)	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	15/06/2026	06/07/2026
Fecha de termino:	14/07/2026	04/08/2026
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Rothxana Y. Acosta R
14 JUL 2026



C.C.P. ROTHXANA YANETH ACOSTA Riestra/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/AARF



SERSO CONSTRUCCIONES

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA, A 03 DE JULIO DE 2026.

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE SE RECIBIO EL 35% DE ANTICIPO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME FUE EN LA FECHA DEL 03 DE JULIO DE 2026, DE LAS OBRAS QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

- 1).- (005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
 - 2).- (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
- CONTRATO No. FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

< Detalle de movimiento

Spei recibido banorte

03 julio 2026, 17:50 h

\$267,377.63

Regresar al inicio

Compartir

Motivo de pago	Pago obra fissa
Importe	\$ 267,377.63
Normativa e convenio	Municipio De Ahome
Banco de pago	BANORTE
Cuenta de pago	072731013467366908
Normativa e procedimiento	Acosta Riestra Rothxana Yaneth
Referencia de pago	30726
Código de pago	6846AFR120260703 5497771209
Folio de expedición	019872550 072

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SALUDARLO.

ATENTAMENTE:

Rothxana Y. Acosta R.

LIC. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL



VARSOVIA No. 2130 – B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016

CULIACÁN, SINALOA. TELÉFONO: 667-243-9676

EMAIL: rothxana.yaneth79@gmail.com



SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

VARSOVIA No. 2130 - B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016
CULIACAN, SINALOA TELÉFONO: 667 - 387 - 06 - 12.
EMAIL: rothxana.acosta79@gmail.com

FECHA DE PRESENTACION: 06 DE JULIO DE 2026

OBRA:
(012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINO: 04 DE AGOSTO DE 2026
DURACION: 30 DIAS NATURALES

Reprogramacion de Obra de Montos								
NO. DE ACTIVIDADES	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE INICIO	Duración	FECHA DE TERMINO	Año 2026 01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
	- (012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			06/Jul/2026	30c	04/Ago/2026	\$ 522,155.61	\$ 60,939.84
1	- RED DE ALUMBRADO			06/Jul/2026	30c	04/Ago/2026	\$ 522,155.61	\$ 60,939.84
01	- LUMINARIAS			06/Jul/2026	30c	04/Ago/2026	\$ 522,155.61	\$ 60,939.84
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA, CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR INCLUYE: LUMINARIA PROMETEO 80W 4K 2M MV 24L SFPOTENCIA 80W, TCC 4000K, FOTOMETRIA T-2M, EFICIENCIA 160 LM/W, 12,800 LUMENES MULTIVOLTAJE 100-277V, SUPRESOR 10KV, ABRAZADERA, PROTECCIÓN IP66 E IK10, 10 AÑOS DE GARANTIA CERTIFICACION: NOM-031; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001 INCLUYE BASE DE 3 PINES Y FOTOCELDA MULTIVOLTAJE MR, BRAZO METALICO DE 1.80 MTS. DE LARGO Y 2" DE DIAMETRO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	76.00	PZA	06/Jul/2026	30c	04/Ago/2026	\$ 521,843.10	\$ 60,679.42
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00	PZA	29/Jul/2026	7c	04/Ago/2026	\$ 312.51	\$ 260.42

Rothxana Y. Acosta R.

C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL





SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

VARSOVIA No. 2130 - B COL. LOMAS DEL SOL C.P. 80016
CULIACÁN, SINALOA TELÉFONO: 667 - 387 - 06 - 12.
EMAIL: rothxana.acosta79@gmail.com

FECHA DE PRESENTACION: 06 DE JULIO DE 2026

OBRA:

(012AH26PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 04 DE AGOSTO DE 2026

DURACION: 30 DIAS NATURALES

Reprogramacion de Obra de Montos

Reprogramación de obra de inversión								
NO. DE ACTIVIDADES	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	CANTIDAD	UNIDAD	FECHA DE INICIO	Duración	FECHA DE TERMINO	Año 2026 01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago
TOTAL PARCIAL:							\$ 522,155.61	\$ 60,939.84
TOTAL ACUMULADO:							\$ 522,155.61	\$ 583,095.45

Rothxana Y. Acosta R.

C. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A

12 DE JUNIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.


CEDULA PROFESIONAL:
No. 6768269

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

Fraire Villegas Jesus M.

ING. JESUS MANUEL FRAIRE VILLEGAS
SUPERINTENDENTE



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA


**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales,
Culiacán, Sinaloa.




SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

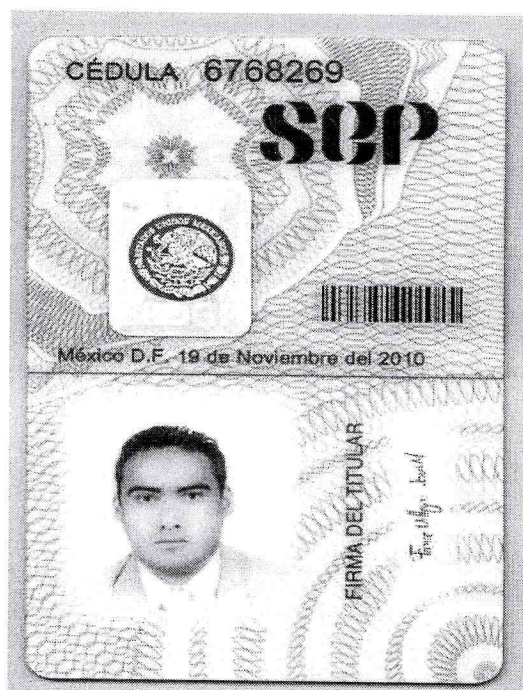

Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 12 de junio del 2026.

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
PRESENTE.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de las siguientes:

(005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

Fecha: 12 de junio de 2026.


Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA/Contratista
C.c.p.- Ing. Alejandro González Connant/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF


12 JUNIO 2026

Roberto Y. Acosta R.
12/06/26



SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A 06 DE JULIO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

OFICIO DE INICIO DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **INICIO** DE LA OBRA EMPEIZA REALIZARSE EN LA FECHA DEL **06 DE JULIO DE 2026**.

EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL





H. Ayuntamiento de Ahome

Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología

Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1078-26.

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 08 de julio de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026, consistentes específicamente en: (005AH26PR) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD CAMPO GUADALUPE ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA, con un importe total de hasta: \$ 763,936.09, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2026).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(005AH26PR)-(012AH26PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
06/07/2026	04/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Rothxana Y. Acosta R.
14/JUL/2026

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga /Sindica Procuradora
c.c.p. ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx





SERSO CONSTRUCCIONES
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA

LOS MOCHIS, SINALOA A 04 DE AGOSTO DE 2026.

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

FINAL DE OBRA

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL **FINAL** DE LA OBRA EMPEZ'A REALIZARSE EN LA FECHA DEL **04 DE AGOSTO DE 2026**.
EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO N°:

FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Rothxana Yaneth Acosta Riestra
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
DIRECTOR GENERAL



Calle Varsovia #2130 B, colonia Lomas del Sol, entre calle Paris y calle Londres, código postal 80016, Localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA	POSITIVO
RFC	Folio
AORR790910815	26NH4667644
Fecha y hora de emisión	
05 de agosto de 2026 a las 13:52 horas	

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.


Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Rothxana Yaneth Acosta R.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



Cadena Original

||AORR790910815|26NH4667644|05-08-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

KKckFHEAEG0+r9xAqrWANugWyWh6MrzMLkPZ/lcobAwtpklJOt9PXXEUX3AbQsCBfIA2QCwAHo1VG1SsF7di8OByc
O6XyYMIWCiv2P9HhmgXifxhhDqcdnTlfN9sY3S3+H/LV61rBb4pF6qarDB/DsY+uakXq60yQHLAa6vyKpO5HDed4F
Wqu4feGrRHfA6k8OYXmUMH.JqAE0KPvgLXDv7gSY31QIhYIPXwnO7gMg6K+EyYQTneop6tmRBFcyIQ+2/GPRn1gyL
85k8iR5WYj2TIm6c25GGKTRNZPwEt/aYSoFCBBtlqgd5eiks7fhBYBdX5VSu4k5knrZDtIA==



**Gobierno de
México**

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2026-0087


Los Mochis, Sinaloa, 8 de junio de

C. ACOSTA RUESTRA ROTHXANA YANETH, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al comentar
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

LIC. SERGIO RAMÓN VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**



Cadena de Seguridad
XH+RMkmykG4axYFTbXFwsIVQFHw=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1327-26

Asunto: El que se indica

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 12 de agosto de 2026.

C. PAVEL ROBERTO CASTRO FÉLIX
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-


Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 04 de agosto de 2026, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día lunes 17 de agosto de 2026 a las **11:00 a.m.** horas.

Se anexa croquis de localización.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.C.P.- Joaquín Paez Roiz/Secretaría de Bienestar
C.C.P.- María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
C.C.P.- Rothxana Yaneth Acosta Riestra/Contratista
C.C.P.- Ing. Alejandro Gonzalez Connant/Residente De Obra
C.C.P.- Archivo
JETC/AARF

**UBICACIÓN: LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**



FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.

**(012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD
PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

COORDENADAS: 25°40'00.6"N 108°59'21.9"W



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra : (012AH26PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Localidad	PAREDONES, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Municipio	AHOME
Num. De contrato	FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026.
Contratista	ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA.
Importe de la obra	\$676,390.72
Anticipo entregado	\$236,736.75
Fianza de anticipo	2741143-0000, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
Fianza de cumplimiento	2741147-0000, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
Inicio de los trabajos	06 DE JULIO DE 2026
Termino de los trabajos	04 DE AGOSTO DE 2026
Plazo de días de ejecución de la obra	30 DIAS

En Los Mochis Sinaloa siendo las: 11:00 horas del día 17 de AGOSTO del 2026
Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO Director de Obras públicas

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT Residente de Obra

ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA. Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO) (012AH26PR)	06/07/2026	04/08/2026	\$676,390.72	\$676,390.72	\$422,161.11	\$422,161.11
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGO EL CONTRATISTA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

Rothxana Y. Acosta R
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA.
CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
Residente de Obra



in:sent X [icon] ? [icon] Actua

Cualquier momento Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

- ☒ Para: administrac. ... 8:57 p.m.
Contrato Num. FAISMUN-ALP-005PR...
F258 - Est. 1 Loc. Paredones
- ☐ Para: administrac. ... 7 ago
Captura de Pantalla
- ☐ Para: administrac. ... 7 ago
CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-042PR...
F-257 ANTICIPO 35%
- ☐ Para: administrac. ... 30 jul
Captura de Pantalla
- ☐ Para: administrac. ... 30 jul
CONTRATO NO. FAISMUN-002CP-2026
EST. 1 (UNICA) ROMANILLO
- ☐ Para: administrac. ... 7 jul
Captura de Pantalla
- ☐ Para: administrac. ... 7 jul
CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-022PR...
F-253 ANTIPO 35% (022AH26PR)
- ☐ Para: administrac. ... 2 jul
Captura de Pantalla
- ☐ Para: administrac. ... 2 jul
Captura de Pantalla ad
- ☐ Para: administrac. ... 3
CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-005P...

Contrato Num. FAISMUN-ALP-005PR-012PR-AH-2026

ROTHXANA YANETH AC... 3:52 p.m. (hace 0 minutos)
para administracion.obras, facturas, egresos, ramonleal_13, aaronrf1119
F258 - Est. 1
Loc. Paredones

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

AORR790910815_... AORR790910815_...

F258_Verificación...

Responder Responder a todos Reenviar

