

OFICIO No. OPDUyE/719/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 04 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,479,178.58 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$ 759,183.54 (SETECIENTOS CUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 729F, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA
04 DIC 2025
06:07 PM
RECIBIDO

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MSA650101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 1,479,175.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 1,048,596.04 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 367,008.61 TOTAL: \$ 681,587.43 (+) MAS 16% IVA: \$ 109,053.99 TOTAL: \$ 790,641.42 DEDUCCIONES 3% SVFYC: \$ 31,457.88 SALDO LIQUIDO: \$ 759,183.54	681,587.43 002 - IVA - 109,053.99	681,587.43

CANTIDAD CON LETRA: (SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 42,100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO:

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$681,587.43
IVA 16%	\$109,053.99
TOTAL	\$790,641.42

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

5E98BF6C-A726-4097-8A44-B9E4F8C5729F

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 2 2025 - 12:31:00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S+TWUdFIRkGh+8HY3u1yoCKOSCFmhcSOZBhNgcvgt098Bz4Fa0HwMMR+03Dymb4toOSFwGEj4+8IUqHNS4M9EH2303gPK
hJyPHADvYk3RkUQZ7CMwDwEmuQH16CE+63e66uAOAn7QRLYME4v+H8nXpHs594LIF2OIH2p5+Ro9HD4caTeDUS3xWMIF
MWmp5XN0IAWJ7y2hP4QqbOSuZmvLOS9PFBCEv5aefqPXy65TEVhBSvzZHO2wIHkqTERZBbngXkyt5aEOeM+HRR7/G6at
1nBgtT2PqKjy2K+wg5uwywNDCRUhKOBdxhZFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E98BF6C-A726-4097-8A44-B9E4F8C5729F|2025-12-02T12:31:00|MAS0610247C0|S+TWUdFIRkGh+8HY3u1yoCK
OSCFmhcSOZBhNgcvgt098Bz4Fa0HwMMR+03Dymb4toOSFwGEj4+8IUqHNS4M9EH2303gPKhJyPHADvYk3RkUQZ7CM
wDwEmuQH16CE+63e66uAOAn7QRLYME4v+H8nXpHs594LIF2OIH2p5+Ro9HD4caTeDUS3xWMIFMWmp5XN0IAWJ7y2hP4QqbO
SbZmvLOS9PFBCEv5aefqPXy65TEVhBSvzZHO2wIHkqTERZBbngXkyt5aEOeM+HRR7/G6at1nBgtT2PqKjy2K+wg5uwyw
NDCRUhKOBdxhZFw==|00001000000709182898||

SELLO DEL SAT

YPhsITyC6IHLE9+u0VNlKOJmIR5Hy1w5KNDiCHUHzY5g3vN8XSS7nZG4MTXjFDIdqVVR8D3cN3NO2jaNohj376NAXZAV
nKA13jCgQjY41NwLHDmWbipp2ZQghvn4gdNOaxDloGvBUQjGHZ/Y94f5eC57cwCX8ZmjDR0+BR4+2Xygvwpzq01jh8guedJ
5aboueF/OePWX4kqWuIOGlo9mMzmgd1JdFwydL95YrvfOWimMn82Vp+7vdeZ7abnLzHmx7Nrk0k4gTAcBSC82RkEN3F
A30qSgnANWIGqT35VWU1bbOLFgWERdH4cqnCq6fW==

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT

00001000000709182898

SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000701105484



Debe (mos) y pagare (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. (790,641.42 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si este pagare no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5 % mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="153" Fecha="2025-12-01T11:35:58"
SelLo="S+TmUdFtI8Kgt+9HY3uJyOCkOSCFmhCSOZBhNgCvgt08IBz4Fz08HmHR+03DymbdA00SPfZw/GEj4+8BUfqbIS4f9EH23jgPrKhJ3PPhAD0V4K13RKfK1Q2I7cMwDwEmuQh1GcE+93e96ufA0C4n7QfLxMIEAv+H8nXpHS594LIF20IH2p5+R09HD4catEDUS3X
FormaPago="99" Nocertificado="00001000000701105484"
Certificado="M1G6ZCCBA+gAWIBAgLUMDAWMDAMDA3MDEXDUD00QdYJk0zIhvcNAQELBQAwgGVMtUwMwYDVQDDCxBQBERNUNGU0VSVA1DSU8gREUgQUJNSUS1UR5QUJNT04gVFJ0Q1VUQVJ0Q1EUMCgAUECgwwLU0vSVk1DSU8gREUgQUJNSUS1UR5QU
SubTotal="681587.43" Moneda="MXN" Total="790641.42" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271"
<cfdi:Emitor RegimenFiscal="626" Rfc="SC03051915" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="WB850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsocFDI="101"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="8101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO
AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-
FAISMUM-021/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 1,479,178.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 1,048,596.04 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 367,008.61 TOTAL: $ 681,587.43 (+) MAS 16% IVA: $ 109,053.99 TOTAL: $
790,641.42 DEDUCCIONES 3% SVFYC: $ 31,457.88 SALDO LÍQUIDO: $ 759,183.54" ValorUnitario="681587.43" Importe="681587.43" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="681587.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="109053.99" Base="681587.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="109053.99">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.160000" Importe="109053.99" Base="681587.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/timbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalV1.xsd" Version="1.1" UUID="5F88BF6C-A726-4097-9A44-B9E4F8C5729F" FechaTimbrado="2025-12-02T12:31:00"
SelLoCfd="S+TmUdFtI8Kgt+9HY3uJyOCkOSCFmhCSOZBhNgCvgt08IBz4Fz08HmHR+03DymbdA00SPfZw/GEj4+8BUfqbIS4f9EH23jgPrKhJ3PPhAD0V4K13RKfK1Q2I7cMwDwEmuQh1GcE+93e96ufA0C4n7QfLxMIEAv+H8nXpHS594LIF20IH2p5+R09HD4cat
Nocertificado="00001000000701105484"
SelLoSAT="YPhbsfTYC0/HLB8+n0WV1KOJmIR3Hy4wSKMdlCHUHzv5g3vNBX5SfTnzG4MTXjFDkdqVVRlJd3cN3A102jajNoHrJ376NAXZAVr1KA13jGtDjY41mWlHdmhb1pP2Z0ghvrt4gndNoXD1o6vBUJGHZ/1Y94f58c57cWcX8ZmjDR0+BR4+2XygvswpZqr
</cfdi:Complemento>
```



CONSTRUCTORA

Fecha: 20-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
TELÉFONO: 0 CEL: 6681861376
R.F.C. SCO-230519-155

ESTIMACIÓN No: 01 (NORMAL)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 10-nov-25

AL 20-nov-25

FECHA DE CONTRATO:

07-nov-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 10-nov-25

TERMINACIÓN: 01-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$1,275,153.95

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$1,479,178.58

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$517,712.50

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$1,479,178.58

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 759,183.54 (SON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.)

BUENO POR: \$ 759,183.54

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (NORMAL)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 367,008.61

MAS I.V.A.:

\$ 58,721.38

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 425,729.99

3 % SVIFYC:

\$ 31,457.88

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 457,187.87

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 1,048,596.04

MAS I.V.A 16 %

\$ 167,775.37

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 1,216,371.41

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 457,187.87

SALDO A PAGAR:

\$ 759,183.54

ELABORO

CLARA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimacion:
Fecha: 20 de noviembre de 2025				01 (NORMAL)
Periodo de la estimacion: 10/11/2025 al 20/11/2025	Localidad: BADIRAGUATO		No. De contrato: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025	
Periodo de Ejecución: 10/11/2025 al 01/12/2025				
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,479,178.58	\$ 1,275,153.95	\$ 517,712.50	\$ 446,303.88	82%
				% Avance Total
				82%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,048,596.04	ESTA ESTIMACION
\$ 425,729.99	16 % I.V.A (+) \$ 167,775.37	\$ 1,216,371.41
	Sub- Total A (=) \$ 1,216,371.41	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 367,008.61	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 58,721.38	\$ -
	Total (=) \$ 425,729.99	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 681,587.43	TOTAL ACUMULADO.
\$ 425,729.99	16 % I.V.A (+) \$ 109,053.99	\$ 1,216,371.41
	Total (=) \$ 790,641.42	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 31,457.88	CONTRATADO
\$ 517,712.50	Total Deducciones (=) \$ 457,187.87	\$ 1,479,178.58
	Importe T O T A L \$ 759,183.54	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 759,183.54	SALDO
\$91,982.51	Son: (SON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.)	\$ 262,807.17

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



CONSTRUCTORA

FECHA

20/11/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,275,153.95			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$517,712.50			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,479,178.58			

OBRA	IMPORTE
1 PRELIMINARES	\$ 415,196.46
2 ESTRUCTURA	\$ 633,399.58

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 1,048,596.04

SUB TOTAL= \$ 1,048,596.04
I.V.A AL 16 % \$ 167,775.37
TOTAL = \$ 1,216,371.41

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 20/11/2025
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,479,178.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	717.67	\$ 20.17	\$ 14,475.40	699.21	0.00	0.00	699.21	\$ 14,103.07
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	394.72	\$ 131.78	\$ 52,016.20	384.56	0.00	0.00	384.56	\$ 50,677.32
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	717.67	\$ 34.35	\$ 24,651.96	699.21	0.00	0.00	699.21	\$ 24,017.86
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	717.67	\$ 195.24	\$ 140,117.89	699.21	0.00	0.00	699.21	\$ 136,513.76
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	717.67	\$ 226.69	\$ 161,970.94	699.21	0.00	0.00	699.21	\$ 157,804.70
GP06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HULE NEGRO PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	717.67	\$ 45.88	\$ 32,926.70	699.21	0.00	0.00	699.21	\$ 32,079.75
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 415,196.46
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	172.84	\$ 843.24	\$ 145,745.60	114.72	0.00	0.00	114.72	\$ 96,736.19

ELABORADO
C. ANA MARCELA ALVARADO E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISADO
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZADO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 20/11/2025
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,479,178.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	48.17	\$ 695.80	\$ 33,516.69	48.17	0.00	53.47	48.17	\$ 33,516.69
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	585.17	\$ 836.69	\$ 489,605.89	572.01	0.00	0.00	572.01	\$ 478,585.05
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	331.23	\$ 33.20	\$ 10,996.84	331.23	0.00	116.53	331.23	\$ 10,996.84
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	110.41	\$ 129.82	\$ 14,333.43	104.41	0.00	0.00	104.41	\$ 13,554.51
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	172.84	\$ 80.63	\$ 13,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 633,399.58

TOTAL ESTIMACION \$ 1,048,596.04
I.V.A. \$ 167,775.37
TOTAL \$ 1,216,371.41

ELABORÓ
C. ANA MARCELA ABADIA E.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

ING. RUBÉN RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.02	7.20			36.14		
			16.20	5.89			95.42		
			10.53	5.80			61.07		
			9.17	6.45			59.15		
			14.05	6.54			91.89		
			26.08	6.52			170.04		
			27.11	6.54			177.30		
			ÁREA TRIANGULO	8.20			8.20		
							TOTAL	699.21	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	5.02	7.20	0.55		19.88		
			16.20	5.89	0.55		52.48		
			10.53	5.80	0.55		33.59		
			9.17	6.45	0.55		32.53		
			14.05	6.54	0.55		50.54		
			26.08	6.52	0.55		93.52		
			27.11	6.54	0.55		97.51		
ELABORO									

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			ÁREA TRIANGULO	8.20	0.55		4.51		
							TOTAL	384.56	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	5.02	7.20			36.14		
			16.20	5.89			95.42		
			10.53	5.80			61.07		
			9.17	6.45			59.15		
			14.05	6.54			91.89		
			26.08	6.52			170.04		
			27.11	6.54			177.30		
			ÁREA TRIANGULO	8.20			8.20		
							TOTAL	699.21	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2				IGUAL AL CONCEPTO GP05:	699.21		
							TOTAL	699.21	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2			IGUAL AL CONCEPTO GP05:		699.21		
							TOTAL	699.21	
GP06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HULE NEGRO PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2			IGUAL AL CONCEPTO GP05:		699.21		
							TOTAL	699.21	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	20.61			1.00	20.61		LADO DERECHO
			11.76			1.00	11.76		
			8.83			1.00	8.83		
			14.87			1.00	14.87		
			26.32			1.00	26.32		
ELABORO									

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			27.14			1.00	27.14		
			3.82			1.00	3.82		LADO IZQUIERDO
			17.99			1.00	17.99		
			18.83			1.00	18.83		
			13.22			1.00	13.22		
			25.83			1.00	25.83		
			27.14			1.00	27.14		
			101.64			-1.00	-101.64		MENOS PATIN
							TOTAL	114.72	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	101.64			1.00	101.64		LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO
							TOTAL	101.64	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	48.17	
							ADICIONAL	53.47	

ELABORÓ

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.96	5.98			29.66		
			16.26	4.79			77.89		
			10.59	4.69			49.67		
			9.13	5.27			48.12		
			14.05	5.37			75.45		
			26.08	5.32			138.75		
			27.17	5.31			144.27		
			AREA TRIANGULO	8.20			8.20		
							TOTAL	572.01	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	106.83			1.00	106.83		LADO DERECHO
			109.53			1.00	109.53		LADO IZQUIERDO
			7.90			1.00	7.90		TRANSVERSALES
			6.68			1.00	6.68		
			6.25			1.00	6.25		
			5.82			1.00	5.82		

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			5.39			1.00	5.39		
			4.96			1.00	4.96		
			4.53			1.00	4.53		
			5.03			1.00	5.03		
			5.45			1.00	5.45		
			5.86			1.00	5.86		
			6.27			1.00	6.27		
			6.38			1.00	6.38		
			6.47			1.00	6.47		
			6.57			1.00	6.57		
			6.13			1.00	6.13		
			6.16			1.00	6.16		
			6.25			1.00	6.25		
			6.33			1.00	6.33		
			6.41			1.00	6.41		
			6.36			1.00	6.36		
			6.38			1.00	6.38		
			6.39			1.00	6.39		
			6.41			1.00	6.41		
			6.43			1.00	6.43		
			6.44			1.00	6.44		
			6.46			1.00	6.46		
			6.48			1.00	6.48		
			6.49			1.00	6.49		
			6.56			1.00	6.56		
			6.52			8.00	52.16		

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 7

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		447.76	
						ADICIONAL		331.23	
								116.53	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	104.41			1.00	104.41		
							TOTAL	104.41	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML				NO SE HA EJECUTADO	0.00		
							TOTAL	0.00	

ELABORÓ

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 4


CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA**
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

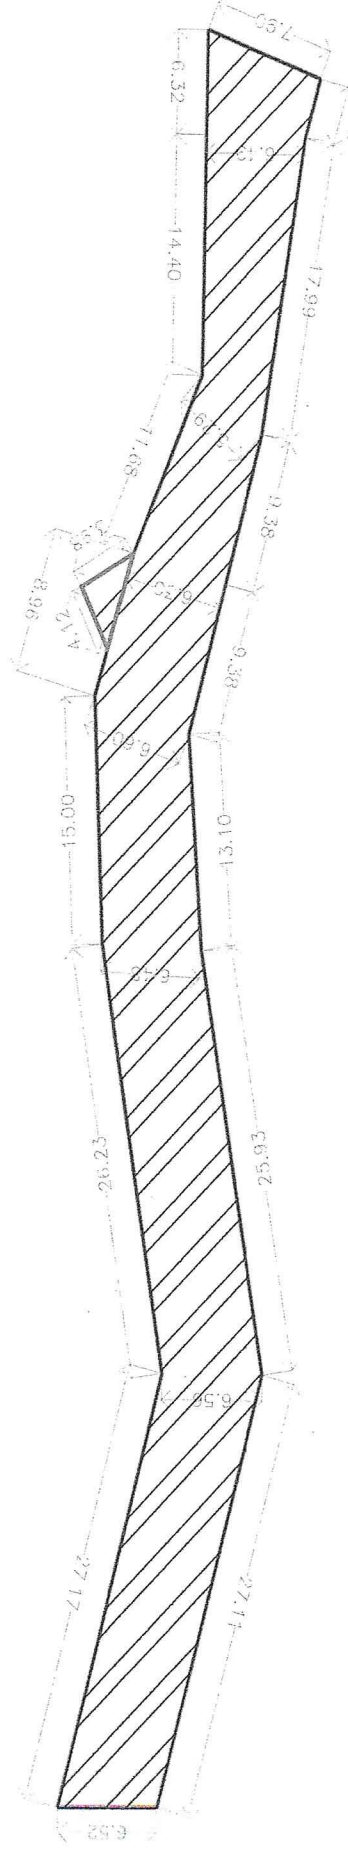

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA

S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 4

ESTIMACION: 01 (NORMAL)


ESTRUCTURA

GP08

GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088

PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

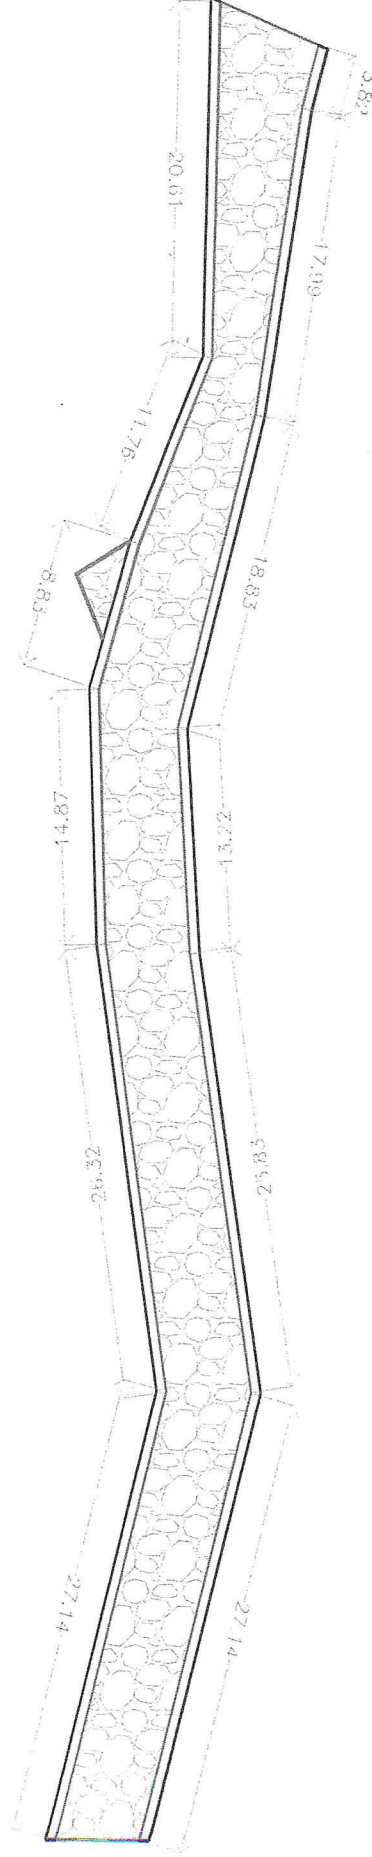

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA

S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.


3 de 4

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

GP56

EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

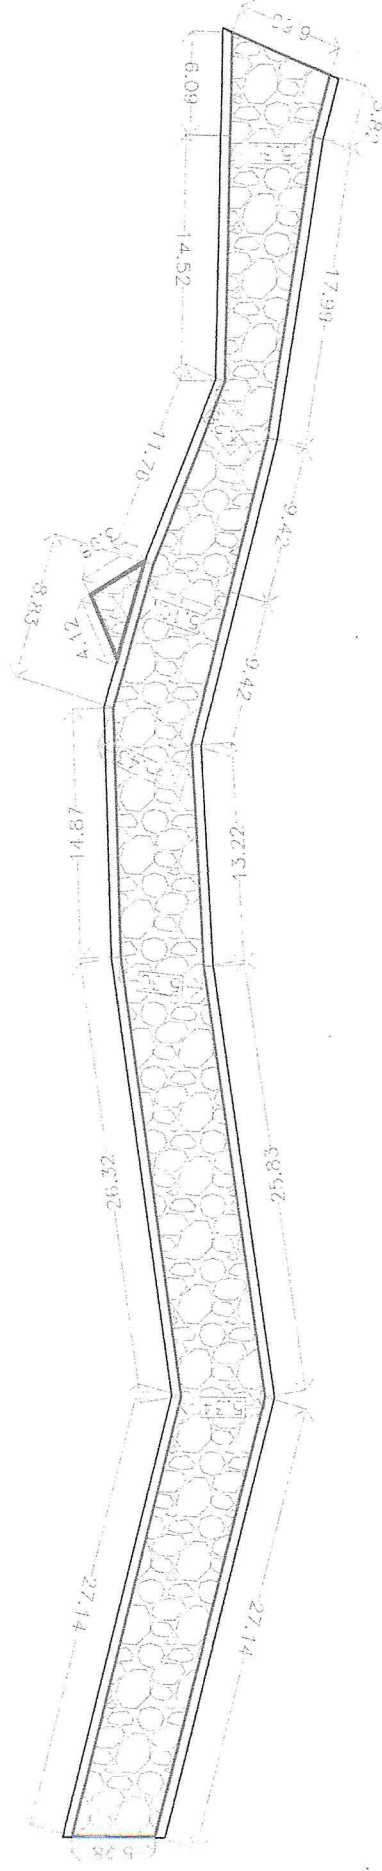

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.


OBRA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

GP15

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

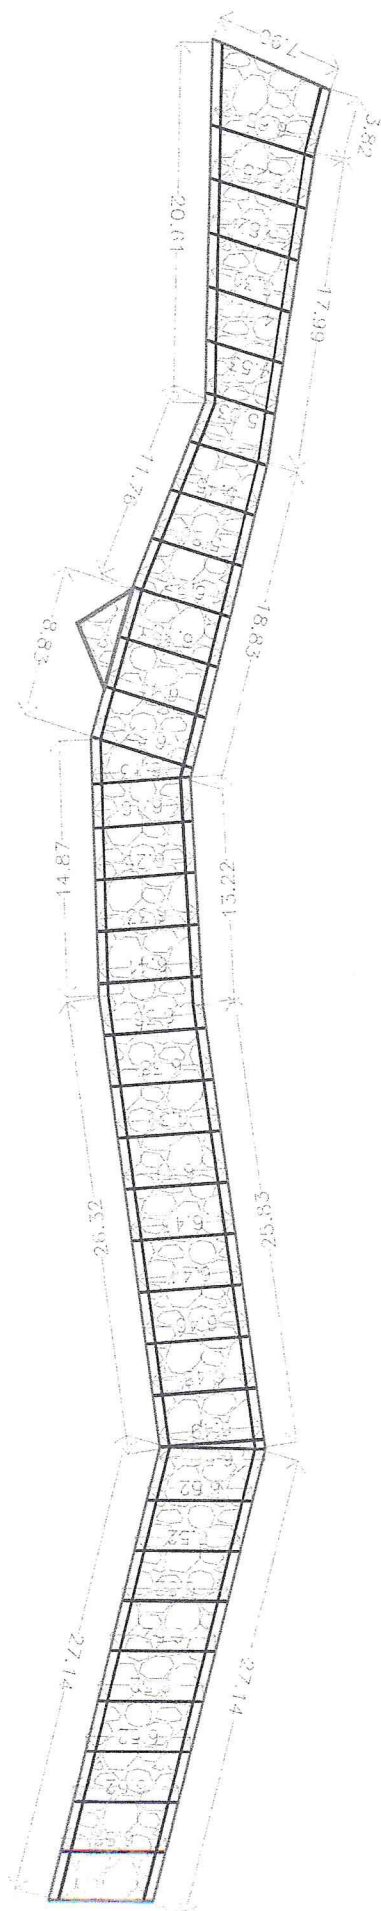

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCION

FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA

S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

1


PRELIMINARES

GP01

GP02

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.

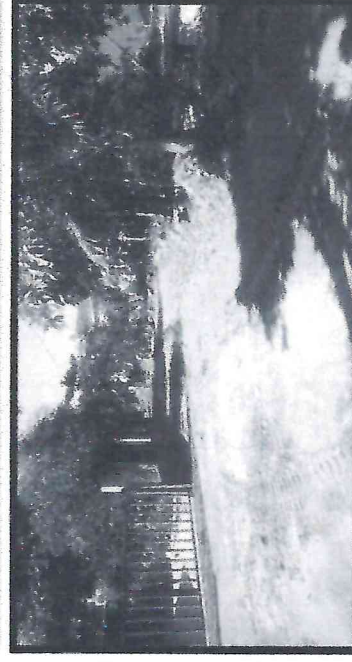

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA

S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

2 de 5

- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

3 de 5

2 ESTRUCTURA

GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

4 de 5

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

GP56

EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORO

ING. JESÚS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCTORA

FECHA: 20/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRAFICO



CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

5 de 5

- GP13. CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
- GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP11 PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

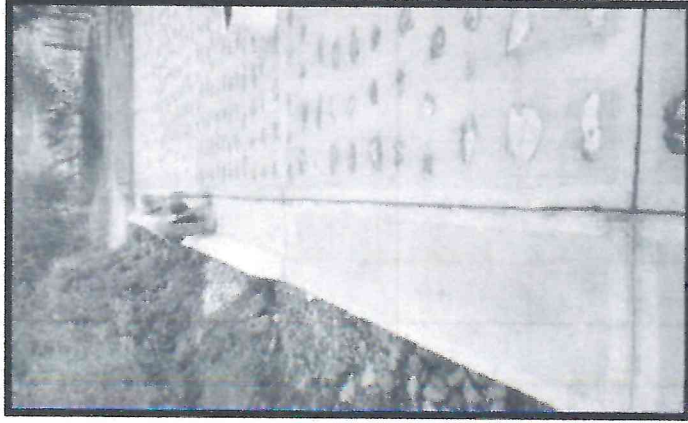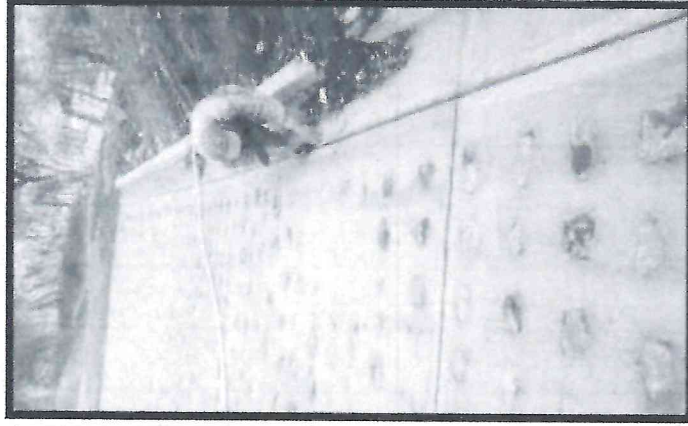

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:22:24 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NORM AD 021

Importe de la operación: 759,183.54 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030743900036659975

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATOTitular de la cuenta: SEIS ONCE CONSTRUCTORA S
DE RL DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 01 NORM AD 021

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:22:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000221544

Clave de rastreo: 002601002512110000221544

Folio de firma: 0069267051

Folio único: I401202512101922210069267057

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
