

OFICIO No. OPDUyE/769/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,479,178.58 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$ 115,061.34 (CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # CA20, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE



ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrian G
RECIBIDO
17:52

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBAR50101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 101 - Construcciones.		
CIUDAD:	Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 02 (NORMAL) Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGR-AD-FAISMUN-021/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 1,479,179.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 159,300.92 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 55,823.57 TOTAL: \$ 103,300.92 (+) MAS 16% IVA: \$ 16,528.15 TOTAL: \$ 119,829.07 DEDUCCIONES 3% SVFYC: \$ 4,767.73 SALDO LIQUIDO: \$ 115,061.34	103,300.92 002 - IVA - 16,528.15	103,300.92

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 00 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$103,300.92
IVA 16%	\$16,528.15
TOTAL	\$119,829.07

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

21051805-84DA-410D-A9D7-47A36235CA20

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 13 2025 - 13:13:03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X3leFneXNB7p5SMJRUUcQpX0n115K71iWTTJef9o1MKv5j4L3ItZNe3WHPgMAHcTJXvWwDHoTU5pgag7kknhggpus6Zq
s4HEUsRmxy7a8454VwWIKUpPgCIZ5dF9W6RuBcGwz+2bWMS+OZCDtS8KEZUJnLC4F0iQ1aPBMQhXV7NAJ+C17X4E+0jot
ssEQZmWAXMKURZ+PgCUH1bWRHdVpEB8Akyoi7v5yV5NYMValuR3ySsRLHpsWJRPVg2JHyF2HEH7JyU58f5vAO6ROSkv3KYUZr+A7qUSQq+LUEr
Gk3KYUZr+A7qUSQq+LUErGk3KYUZr+A7qUSQq+LUErGk3KYUZr+A7qUSQq+LUErGk3KYUZr+A7qUSQq+LUErGk3KYUZr+A7qUSQq+LUEr

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1121051805-84DA-410D-A9D7-47A36235CA20]2025-12-13T13:13:03[MAS0810247C0X3leFneXNB7p5SMJRUUcQpX
Xn115K71iWTTJef9o1MKv5j4L3ItZNe3WHPgMAHcTJXvWwDHoTU5pgag7kknhggpus6Zq+s4HEUsRmxy7a8454VwWIKU
PgCIZ5dF9W6RuBcGwz+2bWMS+OZCDtS8KEZUJnLC4F0iQ1aPBMQhXV7NAJ+C17X4E+0jotssEQZmWAXMKURZ+PgCUH1bWRHdVpEB8Akyoi7v5yV5NYMValuR3ySsRLHpsWJRPVg2JHyF2HEH7JyU58f5vAO6ROSkv3KYUZr+A7qUSQq+LUEr
bWRHdVpEB8Akyoi7v5yV5NYMValuR3ySsRLHpsWJRPVg2JHyF2HEH7JyU58f5vAO6ROSkv3KYUZr+A7qUSQq+LUEr
jGfEUQe13E10fKA==00001000000709182898]]

SELLO DEL SAT

HC9Phytz7BAoelWQyFAJ9C00eBf2eHa3N6N7n0CM543M4u6NYT52wpyMvoGpeX+hQA6KWFUc1qPNFUSNIZIKEL1f9
Xh0HYf4ugqosq8QUbDFWYy8RHyPdz2p1LQZzovfofMxBRK26x+JD4j2CAhM4bu7S2AugwSb0hRABqYB4R46Dfaj
rtesjAir9BK7umcDh5qXR/EizYoYY7gmunIDc7vTEalyAePvKaseVAMVDC6HLBbCZg64d0aK/A3QcHQqvwGGRqGSRbds
2adJpN5oiEVOd1DpUdLHTOU4dWwNnyUSRyjq==

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO

DEL SAT

00001000000709182898

SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000709182898



Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 07/100 M.N. M.N. (\$119,829.07 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagará domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5 % mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

```
<cfdi:xsi xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="157" Fecha="2025-12-
13T12:13:01"
Sello="X3TeFneXNBTFp5SMJrUUCQgXXN115/K71iWTtJe8o1MKVStj4L3tTdZn3W1PgMAHCJJXVVhr+DHoTUTSpgeg7loknh/grpue6Zqs+hEUs5Raxy7z8+54VwWiKlUPgC1251cF9wRuBcG
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGIzCCBA+gAwTBAGIUMDAWMDEWMDAMDA3MDEkMDUEOQDWQYJKOIzhvcNAQELBQAwwGCVMTUwMYDVQQDDCxRQy5ERUwglHVSVkIDBSUGREUgQUJRNUSU1URSQUNjOTQ4VFJ
SubTotal="103300.92" Moneda="MXN" Total="119829.07" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBAS0101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE
SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025 MONTO DEL
CONTRATO NETO: $ 1,479,178.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 158,924.49 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 55,623.57 TOTAL: $ 103,300.92 (+) MAS 16% IVA:
$ 16,528.15 TOTAL: $ 119,829.07 DEDUCCIONES 3% SVIFVC: $ 4,767.73 SALDO LIQUIDO: $ 115,061.34 ValorUnitario="103300.92" Importe="103300.92"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="103300.92" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16528.15"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16528.15">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16528.15" Base="103300.92"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="210518CS-04DA-410D-A9D7-
47A38235CA20" FechaTimbrado="2025-12-13T13:13:03" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SellocFD="X3TeFneXNBTFp5SMJrUUCQgXXN115/K71iWTtJe8o1MKVStj4L3tTdZn3W1PgMAHCJJXVVhr+DHoTUTSpgeg7loknh/grpue6Zqs+hEUs5Raxy7z8+54VwWiKlUPgC1251cF9I
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="HC9PhtynZ7BAo/atlkhyFAdSCID0cBF2aHa3jNgN7n0CM543tsus6fYT52wxpyMvoGpe/X+hGAe9KWUFicqPNFU5NILZjfKEL1f9XhbHYf4ugkqosoq8Q/tUNbOfJwCYa8Hyprf
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 01-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	ESTIMACIÓN No:	02 (NORMAL)
DOMICILIO:	C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.	PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	21-nov-25
0	6681861376	AL	01-dic-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
SCO-230519-155			07-nov-25

DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 10-nov-25
				TERMINACIÓN: 01-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,275,153.95	\$1,479,178.58	\$517,712.50	\$1,479,178.58

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 115,061.34 (SON CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.)

BUENO POR: \$ 115,061.34

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 55,623.57	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 158,924.49
MAS I.V.A.:	\$ 8,899.77	MAS I.V.A 16 %	\$ 25,427.92
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 64,523.34	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 184,352.41
3 % SVIFYC:	\$ 4,767.73	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 69,291.07
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 69,291.07		

SALDO A PAGAR:

\$ 115,061.34

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimación:
Fecha: 1 de diciembre de 2025				02 (NORMAL)
Periodo de la estimación:	21/11/2025	al	01/12/2025	Localidad:
Periodo de Ejecución:	10/11/2025	al	01/12/2025	BADIRAGUATO
Importe del contrato con I.V.A:	\$ 1,479,178.58	Imp. Contratado sin I.V.A	\$ 1,275,153.95	Anticipo
			\$ 517,712.50	Importe Anticipo sin I.V.A
				\$ 446,303.88
				% de Avance
				12%
				% Avance Total
				95%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 158,924.49	ESTA ESTIMACION
\$ 64,523.34	16 % I.V.A (+) \$ 25,427.92	\$ 184,352.41
	Sub- Total A (=) \$ 184,352.41	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 55,623.57	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 8,899.77	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 425,729.99	Total (=) \$ 64,523.34	\$ 1,216,371.41
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 103,300.92	TOTAL ACUMULADO.
\$ 490,253.33	16 % I.V.A (+) \$ 16,528.15	\$ 1,400,723.82
	Total (=) \$ 119,829.07	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 4,767.73	CONTRATADO
\$ 517,712.50	Total Deducciones (=) \$ 69,291.07	\$ 1,479,178.58
	Importe T O T A L \$ 115,061.34	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 115,061.34	SALDO
\$27,459.17	Son: (SON CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.)	\$ 78,454.76

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



1 de 1

FECHA: 01/12/2025

CONTRATISTA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

DOMICILIO:

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME
SIN.

R.F.C.

SCO-230519-155

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	10-nov-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	01-dic-25	CONTRATO: MBGGR-AD-FAISMUN-021/2025		FECHA CONTRATO: 07-nov-25		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,275,153.95		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$517,712.50		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,479,178.58		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$1,479,178.58
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	10-nov-25	20-nov-25	\$ 1,216,371.41	\$ 1,048,596.04	\$ 31,457.88	\$ 425,729.99	\$ 457,187.87	\$ 759,183.54
02 (NORMAL)	21-nov-25	01-dic-25	\$ 184,352.41	\$ 158,924.49	\$ 4,767.73	\$ 64,523.34	\$ 69,291.07	\$ 115,061.34
TOTALES:			\$ 1,400,723.82	\$ 1,207,520.53	\$ 36,225.61	\$ 490,253.33	\$ 526,478.94	\$ 874,244.88
SALDO DEL CONTRATO:			\$78,454.76	SALDO POR AMORTIZAR:		\$27,459.17		



FECHA

01/12/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,275,153.95			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$517,712.50			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,479,178.58			

OBRA	IMPORTE
2 ESTRUCTURA	\$ 19,290.15
3 INSTALACIONES ESPECIALES	\$ 126,711.94
4 TRABAJOS FINALES	\$ 12,922.40

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 158,924.49
----------------------	---------------

SUB TOTAL=	\$ 158,924.49
I.V.A AL 16 %	\$ 25,427.92
TOTAL =	\$ 184,352.41

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 01/12/2025
HOJA: 1 de 2

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,479,178.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
2	ESTRUCTURA									
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F/C=250 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	585.17	\$ 830.09	\$ 486,005.09	584.01	572.01	0.00	12.00	\$ 10,040.28
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	172.84	\$ 80.63	\$ 13,936.09	114.72	0.00	0.00	114.72	\$ 9,249.87
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 19,290.15
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	91.97	\$ 156.15	\$ 14,361.12	88.04	0.00	0.00	88.04	\$ 13,747.45
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	93.97	\$ 125.50	\$ 11,793.24	90.54	0.00	0.00	90.54	\$ 11,362.77
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 1,143.27	\$ 1,143.27	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,143.27
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR, MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (18 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	\$ 22,775.70	\$ 91,102.80	4.00	0.00	1.00	4.00	\$ 91,102.80

ELABORO
C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 01/12/2025
HOJA: 2 de 2

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,479,178.58

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 2,012.65	\$ 8,050.64	4.00	0.00	2.00	4.00	\$ 8,050.64
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELÉCTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,305.01	\$ 1,305.01	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,305.01
4	TRABAJOS FINALES									
ODR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,042.37	\$ 6,042.37	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,042.37
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	717.67	\$ 9.84	\$ 7,061.87	699.19	0.00	0.00	699.19	\$ 6,880.03
TOTAL DE TRABAJOS FINALES:										\$ 12,922.40

TOTAL ESTIMACIÓN \$ 158,924.49
I.V.A. \$ 25,427.92
TOTAL \$ 184,352.41

ELABORÓ:
C. ANAYADIEGA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZÓ:
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

GENERADORES ESTIMACION:

02. (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.96	5.98			29.66		
GP56									
			16.26	4.79			77.89		
			10.56	4.69			49.67		
			9.13	5.27			48.12		
			14.05	5.37			75.45		
			26.08	5.32			138.75		
			27.17	5.31			144.27		
	AREA TRIANGULO			8.20			8.20		
			2.00	6.00			12.00		
							TOTAL	584.01	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	572.01	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	12.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINGÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

GENERADORES ESTIMACION:

02: (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	20.61			1.00	20.61		LADO DERECHO
			11.76			1.00	11.76		
			8.83			1.00	8.83		
			14.87			1.00	14.87		
			26.32			1.00	26.32		
			27.14			1.00	27.14		
			3.82			1.00	3.82		LADO IZQUIERDO
			17.99			1.00	17.99		
			18.83			1.00	18.83		
			13.22			1.00	13.22		
			25.83			1.00	25.83		
			27.14			1.00	27.14		
			101.64			-1.00	-101.64		MENOS PATIN
							TOTAL	114.72	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

GENERADORES ESTIMACION:

02. (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00			1.00	10.00		L1-L2
			16.74			1.00	16.74		L2-L3
			31.98			1.00	31.98		L3-L4
			24.67			1.00	24.67		L4-L5
			4.65			1.00	4.65		L3-POSTE CFE
							TOTAL	88.04	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10.00			1.00	10.00		L1-L2
			16.74			1.00	16.74		L2-L3
			31.98			1.00	31.98		L3-L4
			24.67			1.00	24.67		L4-L5
			4.65			1.00	4.65		L3-POSTE CFE
			0.50			5.00	2.50		
							TOTAL	90.54	

ELABORO

ING. JESUS YOMANY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

02: (NORMAL)

GENERADORES ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MODULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA				5.00	5.00		L1-L5
							TOTAL	5.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	4.00	
							ADICIONAL	1.00	

ELABORO

ING. JESUS MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

GENERADORES ESTIMACION: 02. (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				1.00	1.00		L1
						1.00	1.00		L2
						1.00	1.00		L3
						1.00	1.00		L4
						1.00	1.00		L5
						1.00	1.00		POSTE DE CFE
							TOTAL	6.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	4.00	
							ADICIONAL	2.00	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	

ELABORO

ING. JESUS YANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 6

GENERADORES ESTIMACION:

02. (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
4	TRABAJOS FINALES								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	5.02	7.20			36.14		
			16.20	5.89			95.42		
			10.53	5.80			61.07		
			9.17	6.45			59.15		
			14.05	6.54			91.89		
			26.08	6.52			170.04		
			27.11	6.54			177.30		
		ÁREA TRIANGULO		8.20			8.20		
							TOTAL	699.19	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.


CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 02 (NORMAL)
2 ESTRUCTURA

1 de 5

GP56

EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMERADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

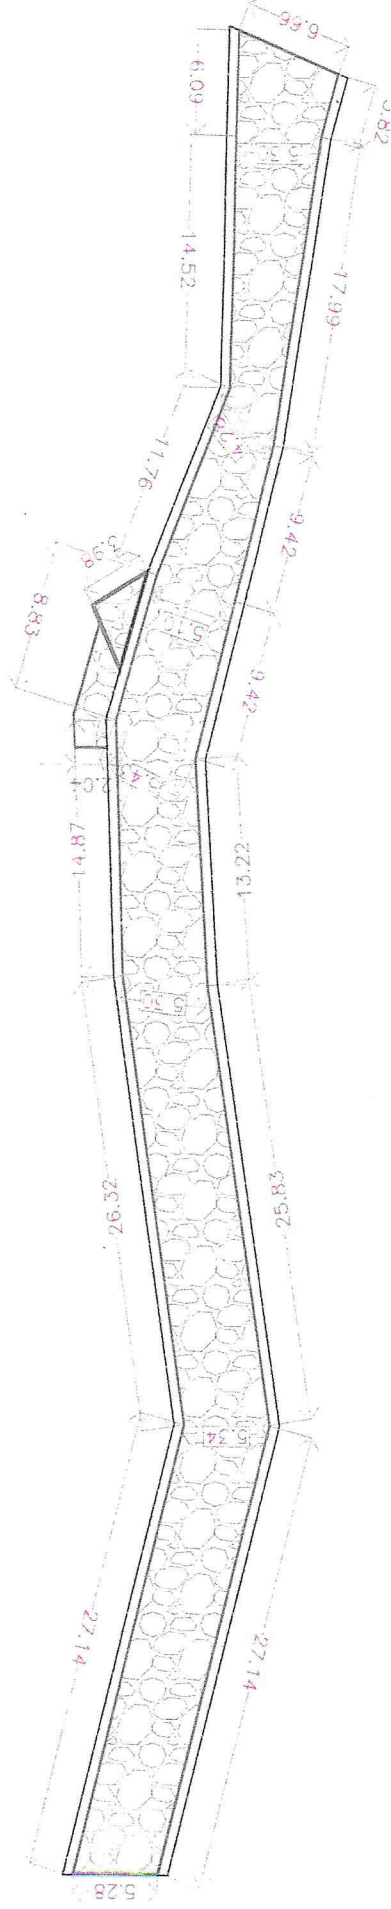

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FECHA: 01/12/2025



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 5


CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

GP11

PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

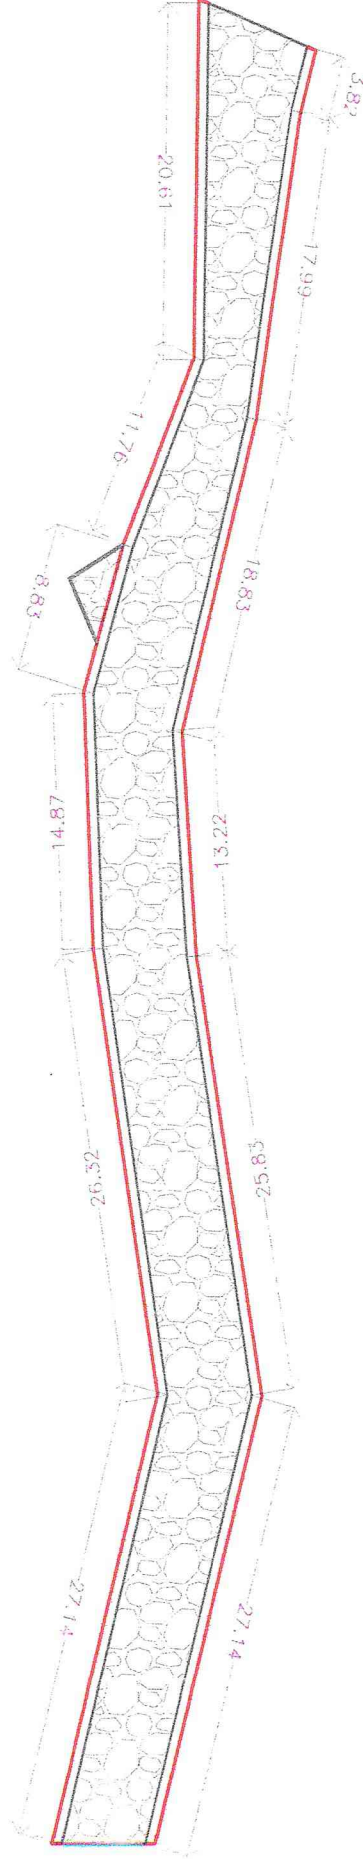

ELABORO

ING. JESUS YOMANKY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 01/12/2025



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

3 de 5


SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
CONTRATISTA: S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

3 INSTALACIONES ESPECIALES

- GP20 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- GP22 SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

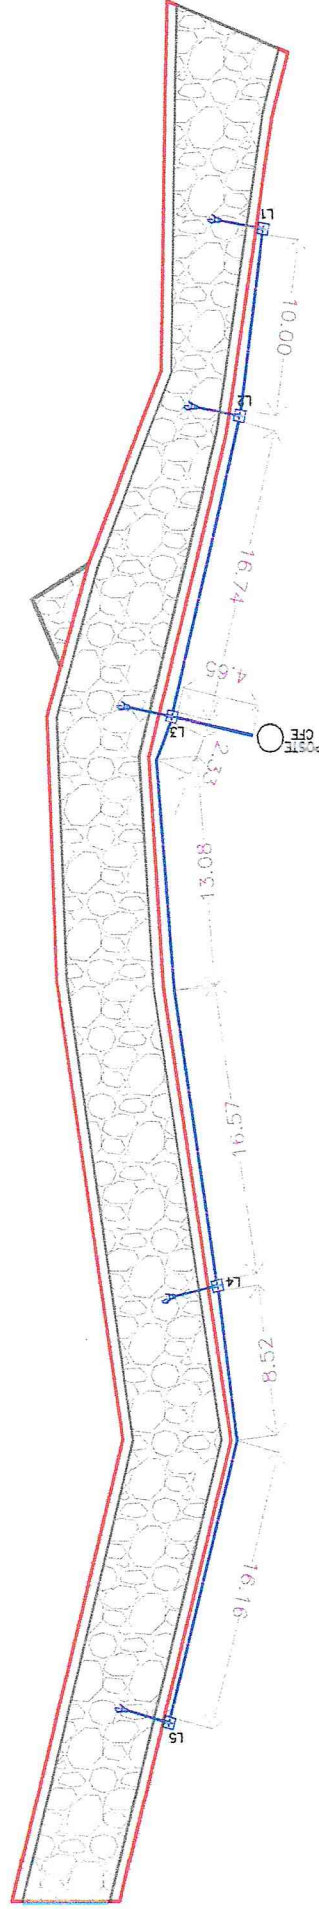

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

4 de 5

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

GP23


LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GP24

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GP30

INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

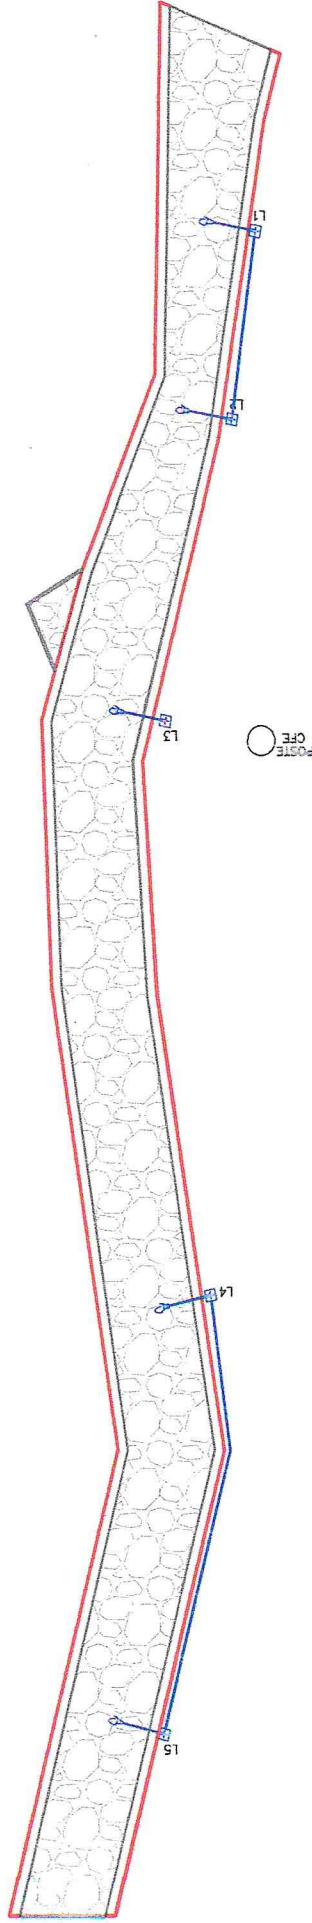

ELABORO

ING. JESUS YOVANNI MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

3 de 3

4 TRABAJOS FINALES

GBR671

LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP101

LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO

ING. JESUS JOVANY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta24/12/2025 4:18:39 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 02 NORM AD 021

Importe de la operación:115,061.34 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:030743900036659975

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación:24/12/2025

Fecha de aplicación:24/12/2025

Concepto de pago:EST 02 NORM AD 021

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:16:18:36

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000715314

Clave de rastreo:002601002512240000715314

Folio de firma:0050525087

Folio único:I401202512241618360050525093

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
