

OFICIO No. OPDUyE/771/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,479,178.58 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$ 48,966.59 (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA.
- No. DE FACTURA: # 8BA7, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE



C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrian G
RECIBIDO
17:52

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MSA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Salano No. SN COLONIA: Badiraguato Use CFDI: 101 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	61101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (ADICIONAL) FINIQUITO OJUNA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA, CONTRATO No.: M8GER-AD-FAISMUN-021/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 1,479,178.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 67,633.41 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 23,671.70 TOTAL: \$ 43,961.71 (+) MAS 16% IVA: \$ 7,033.87 TOTAL: \$ 50,995.59 DEDUCCIONES 3% SVFYC: \$ 2,028.00 SALDO LIQUIDO: \$ 48,965.59	43,961.71 002 - IVA - 7,033.87	43,961.71

CANTIDAD CON LETRA: (CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: 02 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$43,961.71
IVA 16%	\$7,033.87
TOTAL	\$50,995.59

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano



FOLIO FISCAL
7D4B4533-966E-4659-8630-FAC97AD78BA7
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
Diciembre 13 2025 - 13:24:54
SELLO DIGITAL DEL CFDI
IC0PewoTThgcZPF2GNJ1w6Xvdum2v+MyIqZUM4J-5gZBYq4y4KZOVhBYBseEUTYLGD4F08G6PDPj95bJLHEyW1vNqzZ4M2L
10r0beVymqrip55xJhcD4Ho4kagJq3GMyU7A4E1q9UaA5caPw68TMY7OGzMHAYFR00OvYx02mxx4X02cm+QF6uM0v1k9
UR2dZyKkeqCv7177Ajr/C8+UeXcLb5sm2BzFB3UjCfmlANWYECIPB348xAvgeLVYQ1eO4D5jBpDpOXN55m0KF+NPprrwa
vAIRUEBj5mVWxALFEWj3N7zwwVPTZY08UtoWw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
J1117D4B4533-966E-4659-8630-FAC97AD78BA7[2025-12-13T13:24:54]MAS0810247C0H0C0FewoTThgcZPF2GNJ1w6X
vdum2v+MyIqZUM4J-5gZBYq4y4KZOVhBYBseEUTYLGD4F08G6PDPj95bJLHEyW1vNqzZ4M2L00beVymqrip55xJhcD4Ho
4kagJq3GMyU7A4E1q9UaA5caPw68TMY7OGzMHAYFR00OvYx02mxx4X02cm+QF6uM0v1k9UR2dZyKkeqCv7177Ajr/C8
+UeXcLb5sm2BzFB3UjCfmlANWYECIPB348xAvgeLVYQ1eO4D5jBpDpOXN55m0KF+NPprrwaAIRUEBj5mVWxALFEWj3N7
zwwVPTZY08UtoWw==[000001000000709182898]
SELLO DEL SAT
00wD+y2va3DclPaG6DJ0n5IL1E4WT00xR5JcyCy1pPNNNuOgunXLUQzKJLYIRmUOwD76hYAT4YVdGwDzZy+nCMnPH
AocY2dW680GMej6M2uEISTxkajvV4Ud8WACkVng77hW5ZvAOE5X1bWZTJUn+wsCMuugy9XNp9w4P1XzX1p58XTfF
90cZlepT2mHuF8KUl6V0uVv77vQzema4A/R1982g2O/HYMUAdnWF4ce8pUPd4tPL2Fya8R5v5dKwHN1SeRepwHCBm0C0YS
7q388/acHMS3AQIV0dLF4cd1YENMeIj30ATP1CQ==

Debe (emos) y pagará (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. (\$50,995.59 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibi (mos) de conformidad, este pagará en mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagará domiciliado. Si este pagará no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="158" Fecha="2025-12-13T12:24:52">  
Sello="iCfEwofTi+gcZPF2GNjJw6Xvduhn2VzMy/gZUtvtJV59ZBYqd4xyKZGVHBYBSFEUTyLGD4F08GSPDPpj65bJLHEYw1VNqez4M2Ll09obeVkwbprip55x7hcD4Ho4bakg7Bq3GMU7YAxE"  
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"  
Certificado="MIITGIzcCBAAgAwIBAgIUMDAWMDExMDAUMDA3MDExMDUeODQwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGVMtUwMwyDVQDDCAwRQYBERUwUGU9SVk1DSUsgrEuGUQRNUSU5JU1RSQUJNT04GVFJSubTotal="43961.71" Moneda="MXN" Total="50995.58" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">  
  
<cfdi:Emission RegimenFiscal="626" Rfc="SCO230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>  
<cfdi:Receptor Rfc="MBAS0101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="20500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>  
<cfdi:Conceptos>  
  
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS ESTIMACION 01 (ADICIONAL) FINQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDrado AHOSADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINÁLOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 1,479,178.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 67,633.41 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 23,671.70 TOTAL: $ 43,961.71 (+) MAS 16% IVA: $ 7,033.87 TOTAL: $ 50,995.59 DEDUCCIONES 3% SVFYC: $ 2,029.00 SALDO LIQUIDO: $ 48,966.59" ValorUnitario="43961.71" Importe="43961.71" ObjetoImp="02">  
  
<cfdi:Impuestos>  
  
<cfdi:Traslados>  
  
<cfdi:Traslado Base="43961.71" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7033.87"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7033.87">  
  
<cfdi:Traslados>  
  
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="7033.87" Base="43961.71"/>  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
<cfdi:Complemento>  
  
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7D4B4533-966E-4059-8830-FAC97AD78BA7" FechaTimbrado="2025-12-13T13:24:54" RfcProvCertif="MAS0010247C0">  
SellocFD="iCfEwofTi+gcZPF2GNjJw6Xvduhn2VzMy/gZUtvtJV59ZBYqd4xyKZGVHBYBSFEUTyLGD4F08GSPDPpj65bJLHEYw1VNqez4M2Ll09obeVkwbprip55x7hcD4Ho4bakg7Bq3GMNoCertificadoSAT="00001000000709182098"  
SelloSAT="00wtDyvz2BDcbPaGGDJnu5tl1/E4WTQQ0xESJgyQyIpejpPNNNUogunXLUQiULYrImUOWd76hjY/UT4YVDGknDdzty+nCMnPH/kc4YzdIW660GIMSjbMuZFSTxAjoVdUdi"  
</cfdi:Complemento>  
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 01-dic-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
TELÉFONO: 0 CEL: 6681861376
R.F.C. SCO-230519-155

ESTIMACIÓN No: 01 (ADICIONAL)
FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 21-nov-25
AL 01-dic-25

FECHA DE CONTRATO:

07-nov-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 10-nov-25

TERMINACIÓN: 01-dic-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$1,275,153.95

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$1,479,178.58

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$517,712.50

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$1,479,178.58

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 48,966.59 (SON CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)

BUENO POR: \$ 48,966.59

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL)
FINIQUITO

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 23,671.70

MAS I.V.A.:

\$ 3,787.47

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 27,459.17

3 % SVIFYC:

\$ 2,029.00

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 29,488.17

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 67,633.41

MAS I.V.A 16 %

\$ 10,821.35

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 78,454.76

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 29,488.17

SALDO A PAGAR:

\$ 48,966.59

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimación: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
Período de la estimación: 21/11/2025 al 01/12/2025		Fecha: 1 de diciembre de 2025		
Período de Ejecución: 10/11/2025 al 01/12/2025		Localidad: BADIRAGUATO	No. De contrato: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025	
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,479,178.58	\$ 1,275,153.95	\$ 517,712.50	\$ 446,303.88	5%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 67,633.41	ESTA ESTIMACION
\$ 27,459.17	16 % I.V.A (+) \$ 10,821.35	\$ 78,454.76
	Sub- Total A (=) \$ 78,454.76	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 23,671.70	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 490,253.33	16 % I.V.A (+) \$ 3,787.47	\$ 1,400,723.82
	Total (=) \$ 27,459.17	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 43,961.71	TOTAL ACUMULADO.
\$ 517,712.50	16 % I.V.A (+) \$ 7,033.87	\$ 1,479,178.58
	Total (=) \$ 50,995.59	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 2,029.00	CONTRATADO
\$ 517,712.50	Total Deducciones (=) \$ 29,488.17	\$ 1,479,178.58
	Importe T O T A L \$ 48,966.59	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 48,966.59	SALDO
\$0.00	Son: (SON CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)	\$ -

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME
R.F.C. SIN.
SCO-230519-155

FECHA: 01/12/2025
DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD: BADIRAGUATO			ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.								
FECHA INICIO CONTRATO:	10-nov-25	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	01-dic-25	CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025			FECHA CONTRATO: 07-nov-25		
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,275,153.95		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$517,712.50		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:			AL			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,479,178.58		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:			IMPORTE TOTAL CONTRATADO:			\$1,479,178.58
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)	10-nov-25	20-nov-25	\$ 1,216,371.41	\$ 1,048,596.04	\$ 31,457.88	\$ 425,729.99	\$ 457,187.87	\$ 759,183.54	
02 (NORMAL)	21-nov-25	01-dic-25	\$ 184,352.41	\$ 158,924.49	\$ 4,767.73	\$ 64,523.34	\$ 69,291.07	\$ 115,061.34	
01 (ADICIONAL) FINIQUITO	21-nov-25	01-dic-25	\$ 78,454.76	\$ 67,633.41	\$ 2,029.00	\$ 27,459.17	\$ 29,488.17	\$ 48,966.59	
TOTALES:			\$ 1,479,178.58	\$ 1,275,153.94	\$ 38,254.61	\$ 517,712.50	\$ 555,967.11	\$ 923,211.47	
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR:			\$0.00		

ELABORÓ:

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO:

ING. BURIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA

01/12/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,275,153.95			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$517,712.50			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,479,178.58			

OBRA**IMPORTE**

2 ESTRUCTURA	\$	40,832.39
3 INSTALACIONES ESPECIALES	\$	26,801.02

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 67,633.41

SUB TOTAL= \$ 67,633.41
I.V.A AL 16 % \$ 10,821.35
TOTAL = \$ 78,454.76

ELABORÓ

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 4

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	101.64			1.00	101.64		LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO
							TOTAL	101.64	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		48.17	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		53.47	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	106.83			1.00	106.83		LADO DERECHO
			109.53			1.00	109.53		LADO IZQUIERDO
			7.90			1.00	7.90		TRANSVERSALIES
			6.68			1.00	6.68		
			6.25			1.00	6.25		
			5.82			1.00	5.82		
			5.39			1.00	5.39		
			4.96			1.00	4.96		
			4.53			1.00	4.53		
			5.03			1.00	5.03		
			5.45			1.00	5.45		
			5.86			1.00	5.86		
ELABORO									

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 4

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
			6.27			1.00	6.27		
			6.38			1.00	6.38		
			6.47			1.00	6.47		
			6.57			1.00	6.57		
			6.13			1.00	6.13		
			6.16			1.00	6.16		
			6.25			1.00	6.25		
			6.33			1.00	6.33		
			6.41			1.00	6.41		
			6.36			1.00	6.36		
			6.38			1.00	6.38		
			6.39			1.00	6.39		
			6.41			1.00	6.41		
			6.43			1.00	6.43		
			6.44			1.00	6.44		
			6.46			1.00	6.46		
			6.48			1.00	6.48		
			6.49			1.00	6.49		
			6.56			1.00	6.56		
			6.52			8.00	52.16		
							TOTAL	447.76	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	331.23	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	109.276	
							SIN COBRAR	7.25	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA de 4

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						1.00	1.00		L2
						1.00	1.00		L3
						1.00	1.00		L4
						1.00	1.00		L5
						1.00	1.00		POSTE DE CFE
							TOTAL	6.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	4.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	2.00	

ELABORO

ING. JESUS JOSE MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 3

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.


OBRA:

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

ESTRUCTURA

GP088

PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

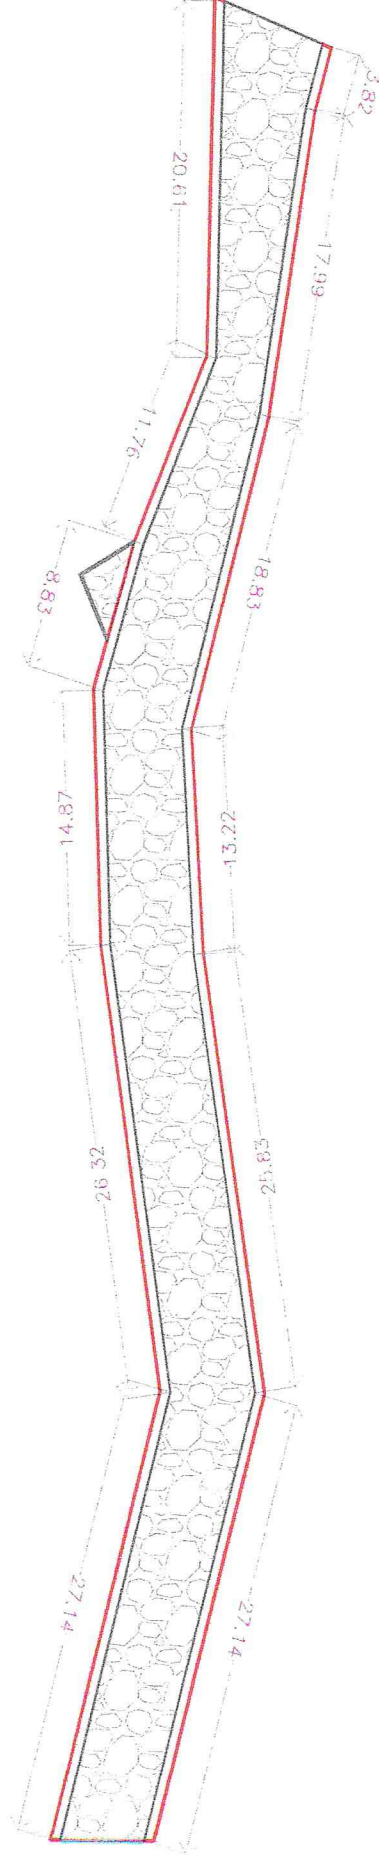

ELABORO


ING. JESUS YOVANN MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA:
SEIS-UNCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.


OBRA:

2 de 3

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

GP13

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

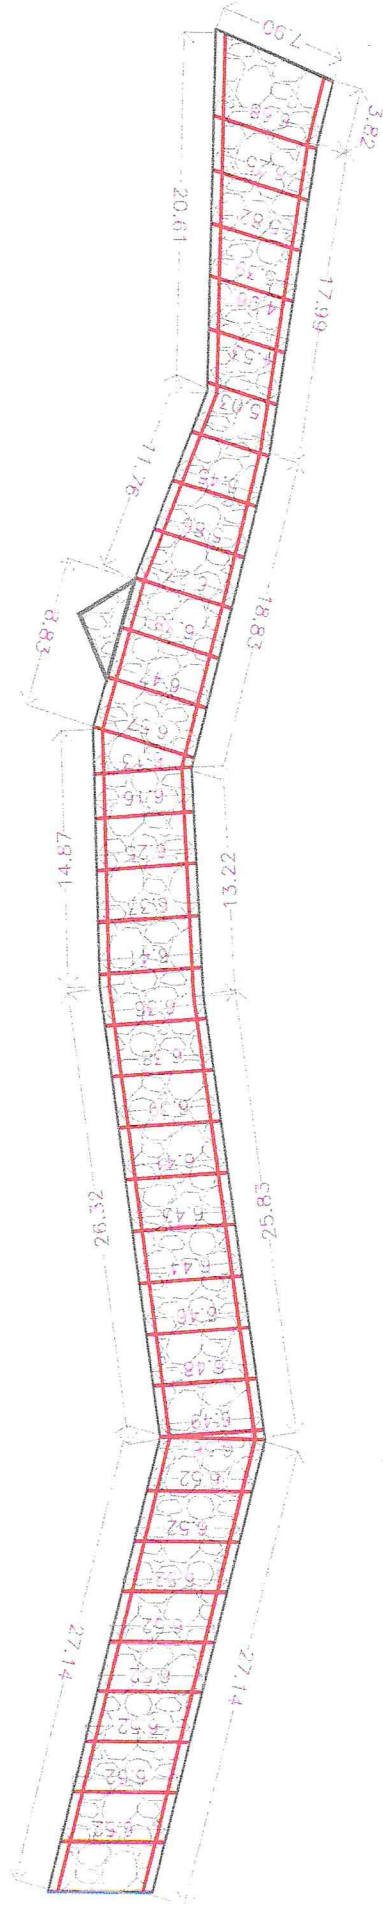

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

3 de 3

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO


3 INSTALACIONES ESPECIALES

GP23

LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GP24

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

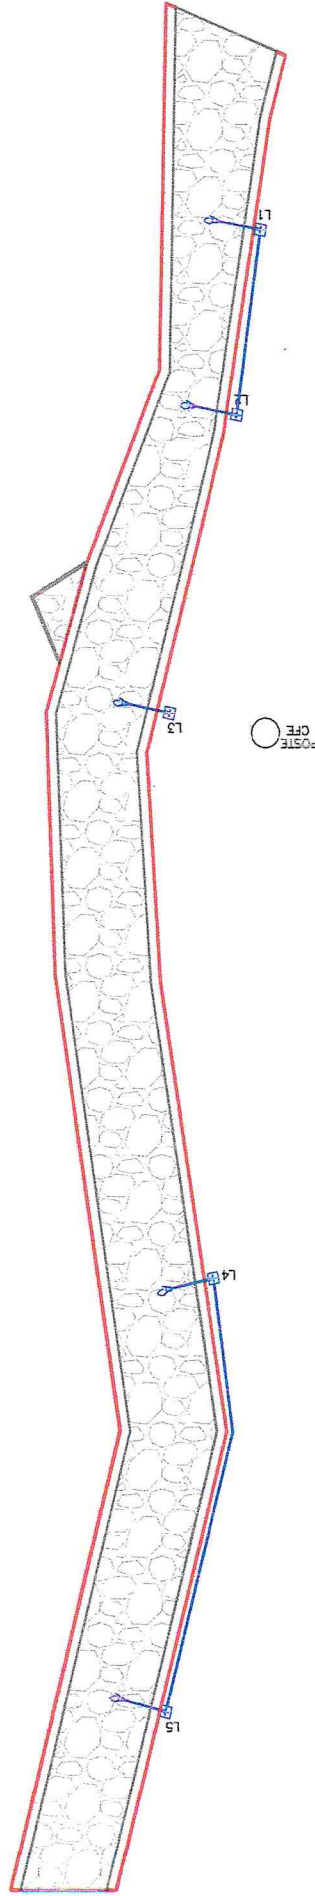

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

ESTRUCTURA


2

GP088

PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP13

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

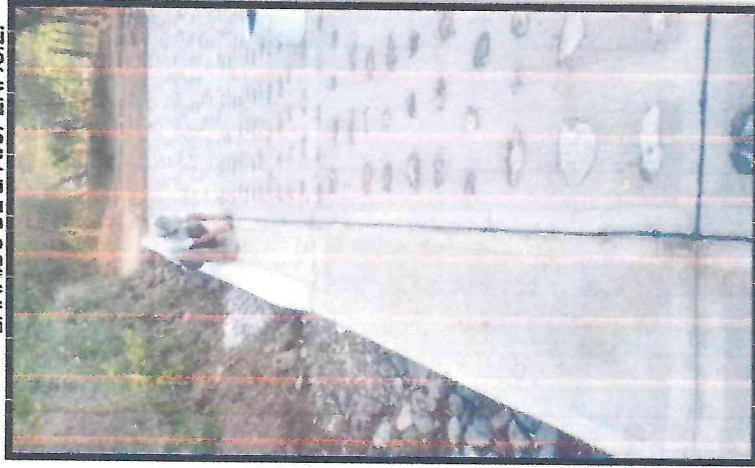

ELABORO

ING. JESÚS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 01/12/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA

S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

ESTIMACION:

3

INSTALACIONES ESPECIALES

GP23

LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GP24

REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta 24/12/2025 4:20:33 PM
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Contrato 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:	EST 01 ADC FINQ AD21	Importe de la operación:	48,966.59 MXP
Cuenta de retiro:	0124174836	Cuenta de depósito:	030743900036659975
Divisa de la cuenta:	MXP	Divisa de la cuenta:	MXP
Titular de la cuenta:	MUNICIPIO DE BADIRAG UATO	Titular de la cuenta:	SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV
Nombre banco destino:	BAJIO		
Fecha de creación:	24/12/2025	Fecha de aplicación:	24/12/2025
Concepto de pago:	EST 01 ADC FINQ AD21	Referencia numérica:	
Instrumento de seguridad:	ASD 6551749382	Hora de captura en el canal:	16:20:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:	0000715360	Clave de rastreo:	002601002512240000715360
Folio de firma:	0050525104	Folio único:	I401202512241620310050525110

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
