

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA DAR POR INICIADOS LOS TRABAJOS DEL CONTRATO N° ~~OPPU~~ PU-EST-LP-PEST-APDA-2102-2023 QUE LLEVAN A CABO POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.I. JOSE LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARACTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE EL C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", ESTE CONTRATO ES DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

ESTE DIA EL CONTRATISTA PRESENTA TAMBIEN A ESTA SUPERVISION DE SOP, EL OFICIO DE INICIO DE OBRA, ASI COMO TAMBIEN EL OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE, DONDE EL MISMO FUNGIRA CON ESTE CARGO Y PRESENTA COPIA DE CEDULA PROFESIONAL N° 6336219 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y QUE LO ACREDITA COMO LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL, Y QUIEN TENDRA LA FACULTAD Y OBLIGACION AL IGUAL QUE ESTA SUPERVISION DE LLEVAR A CABO TODAS LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN ESTE LIBRO DE OBRA COMO SON AVANCES DE OBRA, CAMBIOS DE PROYECTO, INDICACIONES, ETC., DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, HASTA LLEGAR A SU CONCLUSION, Y FIRMAN

POR EL CONTRATISTA

POR LA SOP

ING. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA
SUPERINTENDENTEING. JOSE ROSARIO VALENZUELA
SUPERVISOR

* LA OBRA QUE AMPARA ESTE CONTRATO ES DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR MAGISTERIAL - SEGUNDA ETAPA - EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA, CON UN MONTO TOTAL A EJERCER DE \$14'293,171.67, SON CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. Y A CON EL 16% DEL IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 01 DE MARZO DE 2023 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

NOTA N° ① CON ESTA MISMA FECHA SE LLEVA A CABO UN RECORRIDO POR EL TRAMO DONDE SE LLEVARA A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN COMPANIA DE EL CONTRATISTA, PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME (JAPAMA), EL PROYECTISTA ING. MANUEL PELLEGRI Y ESTA SUPERVISION, REVISANDO LO QUE PUEDIERAN SER PUNTOS CRITICOS Y PASES O CRUCES DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE QUE PUEDIERAN OBSTRUIR ESTA LINEA QUE SE COLOCARA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 42" Ø PARA DRENAJE PLUVIAL.

CON ESTO SE DA POR INICIADA ESTA OBRA DONDE YA SE QUEDA LA CUADRIILLA DE TOPOGRAFIA Y EL INGENIERO RESIDENTE TRABAJANDO PARA LLEVAR A CABO EL TRAZO Y PASO DE NIVELES

Mil López Viqueen

~~Rolando A.~~

10/03/2023

NOTA N° ② HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APERCEBA UN BUEN AVANCE, YA QUE SE TIENE TODO EL TRAMO TRAZADO, CORTADO CON DISCO EN LAS LORAS DE PAVIMENTO Y SE ESTA PICANDO CON PISTONARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA, INICIANDO ESTOS TRABAJOS EN EL PUNTO DE BAJADA DEL KATERVORNO CONSTRUIDO EN LA PRIMERA ETAPA.

SE ESTAN ZONDEANDO LOS PASES (CRUCES) DE TUBERIA HIDRAULICA PARA DETERMINAR LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN ESOS CASOS CON AYUDA DEL PERSONAL DE JAPAMA

Mil López Viqueen

~~Rolando A.~~

NOTA N° ③ DURANTE LA VISITA A ESTA OBRA, ESTA SUPERVISION PUEDE APRECIAR COMO SE TIENE BIEN SE-
NALIZADA Y PROTEGIDA PERO AUN ASI LOS AUTOMOVILISTAS
NO RESPETAN LOS SEÑALAMIENTOS POR LO QUE SE LE
PIDE AL CONTRATISTA COLOCAR A UN BARENDILLERO QUE
LES DIGA QUE NO HA PASE.

SE OBSERVA COMO YA SE INICIO CON LA DEMOLICION
DE LOSAS DE PAVIMENTO EN EL PUNTO DE ACCESO AL
COLEGIO DEL CENTRO ESCOLAR DEL NOROESTE, PARA DAR
PRIORIDAD Y QUE NO QUEDA CERRADO LOS 2 ACCESOS.

TAMBIEN SE PUEDE VER COMO YA LLEGARON LOS PRIME-
ROS TRAMOS DE TUBERIA Y CONEXIONES DE 42"Ø

* EN LO REFERENTE AL COLADO DEL ENCOFRADO DE LA TUBE-
RIA DEBERA SER CON CONCRETO DE RESISTENCIA RAPIDA POR
EL GRAN FLUJO VEHICULAR EXISTENTE EN ESTA ZONA, POR
LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA HACER LA SOLICITUD PARA
LA AUTORIZACION DE ESTE CONCRETO.

M. I. Lim Viscer

R. Alvarez


27/03/2023

NOTA N° ④ HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA
DONDE PODEMOS APRECIAR COMO YA SE TIENE UN BUEN
TRAMO DE EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 MTS FRONTE AL
COLEGIO Y TAMBIEN SE ESTA CARGANDO Y RETIRANDO
EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION FUERA
DE LA OBRA, YA SE VIENE PREPARANDO PARA EL COLA-
DO DE PLANTILLA PARA EMPEZAR A METER TUBERIAS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NOM-001-CONAGUA-2011.

M. I. Lim Viscer

R. Alvarez

NOTA N° ⑤ SE LLEVA A CABO LA VISITA DE OBRA DONDE YA SE PUEDE APRECIAR MUY BUEN AVANCE EN LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCIDO LA MISMA FUERA DE LA OBRA EN CAMION; TAMBIEN YA SE TIENE COLADO DONDE SE VENIA COLANDO TUBERIA DE 42" ϕ , DANDO ACABADO RALLADO AL PAVIMENTO

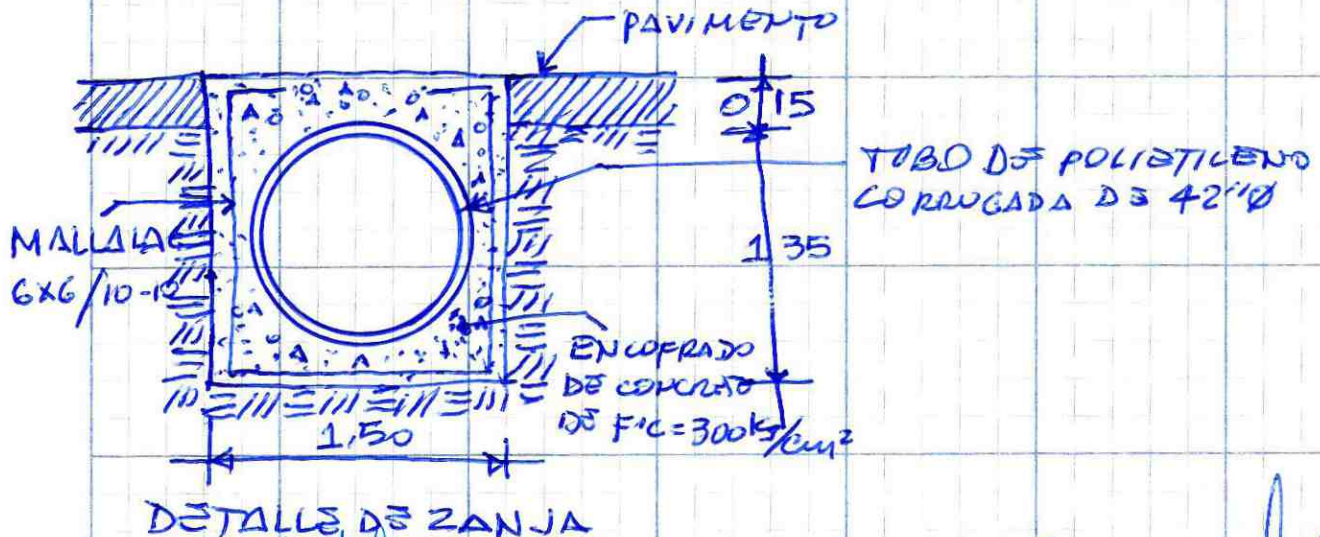

[Signature]

[Signature]

06/04/2023

NOTA N° ⑥ CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LAS ESTIMACIONES N° ① NORMAL Y N° ② EXTRAORDINARIA, SIENDO LA ESTIMACION N° ① POR UN MONTO TOTAL A PAGAR LIQUIDO POR \$1'457,696.22; SON UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y LA ESTIMACION N° ② EXTRAORDINARIA POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR POR \$1'138,002.15; SON UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOS PESOS 15/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, EL CONVENIO PARA EL CONCRETO PRESTA EN TRAMITE.

[Signature]

[Signature]

NOTA N° ⑦ CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA OBSERVANDO COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN. TAMBIÉN SE ESTA COLANDO PLANTILLA ARMADA CON MALLA 6x6-10'10", LA CUAL ENVOLVERÁ EL TUBO DE 42" Ø PARA ENLOFRARLO.

[Signature]
López Vázquez

[Signature]
A

25/04/2023

NOTA N° ⑧ SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 42" Ø, LLEGANDO AL PRIMER QUIEBRE DEL COLEGIO CENTRO ESCOLAR DEL NOROESTE HACIA LA ENTRADA DE LA PERGOLA HACIA DONDE TENEMOS UNA ALCANTARILLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES.

NOS ENCONTRAMOS CON UNA TUBERÍA DE 6" Ø DE ASBESTO AL PARECER SANITARIA, SE ESPERARÁ A QUE EL PERSONAL DE LA JAPMA ZONDEE PARA SABER SI ESTA EN USO.

[Signature]
López Vázquez

[Signature]
A

NOTA N° 9 CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO ESTA VISITA A LA OBRA PUDIENDO OBSERVAR QUE LA TUBERIA QUE SE ENCONTRO DE TUBERIA DE ASBESTO ESTABA OBSOLETA Y YA SE RETIRO PUDIENDO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE COCADO DE PLANTILLA Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 42"Ø. TAMBIEN SE TUVO QUE DEMOLER PARTE DE LA REJILLA PARA PODER CONTINUAR CON LA COLOCACION DE LA TUBERIA. SE ENCONTRO TUBO HIDRAULICO DE 24"Ø QUE APENAS LIBERA LA TUBERIA DEL COLECTOR PLUVIAL.

SEGUIMOS EN ESPERA DE LAS SOLUCIONES A ESTOS CRUCES POR PARTE DEL PROYECTISTA ING. MANUEL PELLEGRI. ESTO NOS ESTA ATRASANDO LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS Y EL AVANCE DE LA OBRA EL CUAL ES DEL 17%

Manuel Pellegri

Manuel Pellegri

12/05/2023

NOTA N° 10 HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR UN BUEN AVANCE A PESAR DE QUE NO SE HAN PRESENTADO PROPUESTAS O MEJOR DICHO, SOLUCIONES POR PARTE DEL PROYECTISTA PERO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTOS, EXCAVACION, RETIRO DE EL PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y COCADO LOSAS DE PAVIMENTO EN LOS TRABAJOS QUE SE PUEDE EL AVANCE DE LA OBRA EL DEL 20%.

Manuel Pellegri

Manuel Pellegri

NOTA N° (11) CON ESTA FECHA NOS ENCONTRAMOS EN ESTA OBRA PUDIENDO VER COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS, EL PROYECTISTA YA PRESENTO SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA TRANSVERSALES A LA TUBERIA DEL COLECTOR PLUVIAL, POR LO QUE SE TENDRAN QUE HACER UNOS BYEPASS PARA PODER DARLE SOLUCION.

SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE TUBERIA, ENCOFRADO Y COLADO DE LOSAS DE PAVIMENTO CON CONCRETO RR 24 HRS $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$

M. L. J. J. J.

R. J. J. J.

29/05/2023

NOTA N° (12) HOY SE LLEVA A CABO ESTA VISITA DE OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS Y SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 35%.

SOLICITA EL PERSONAL DE LA JARUMA QUE SE TRABAJE EN LOS PASES DE TUBERIAS DE AGUA PARA QUE SE CIERRE EL PAVIMENTO Y NO QUEDAR DEJANDO TRABAJOS ABIERTOS.

M. L. J. J. J.

R. J. J. J.

NOTA N° 13 CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LAS ESTIMACIONES N° 3 NORMAL Y LA N° 4 EXTRAORDINARIA, SIENDO LA N° 3 NORMAL POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR POR \$ 1'792,571.27; SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS 27/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS Y LA ESTIMACION N° 4 EXTRAORDINARIA POR UN MONTO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 2'250,925.80; SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO PESOS 80/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS.

M. N. López Viqueo

Rolando A.

NOTA N° 14

05/06/2023

ESTA NOTA ES PARA ACLARAR QUE LA NOTA N° 13 ARRIBA SEÑALADA ES CON FECHA 02/06/2023 Y NO 02/05/2023 COMO APARECE.

M. N. López Viqueo

Rolando A.

NOTA N° (15) Hoy se lleva a cabo la visita a esta obra donde se puede apreciar como ya se tiene muy buen avance con la excavación en el área del cerco, donde ha estado cayendo mucha piedra azul muy dura donde se trabaja con retroexcavadora con rotomartillo, se continúa trabajando con la introducción de tubería de polietileno de 42" ϕ sobre plantilla de concreto armado con mallazo 6x6-10.10 y encofrándola con concreto $f'c = 300 \text{ kg/cm}^2$, armado con mallazo y dando el acabado en losas de pavimentos.

M. L. J. J. J.

~~R. J. J. J.~~

17/06/2023
NOTA N° (16) Durante esta visita a la obra se está llevando a cabo la construcción de la primera caja donde se colocará placa de acero de 1" de espesor, también se continúa con la excavación en piedras en dirección de la entrada a la pargola por la parte de arriba y se viene colocando la tubería, encofrando y rellorando con material de banco (balastro) para dar altura al nivel de la losa de pavimento, llegando a cabo el relleno y compactado con balastina para dar el 100% de compactación.

M. L. J. J. J.

~~R. J. J. J.~~

NOTA N° (17) AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE VER COMO SE CONTINUA CON LA ESCAVACIÓN EN PIEDRA SE TIENEN DOS RETROEXCAVADORAS CON ROTOMARTILLO FALTANDO UN TRAMO DE 10.00 MTS. PARA ABRIR LA EXCAVACION, PERO SE HA PUESTO MUY DIFÍCIL YA QUE ESTA MAS PROFUNDA Y CON PIEDRAS MUY GRANDES DE LAS AZULES.

SE TRABAJA TAMBIEN EN LA COLOCACION DE TUBERIA HACIA LA BAJANTE EXISTENTE DEL AREA DE LADO DERECHO DE LO ESCALERA PARA SUBIR A LA PERGOLA, DONDE SE HARA UNA CAJA DE CONCRETO ARMADO PARA HACER LA BAJADA AL TUBO DE 42" Ø.

TAMBIEN SE INICIARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN LOS TERRENOS DEL TECNOLÓGICO, HAY QUE DEBE DE DESCARGA Y LA CONEXION DE LOS BAYPASS EN LAS TUBERIAS DE 6" Ø DE AGUA QUE ATRAVIESAN LA LINEA DEL COLECTOR PLUVIAL

Will L. López

Ramiro A. S.

03/07/2023

NOTA N° (18) SE LLEVA A CABO LA VISITA A LA OBRA PUDIENDO APRECIAR COMO SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA EXCAVACION EN PIEDRA CON LAS 2 RETROEXCAVADORAS CON ROTOMARTILLO. FALTANDO POR ABRIR UN TRAMO DE 4.00 MTS., TAMBIEN SE COLO CONCRETO EN ENCOFRADO DE TUBO EN EL AREA DE ENTRADA A LA PERGOLA DONDE ESTABA LA REJILLA PLUVIAL Y DONDE SE HIZO EL PRIMER BAYPASS DE TUBERIA DE 6" Ø DE AGUA Y YA SE HUBIERON LOS OTROS DOS DE 6" Y EL DE 8" Ø Y SE ESTA INTRODUCIENDO TUBERIA HACIA EL DREN EN TERRENOS DEL TECNOLÓGICO

Will L. López

Ramiro A. S.

NOTA N° (19) CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° (5) NORMAL A REVISION Y FIRMA, POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR DE \$ 744,019.68; SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N. YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, TAMBIEN PRESENTA LA ESTIMACION N° (6) ADICIONAL POR UN IMPORTE NETO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 605,815.51; SON: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 51/100 M.N., ESTANDO EN TRAMITE EL CONVENIO ADICIONAL PARA MONTO DE ADICIONALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, PRESENTANDO TAMBIEN LA ESTIMACION N° (7) EXTRAORDINARIA POR UN MONTO NETO, LIQUIDO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 606,217.51; SON: SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100 M.N. YA CON TODAS SUS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES APLICADAS, REVISADAS Y FIRMADAS SE LE ENTREGAN AL CONTRATISTA ESTAS ESTIMACIONES PARA QUE HAGA EL TRAMITE DE PAGO.

M. A. L. V. Viquez

R. Salazar

NOTA N: (20) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE APRECIAR COMO YA SE TERMINO LA INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE PVC DE 42" Ø HASTA EL DREN Y SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE DESCARGA CON ARMADO DE ACERO DE 1/2", TAMBIEN YA SE HIZO LA CAJA DE LA DESCARGA DEL TUBO DE 24" HACIA EL COLECTOR DE 42" Ø, SE TRABAJA CON EL COLADO DE LAS AREAS DONDE SE HICIERON LOS BAYPASS, SE ESTA TRABAJANDO CON EL ENCOFRADO DEL TUBO QUE ESTA HACIA EL INTERIOR DEL TECNOLÓGICO.

Millón López Vázquez

~~Raluy~~

13/07/2023

NOTA N: (21) HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE APRECIAR COMO SE ESTA LLEVANDO EL COLADO DE LOMA DE PAVIMENTO EN EL AREA MAS ALTA DELA FALDA DEL CERRO, DONDE SE DEMOLIO MAS PIEDRA Y SE RELLENO MAS, A LA ENTRADA DE LA PERGOLA TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN LA HERRERA DE 2 CASAS SOBRE LA LINEA DEL COLECTOR Y COLANDO PLACAS EN LAS QUE YA SE COLARON

Millón López Vázquez

~~Raluy~~

CON ESTA MISMA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION N: (8) EXTRAORDINARIA, DE CONCEPTOS Y PRECIOS EXTRAORDINARIOS YA AUTORIZADOS Y EL CONVENIO ENTRAMITE SIENDO POR LA CANTIDAD DE \$324,322.55; SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 M.N. NETO LIQUIDO A PAGAR, CON TODAS SUS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES YA APLICADAS

Millón López Vázquez

~~Raluy~~

NOTA N° (22) Hoy se lleva a cabo el recorrido por esta obra donde se aprecia como ya se tiene terminado todo el tramo del colector, con todas sus cajas terminadas con sus tapas puestas y se esta llevando a cabo el colado de la terminal del colector donde se levanta para hacer la descarga al dren, dejando preparado con placas de acero para donde se va a colocar la compuerta dando con esto ~~esta~~ la terminacion de la obra de esta segunda etapa del colector, el cual ya funcionara quedando pendiente solo la colocación de la compuerta que sera para limpieza del colector hacia el dren.

[Firma]

[Firma]

21/07/2023

NOTA N° (23) CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LAS ESTIMACIONES N° (9) ADICIONAL POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR \$ 290,310.95; SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 95/100 M.N. CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS Y CON UN CONVENIO EN TRAMITE, TAMBIEN PRESENTA LA ESTIMACION N° (10) EXTRAORDINARIA POR UN MONTO TOTAL NETO A PAGAR POR \$ 1'079,293.95; SON: UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, PRESENTA LA AUTORIZACION Y LISTA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, QUEDANDO PENDIENTE EL CONVENIO, EL CUAL ESTA EN TRAMITE, LA OBRA PRESENTA UN 9% DE AVANCE.

[Firma]

[Firma]

NOTA N° (24) CON ESTA FECHA SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA PARA REVISAR SI YA SE ESTÁ COLOCANDO LA COMPUERTA FALTANTE EN LA CONEXION DEL COLECTOR AL DEEN DE SALIDA, APRECIANDOSE QUE NO SE ESTÁ TRABAJANDO TODAVIA, QUEDANDO PENDIENTE ESTOS TRABAJOS.

Millán López Vázquez

~~Plaza~~ ★

15/08/2023

NOTA N° (25) AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA A LA OBRA SE PUEDE APLICAR QUE SIGUE IGUAL NO SE HA INSTALADO LA COMPUERTA, SE LE LLAMÓ AL RESIDENTE Y COMENTÓ QUE YA ESTA HECHO, INCLUSO MANDÓ FOTOS PERO ARGUMENTA QUE EL SOLDADOR NO HA PODIDO IR A PONERLA

Millán López Vázquez

~~Plaza~~ ★

28/08/2023

NOTA N° (26) ESTE DÍA SE ASISTIÓ A LA OBRA YA QUE NOS AVISÓ EL RESIDENTE QUE YA SE ESTABA COLOCANDO LA COMPUERTA, QUEDANDO TERMINADOS CON ESTO LOS TRABAJOS QUE FALTABAN PARA DAR POR FINALIZADA ESTA OBRA AL 100%

Millán López Vázquez

~~Plaza~~ ★

NOTA N° 27 CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA ESTIMACION N° 11 EXTRAORDINARIA FINALIZADA POR UN MONTO TOTAL LIQUIDO A PAGAR DE \$ 17,790.94; SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N. CON EL 16% DEL IVA YA AGREGADO Y TODOS LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, CON LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS Y CON EL CONVENIO N° CONV-01-2023-MI-2102-2023. COBRANDO EL IMPORTE DE ESTA ESTIMACION NOS QUEDA UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 1,615.93; SON: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 93/100 M.N. DEL TOTAL DE LA SUMA DEL CONTRATO MAS EL CONVENIO, DANDO CON ESTO POR CERRADO ESTE LIBRO DE OBRA.

M. M. López Vázquez

Ramírez
