

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

*Obra 832: Reencarpetado de Garzas trebol el
Diez.*

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01 Obra: Reencarpetado de Gazas Trebol el Diez.

Del 18 de Octubre al 26 de febrero del 2023.

Importe de la obra: \$ 9,449,512.50

Con esta fecha se abre el presente libro de bitácora para dar seguimiento a los trabajos correspondientes a la construcción de la obra arriba mencionada.

La normatividad estará a cargo de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al Ing. Martín Castro Moreno, como residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer anotaciones del bitácora serán por la Secretaría de Obras Públicas (S.O.P) el Ing. Alejandro Sainz Sanchez y por Preecasin el Ing. Martín Castro Moreno.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Reencarpetaado de Gazaras trebol el Diez.

Del 18 de Octubre del 2022 al 19 de Febrero del 2023.

En esta fecha se abre el presente libro para los trabajos de reencarpetaado en dicha calle realizando las siguientes actividades:

- Riego de liga con emulsion cationica Ec2-60 a razon de 0.50 l/m² de acuerdo con las Normas Get. Se utilizaron 20.152.25 litros de emulsion.

- Suministro puesto en obra de carpeta asfaltica (mezcla caliente) incluye: adquisicion o procesamiento de mezcla asfaltica en caliente para la construccion de carpetas, tambien el tendido y compactacion de la carpeta en un total de 2.512.18 m³.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Reencarpetao de GAZAS trebol
el Diez

Del 18 de octubre del 2022 al 19 de
Febrero del 2023.

- Se inician los trabajos de bacheo
superficial con mezcla caliente agregado
maximo 3/4" a finos, distribuido de la
siguiente forma:

Fecha	Camion	Nro Baches	Mezcla m3
18/10/2022	BA-04	12	3.00
19/10/2022	BA-04	18	3.00
20/10/2022	BA-04	11	3.00
21/10/2022	BA-04	6	3.00
29/12/2022	BA-03	10	3.00

se continua con el bacheo
superficial.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04 Obra: Reencarpelado de Gomas trebol
el Diez.

Continuamos con los trabajos de
baches superficial.

Fecha	Camión	Nro Baches	Mezcla m ³
07/01/2023	VLS20	8	2.00
09/01/2023	VLS20	14	2.00
10/01/2023	VLS20	12	2.00
11/01/2023	VLS20	10	2.00
12/01/2023	VLS20	15	2.00
13/01/2023	VLS20	4	3.00

Se utilizaron un total de 23.85 m³
de mezcla asfáltica terminando los
trabajos de baches y continuando con
el señalamiento horizontal.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA


005

05

Obra: Reencarpetado de Garzas Trebol el Dietz.

Del 20 al 26 de febrero del 2023.

Con esta fecha se inician los trabajos de marcado de raya de 10 cm de ancho con pintura tipo trafico color blanco y amarillo con microesfera a razon de 700 gr/lit de pintura.

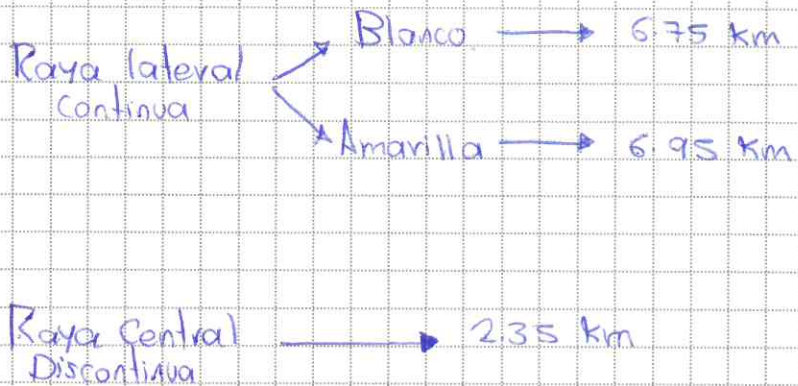

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Reencarpetao de GAZAS trebol
el Diez.

26 de Febrero del 2023.

- Se termina el marcado de vara
y se colocan las vialetas color blanca
y color amarilla reflejante por una
cara. Se colocaron un total de 482.00
piezas de cada una.

- Este día se dan por terminadas
los trabajos de reencarpetao de
GAZAS terminando con las anotaciones
de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA
