

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE



CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2025

FECHA:

25 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

PERIODO DE CONTRATO :

27 DE NOVIEMBRE DE 2025
31 DE DICIEMBRE DE 2025

INICIA
TERMINA

IMPORTE CONTRATADO :	\$ 7,769,696.17	CON I.V.A.
IMPORTE DE ANTICIPO :	\$ 3,884,848.09	CON I.V.A.

[illegible]

TOTALES	\$ 5,861,329.45	\$ -	\$ 2,930,664.73	\$ 2,930,664.73	\$ 2,930,664.72
---------	-----------------	------	-----------------	-----------------	-----------------

[illegible]

SALDO POR AMORTIZAR		\$ 954,183.36
---------------------	--	---------------

ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA
GERENTE TECNICO JUMAPAG
CONFORME

ING. YANNEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG
AUTORIZO

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

CONTRATISTA
ELABORO

ING. JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ PÉREZ
JEFE DE SUPERVISION

ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO
COORDINADOR DE P.C.O.

REVISO

Vo. Bo.



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$ 1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAGR356/2025

NO. DE OBRA: PR-25G096

IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,996.17

FECHA:

26 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		CANTIDAD DE OBRA		ESTIMACION		PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
			PROYECTO	ESTIMACION	HASTA ESTA ESTIMACION	ANTERIOR	ESTA ESTIMACION				
PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL HUTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.											
1.- REHABILITACION DE CARGAMO DE AGUAS CRUDAS											
1.1	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.55 X 0.75 M. CON MARCO DE ANGULAR 1" X 1" X 1/8" Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1/2" X 1/4". LAMINA ANTIDERRAPANTE.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00		\$ 3,439.15	\$ -	
1.2	REPARACION DE TUBERIA DE ASBESTOCEMENTO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE 1.00 M DE TUBERIA PVC HIDRAULICA RD-32.5 DE 6" DE DIAMETRO, 2 JUNTAS GILBULT DE 150 MM, EXCAVACIONES Y RELLENOS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 M	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00		\$ 6,314.88	\$ -	
1.3	DEMOLUCION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESPESOR DE 7 CMS.	M2	4.20	4.20		4.20	0.00		\$ 1,329.76	\$ -	
Total de PARTIDA			1.- REHABILITACION DE CARGAMO DE AGUAS CRUDAS								\$ -
2.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARGAMO DE AGUAS CRUDAS											
EQUIPOS DE BOMBEO											
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE BOMBEO QUE INCORPORA: BOMBA MARCA GORMAN RUPP CENTRIFUGA AUTOCENTRANTE PARA 50 LPS Y 15 M.C.A. SERIE ULTRA V MODELO V680B8 TALLADO 8" X 6" TALLADO: 8" X 6" 1203 MM X 154 MM) CARRETES BRIDADOS: CARGASA DE LA BOMBA: HIERRO GRIS NO. 30 MÁXIMA PRESION DE OPERACION 129 PSI (888 KPA) IMPULSOR TIPO SELLO: ABIERTO DE 2 ALABES- HIERRO DUCTIL 85-45-12 MANEJA SÓLIDOS ESPECÍFICOS DE 3" DE Ø (76.2 MM) EJE DEL IMPULSOR: ALEACION DE ACERO 4150. PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE: ACERO AL CARBON ASTM A36 TAPA FRONTAL AJUSTABLE SIN LAMINAS- HIERRO GRIS NO. 30 TAPA DE INSPECCION: HIERRO GRIS NO. 30 VALVULUA TIPO ALETA REMOVIBLE- NEOPRENO CON NYLON Y REFUERZO DE ACERO BRIDA DE SUCCION: HIERRO GRIS NO. 30 ASIENTO DE LA VALVULUA TIPO ALETA: HIERRO GRIS NO. 30 ALICATAMIENTO DE RODAMIENTOS: HIERRO GRIS NO. 30 PLATOS DEL SELLO: HIERRO GRIS # 30 MANGA DEL EJE: ALEACION DE ACERO 4130 RODAMIENTOS RADIALES Y DE EMPUJE: ABIERTOS DOBLE FILA, TIPO BOLA, LUBRICACION DE LAS CAMPAÑAS DEL SELLO Y DE LOS RODAMIENTOS: ACEITE SAE 30 NO DETERGENTE JUNTAS: BUNA-N, FIBRAS SINTÉTICAS COMPRESADAS, PTFE, FIBRA VEGETAL, CORCHO Y HULE, O-RINGS: BUNA-N, TORNILLERIA: ACERO ESTÁNDAR PLATEADO VALVULUA DE ALIVIO DE PRESION: LATON MIRELLAS INDEPENDIENTES INDICADORAS DE LOS NIVELES DE ACEITE PARA EL SELLO MECANICO Y LOS RODAMIENTOS ESPECIFICACIONES DEL SELLO TIPO CARTUCHO, MECANICO, LUBRICADO CON ACEITE, DOBLE FLOTACION, AUTOLINEABLE, CARAS ROTATORIA Y ESTACIONARIA DE CARBURO DE SILICIO, ASIENTO ESTACIONARIO EN ACERO INOXIDABLE NO. 316, ELASTOMEROS DE FLUOROCARBON (DUPONT VITON) O EQUIVALENTE, JALULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE NO. 1/8". TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO A BOMBEAR: 71°C (160°F), TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR LA BOMBA SE ACOPLARA POR MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A UN MOTOR ELÉCTRICO DE 20 HP, 230V, 60HZ., 1,750 RPM, ARMADON 2281, TIPO TCCV, PARA 3F., 230V/60W, 60HZ., TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE VERTICAL DE ACERO ESTRUCTURAL SOPORTANTE DE 150 LB. DE PESO, SE INCLUYE GUARDA BANDAS.	PZA	1.00	1.00		0.50	0.50		\$ 906,573.61	\$ 453,286.81	
NOTAS:											
CONFIRME: ING. GUASAVE, SINALOA											
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025.											
SUPERVISOR: ING. JUAN Y DENSEL LEYVA CERVANTES											
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG											
VOb: ING. JUAN MANUEL REYES GERARDO											
REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ											
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA											
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA											



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R3/56/2025

No. DE OBRA: PR-26GU056

IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,996.17

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	CANTIDAD DE OBRA HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE \$ IMPORTE TOTAL

PIEZAS ESPECIALES

2.2 SUAMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE RECURRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA.

ML

3.00

3.00

3.00

0.00

\$ 4,817.51

\$

2.3 SUAMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 8" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA.

ML

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 2,052.72

\$

2.4 SUAMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 8" #.

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 14,285.72

\$

2.5 SUAMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO RIGO DE 6" #

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 17,715.37

\$

2.6 SUAMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO. FO. DE 80° X 10" #

PZA

2.00

2.00

2.00

0.00

\$ 14,093.68

\$

2.7 SUAMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO FO BRIDADO DE 80° X 6" #

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 5,410.75

\$

2.8 SUAMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO. FO. DE 10" X 8" #

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 10,713.71

\$

2.9 SUAMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE ACERO AL CARBON DE 12" X 10" #, BRIDADA POR UN EXTREMO, (VER DETALLE EN PLANO)

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 14,384.55

\$

2.10 SUAMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 10" #

PZA

4.00

4.00

4.00

0.00

\$ 3,998.13

\$

2.11 SUAMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" #

PZA

3.00

3.00

3.00

0.00

\$ 2,538.66

\$

2.12 SUAMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" #

PZA

5.00

5.00

5.00

0.00

\$ 757.26

\$

2.13 SUAMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 8" #

PZA

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 520.95

\$

2.14 SUAMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" #

PZA

5.00

5.00

5.00

0.00

\$ 288.00

\$

2.15 SUAMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4"

PZA

40.00

40.00

40.00

0.00

\$ 124.20

\$

2.16 SUAMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"

PZA

48.00

48.00

48.00

0.00

\$ 78.03

\$

2.17 SUAMINISTRO E INSTALACION DE CORPE SOLDABLE DE 1/2" #.

PZA

2.00

2.00

2.00

0.00

\$ 308.77

\$

2.18 SUAMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.25X2" #.

PZA

2.00

2.00

2.00

0.00

\$ 502.24

\$

2.19 SUAMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 N (4") PARA UNA PRESION DE 12 KG/CM2 ROSCADO 53 MM (2") ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERFERE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO GOMINO.

PZA

2.00

2.00

2.00

0.00

\$ 3,240.66

\$

NOTAS:	LUGAR: GUASAVE, SINALOA	FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA
		SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES	REPRESENTANTE LEGAL
		SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG	
		Vbo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO	REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
		COORDINADOR DE PLANTACION Y CONTROL DE OBRA	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO. 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2025

No. DE OBRA: PR-25QU056

IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17

FECHA:

25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	2.- ARREGLO HIDRAULICO DE CARGAMO DE AGUAS CRUDAS				IMPORTE \$	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	Total de PARTIDA						\$	453,286.81
	3.- REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS							
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGAS DE LEGHO FILTRANTE DUAL DE ARENA SILICA (4000 kg) Y LEGHO DE SOPORTE Y DISTRIBUCION DE GRAVILOMETRIA ESCALONADA, PIEDRA BOLA (2 TON) # 4 (2 TON), # 3 (2 TON) # 2 (2 TON), # 1 (GRAVILLA) (2 TON) A PRESION DE SECCION TUBULAR, DIMENSIONES POR UNIDAD FILTRANTE 1.50 X 3.25 M, MANO DE OBRA.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 184,623.59	738,494.76
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA FLOCULACION O MEZCLA RAPIDA DE PVC COLOR GRIS DE 1.20 X 2.40 X 1/8", INCLUYE CORTES A LA MEDIDA	PZA	57.00	0.00	0.00	0.00	\$ 17,678.58	-
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER DE 6" # INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	PZA	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 11,942.16	119,421.60
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER DE 8" # INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 15,047.36	60,189.44
3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA	112.00	112.00	0.00	112.00	\$ 78.03	8,739.36
3.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS DE FLOCULACION, SEDIMENTACION Y FILTROS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	300.00	300.00	0.00	300.00	\$ 231.49	69,447.00
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	202.00	202.00	0.00	202.00	\$ 205.35	41,601.88
3.8	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO EN AREAS DE FLOCULACION Y SEDIMENTACION DE PLANTA POTABILIZADORA POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR, INCLUYE MANOBRAS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CELDAS.	HR	7.00	7.00	0.00	7.00	\$ 3,080.94	21,565.88
	Total de PARTIDA		3.- REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS			\$		1,059,459.92
	4.- REHABILITACION DE CARGAMO DE DISTRIBUCION							
4.1	DEMOLICION DE MUROS Y LOSA EN CASITA DE CARGAMO DE DISTRIBUCION EXISTENTE A BASE DE MUROS DE LADRILLO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM, INCLUYE CARGA Y RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.	M3	12.68	12.68	0.00	12.68	\$ 2,167.00	27,477.56
4.2	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLAMADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, INCLUYE ACABADO DE MATERIALES, APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL, DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	3.40	3.40	0.00	3.40	\$ 279.11	948.97
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PASA HOMBRE, SECCION DE 0.75X0.75 MTS, INCLUYE: TAPA METALICA DE PLACA DE ACERO DE 1/8", CON MARCO DE ANGULAR DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 3,204.61	3,204.61
4.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION 20X15 CM, A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" A CADA 20 CMS.	ML	17.00	17.00	0.00	17.00	\$ 808.35	13,742.12
4.5	CONSTRUCCION DE BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO FC= 200 KG/CM2, DE SECCION DE 0.50X0.50 MTS A BASE DE SARDINEL, DE SECCION DE 15X30 CMS.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 1,724.59	6,898.00
4.6	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN INTERIOR DE ESTRUCTURA DE CARGAMO DE DISTRIBUCION A BASE DE RECONDO DE 3/4" DE 3.50 MTS DE LONGITUD Y 40 CMS DE ANCHO, CON PELDAÑOS A CADA 30 CM, VERNIZ METALICO EN PLANO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,632.53	5,632.53
4.7								
NOTAS:								
CONFORME ING. CAUDIA MONICA CERVANTES LEYVA		LUGAR: GUASAVE, SINALOA						
		FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025						
		SUPERVISOR: ING. JUAN V. DENISE LEYVA CERVANTES						
		SUPERVISOR DE OBRAS: JUAN PABLO						
GERENCIA TECNICA		VBO: ING. JUAN MANUEL MEYRA GERARDO						
		COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA						
		REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ						
		JEFE DE SUPERVISION DE OBRA						

NOTAS:	
LUGAR: GUAYAVE, SINIATLOA	ELABORO
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	C. JESUS FELIX GARCIA
SUPERVISOR: ING. VIANET DENISE LEYVA CERVANTES	REPRESENTANTE LEGAL.
SUPERVISOR DE OBRAS: JUAN ANG	
VOTO: ING. JUAN MANUEL MORALES GERARDO	REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
CONFORME: ING. CLAUDIA MARTHA CERVANTES LEYVA	
GERENCIA TECNICA	

[illegible]

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2025	No. DE OBRA: PR-26GU056	FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,896.17		IMPORTE \$ 1,417,315.68

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN	HASTA ESTA	ESTIMACION	ESTA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			PROYECTO	ESTIMACION	ANTERIOR	ESTIMACION		
	EQUIPOS DE BOMBEO DISTRIBUCION CARACOL COLORABATO 12 LPS 40 MCA							
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL, TIPO TURBINA MARCA BUNJ, MODELO 8 AC PARA UN GASTO DE 12 LPS Y 40 MCA, DE 4 ETAPAS, LUBRICADA POR AGENTE COMPUESTA POR: CABEZA, DE DESCARGA, TIPO SOBRE SUPERFICIE MODELO 10X41X4" (LUBRICACION AGENTE), FABRICADO EN PLACA DE ACERO ASTM A-36, DESCARGA DE 4'0", INCLUYE FLECHA DE AJUSTE, ADECUADO PARA SOPORTAR MOTOR ELECTRICO DE 10HP, 3 METROS DE COLUMNA ROSCADA (LUBRICACION AGENTE) DE 4" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B, CON COSTURA, CEDULA 40, FLECHA DE TRANSMISION DE 1" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON SAE-1045, TUBO CUBRE FLECHA DE 1" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON CED 90, LOS TRAMOS DE COLUMNA SON DE 10 FT DE LONGITUD, 1 PIEZA, CUERPO DE TAZONES TIPO TURBINA, MODELO 8 AC, DE 4 ETAPAS, FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48 CL-30, IMPULSORES EN BRONCE SAE-40, LA FLECHA DE BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, ZONA HUMEDA DE TAZONES PORCELANIZADOS, 1 PIEZA, COLADOR TIPO CANASTA DE 4" Ø, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA MARCA US DE INDUCCION TIPO JAUJA DE ARDILLA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO, WP-1, ARMAZON 215 TP, DE 10HP, TRIFASICO, 230V/460V, 60HZ, 4 POLOS (1800RPM) DE ALTO EMPUJE AXIAL, CON BASE ESTILO "P" DE 10", EFICIENCIA PREMIUM, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, PARA OPERAR A 40°C DE TEMPERATURA AMBIENTE.	PZA	2.00	2.00	1.00	1.00	\$ 201,950.98	\$ 201,950.98
PIEZAS ESPECIALES								
5.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED. 40 DE 4" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE RECURRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTE Y SOLDADURA.	ML	12.00	12.00	12.00	0.00	\$ 2,609.79	\$ -
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PO FO DE 4" X4" Ø	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$ 4,789.31	\$ -
5.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFU BRIDADA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$ 2,209.49	\$ -
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 4" Ø	PZA	11.00	11.00	11.00	0.00	\$ 1,506.31	\$ -
NOTAS:								
			LUGAR: GUASAVE, SINALOA			ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA		
			FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025			REPRESENTANTE LEGAL		
			SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES					
			SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG					
			Vobo: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO			REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ ROSE		
			COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA			JEFE DE SUPERVISION DE OBRA		



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (POS)		PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025		IMPORTE: \$ 1,417,315.68	
OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)				CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.	
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA				CONTRATO N°: JUMAPAGR33/56/2025	
				No. DE OBRA: PR-25GU056	
				FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA		IMPORTE \$ 1,417,315.68	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	IMPORTE TOTAL
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESFICA PVC DE 4" ø	PZA	1.00	1.00	-
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE DE PVC DE 4" ø	PZA	1.00	1.00	-
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 0.15X2" ø.	PZA	3.00	3.00	-
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1/2"ø.	PZA	2.00	2.00	-
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.20X2" ø.	PZA	3.00	3.00	-
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.20 MTS.	PZA	2.00	2.00	-
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 4" ø.	PZA	2.00	2.00	-
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" ø CLASE 125 PSL	PZA	4.00	4.00	-
5.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" ø	PZA	3.00	3.00	-
5.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPLUSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO, MARCA ARL, MODELO D4040 P "BARAK", CUERPO DE ANTON REFORZADO, FLUOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA	3.00	3.00	-
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUIDO TIPO MECANICO, CON TOTALIZADOR Y PREPARACION DE LECTURA REMOTA, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO BRIDADO, VOLTMAN DOROT, DE DIAMETRO NOMINAL DE 4".	PZA	1.00	1.00	-
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2") ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERNE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO.	PZA	2.00	2.00	-
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" ø	PZA	15.00	15.00	-
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" ø	PZA	1.00	1.00	-
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3"	PZA	128.00	128.00	-
5.43	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATAQUE DE CONCRETO DE FC=250 KG/CM2, SECCION PERIMETRAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"x1/4" DE ESPESOR PARA SUECCION DE TUBO EN TREN DE DESCARGA.	PZA	2.00	2.00	-
NOTAS:					
LUGAR: GUASAVE, SINALOA					
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025					
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISSE LEVYA CERVANTES					
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG					
VBO: ING. JUAN MANUEL MEYER GERARDO					
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA					
ELABORO					
C. JESUS FELIX GARCIA					
REPRESENTANTE LEGAL					
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ					
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA					



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 1 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$ 1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LP9 (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2025

No. DE OBRA: PR-25GU056

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNITARIO	IMPORTE \$	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION			
5.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE DISTRIBUCION									
Total de PARTIDA							\$	930,901.00	
6.- CASETA DE CLORACION									
6.1	REHABILITACION DE CASETA DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR EN AREA DE MEZCLA DE PRODUCTO QUIMICO.	M2	11.83	11.83		0.00	\$	521.50	
6.2	LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	4.20	4.20		0.00	\$	1,216.54	
Total de PARTIDA			6.- CASETA DE CLORACION					\$	
7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA									
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO MARCA: WALLACE & TIERRAN, MODELO: 218S INTEGRADA A UN YUGO AUTO ALINEABLE DISEÑADO SEGUN EL DIBUJO 189 DEL INSTITUTO DEL CLORO Y CON UNA PERILLA INDICADORA DE 3 DIFERENTES MODOS DE OPERACION: MODO DE OPERACION NORMAL, MODO DE CILINDRO VACIO Y MODO DE VALVULA CERRADA, QUE PERMITE EL CAMBIO DE CILINDRO SIN QUE LE ENTRE POLVO, AIRE Y HUMEDAD. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONSIDERANDO: BASE SOPORTE PARA LOS CILINDROS DE GAS CLORO: TUBERIAS PVC CEBULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1.00	1.00		0.00	\$	175,039.75	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSPECTOR DE VACIO DE 3/4 MARCA: WALLACE & TIERRAN 280 A 300 PSI. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: TUBERIAS PVC CEBULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$	54,404.51	
7.3	SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL DE 3" CON ROTAMETRO DE 24 KG/DI, MARCA WALLACE & TIERRAN, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONSIDERANDO: TUBERIAS PVC CEBULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION, MANO DE OBRA.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$	58,501.57	
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS (POLIMERO) MARCA WALLACE & TIERRAN, MODELO ENCORE 700 SIMPLE CABEZAL, CON CABEZAL DE 2", CON CAPACIDAD DE 24 GPH A 175 PSI DE PRESION MAXIMA DE TRABAJO, MOTOR DE 1/2 HP, 115/230 V 1735 RPM. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, CONSIDERANDO: TUBERIAS PVC CEBULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, T, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	2.00		0.00	\$	258,730.57	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PREPARACION DE MEZCLAS PARA SULFATO Y POLIMERO QUE INCLUYE: 2 TANQUES DE PREPARACION DE 1100 LBS.	LOTE	1.00	1.00		0.00	\$	5,602.57	
Total de PARTIDA			7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA					\$	
8.1	8.- CASETA DE CONTROL DE LOS ELECTRICOS LIMPIEZA Y TRAZO EN OBRA CIVIL	M2	6.27	0.00		0.00		\$	23.44
NOTAS:									
LUGAR: GUASAVE, SINALOA									
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025									
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES									
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG									
Vbo: ING. JUAN MANUEL MERRIA GERRARDO									
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA									
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ									
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA									
ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA									
REPRESENTANTE LEGAL									
CONFORME ING. CLAUDIA MARTINA CERVANTES LEYVA									
GERENCIA TECNICA									

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS) PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025 IMPORTE: \$1417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA) CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUATUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2025		No. DE OBRA: PR-25GU056		FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,996.17		PRECIO		IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	
	CIMENTACION						
8.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	1.02	1.02		0.00	\$ 67.58
8.3	RELLENO AISLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	0.26	0.26		0.00	\$ 232.88
8.4	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE ESTRUCTURAL PARA CANchILLA CON ESPESOR DE 5 CM. MOLDE ACABADO DE MATERIALES PERTELOS.	M3	0.06	0.06		0.00	\$ 4,846.56
8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO DOSIFICADO Y PREMEZCLADO CON F'c=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1").	M3	0.43	0.43		0.00	\$ 8,361.34
8.6	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #4	KG	14.31	14.31		0.00	\$ 68.08
8.7	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3.	KG	13.42	13.42		0.00	\$ 68.08
8.8	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2	KG	7.43	7.43		0.00	\$ 67.35
8.9	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	1.76	1.76		0.00	\$ 579.10
	DALA DE DESPLANTE						
8.10	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2.	M3	0.19	0.19		0.00	\$ 4,221.80
8.11	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2	KG	6.14	6.14		0.00	\$ 67.85
8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3.	KG	16.10	16.10		0.00	\$ 68.08
8.13	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2	2.32	2.32		0.00	\$ 579.10
NOTAS:		LUGAR: GUASAVE, SINALOA					
		FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025					
		SUPERVISOR: ING. YANNEY DENISE LEYVA CERVANTES					
		SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG					
		VºBº: ING. JUAN MANUEL MENA GERAARDO					
		COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA					
		REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ					
		JEFE DE SUPERVISION DE OBRA					
		ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA					
		REPRESENTANTE LEGAL					
		CONFORME ING. CLAUDIA MARTIN CERVANTES LEYVA					
		GERENCIA TECNICA					

IMPORTE: \$1,417,315.68

Σ TOTAL[illegible]



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAGR3356/2025

NO. DE OBRA: PR-250U056

IMPORTE DE CONTRATO: 7789,696.17

FECHA:

25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
9.16	4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #	KG	5.00	0.00	0.00	0.00	\$ 669.11	\$ -
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 220.30	\$ -
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 479.52	\$ -
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 150 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 153,462.10	\$ -
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORILLO DOBLE ROSCA 5/8 X 20.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 212.71	\$ -
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORILLO MACUNA 5/8 X 6.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 202.92	\$ -
9.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 3".	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 556.10	\$ -
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 3"	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 278.52	\$ -
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 3" PARED GRUESA.	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 612.92	\$ -
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 3/0 AWG DE COBRE.	ML	300.00	0.00	0.00	0.00	\$ 296.34	\$ -
9.26	3" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE	PZA	10.00	0.00	0.00	0.00	\$ 304.13	\$ -
9.27	DE PRUEBAS. SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 13-20, CON TABLILLA	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 9,082.73	\$ -
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA TCS.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 10,443.59	\$ -
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CON ROSCA DE 3"	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 198.96	\$ -
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 3"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 278.52	\$ -
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO CIR DE 3"	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 450.13	\$ -
NOTAS:								
			LUGAR: GUASAVE, SINALOA			ELABORO		
			FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025			C. JESUS FELIX GARCIA		
			SUPERVISOR: ING. VIANEY DEJESSE LEYVA CERVANTES			REPRESENTANTE LEGAL		
			SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG					
			Vob: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERRARDO			REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ		
			COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA			JEFE DE SUPERVISION DE OBRA		

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		CONTRATO N°: JUMAPAGR3/56/2025		IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,986.17		FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	
PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA		IMPORTE		IMPORTE	
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO
9.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32200 A CIGABNETE.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 18,839.49
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 6,048.59
9.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 112.28
9.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX18MM PROTOCOLIZADA	TRAMO	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 675.70
9.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 442.86
9.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 3 PILG	PZA	10.00	0.00	0.00	0.00	\$ 193.46
	TIERRA FISICA EN DELTA SEPARACION 3M ENTRE ELECTRODO						
9.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX18MM PROTOCOLIZADA	TRAMO	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 675.70
9.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL	PZA	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 442.86
9.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DE COBRE DESNUDO	ML	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 293.54
	BAYA TENSION						
	EQUIPOS DE BOMBEO AGUAS CRUDAS 20HP						
9.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" ø.	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 408.72
9.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 1"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 98.47
9.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL 1"	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 230.96
9.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 1"	PZA	12.00	0.00	0.00	0.00	\$ 772.99
NOTAS:		LUGAR: GUASAVE, SINALOA		FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025		ELABORO C. JESUS FELIX GARCIA	
		SUPERVISO: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES		SUPERVISOR DE OBRAS: JUAN MANUEL PEREZ GABARDO		REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ	
		CONFORME ING. CLAUDIA MARTHA CERVANTES LEYVA		COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA		JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	
		GERENCIA TECNICA					



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL: 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAGR3/56/2025

IMPORTE DE CONTRATO: 7769,696.17

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				ESTIMACION PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION		
9.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC DE 1"6	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	\$ 222.83	\$ -
9.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE C/O CALIBRE 8 AWG	PZA	12.00	0.00	0.00	0.00	\$ 82.11	\$ -
9.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 8 AWG DE COBRE	ML	200.00	0.00	0.00	0.00	\$ 125.56	\$ -
9.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	50.00	0.00	0.00	0.00	\$ 102.55	\$ -
9.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1"	PZA	6.00	0.00	0.00	0.00	\$ 54.53	\$ -
9.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 127.59	\$ -
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUANTE DE 1"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 128.13	\$ -
9.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUANTE DE 1" Ø	ML	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 258.70	\$ -
9.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,070.75	\$ -
	EQUIPOS DE BOMBEO DE DISTRIBUCION HUTUSI 30HP					0.00		
9.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 1 1/4" ø.	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	\$ 177.91	\$ -
9.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUIT 18 DE 1 1/4"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 163.54	\$ -
9.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICAVAL 1 1/4".	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 230.96	\$ -
9.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA CANAL DE 1 1/4"	PZA	12.00	0.00	0.00	0.00	\$ 75.29	\$ -
9.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 209.39	\$ -
9.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE C/O CALIBRE 8	PZA	12.00	0.00	0.00	0.00	\$ 91.82	\$ -
NOTAS:			LUGAR: GUASAVE, SINALOA					
			FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025					
			SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE LETYIA CERVANTES					
			SUPERVISOR DE OBRAS: JUMAPAG					
			VOb: ING. JUAN MANUEL MEXENA GERARDO					
			COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA					
			ELABORO: C. JESUS FELIX GARCIA					
			REPRESENTANTE LEGAL					
			REVISOR: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ					
			JEFE DE SUPERVISION DE OBRA					

\$1,417,315.68

\$1,417,315.68

156

IMPORTE DE CONTRATO: 7.799.696,17							FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA			PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	
			SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR			ESTA ESTIMACION
9.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 6 DE COBRE	ML	150.00	0.00	0.00	\$	127.76 \$	-
9.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	50.00	0.00	0.00	\$	102.55 \$	-
9.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE PVC USO PESADO DE 1 1/2".	PZA	8.00	0.00	0.00	\$	92.42 \$	-
9.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1 1/4".	PZA	2.00	0.00	0.00	\$	83.33 \$	-
9.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUANTE DE 1 1/4".	PZA	4.00	0.00	0.00	\$	102.35 \$	-
9.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUANTE DE 1 1/4" Ø	ML	3.00	0.00	0.00	\$	343.74 \$	-
9.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO	PZA	2.00	0.00	0.00	\$	3.070,75 \$	-
	EQUIPOS DE DISTRIBUCION CARACOL COLORADO 18HP							-
9.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" ø.	PZA	20.00	0.00	0.00	\$	394.64 \$	-
9.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 3/4"	PZA	4.00	0.00	0.00	\$	97.57 \$	-
9.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICAL DE 3/4"	PZA	1.00	0.00	0.00	\$	475.96 \$	-
9.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICAL DE 3/4"	PZA	12.00	0.00	0.00	\$	96.43 \$	-
9.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" ø.	PZA	4.00	0.00	0.00	\$	128.92 \$	-
9.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE C/Ø CALIBRE 10 AWG	PZA	12.00	0.00	0.00	\$	68.28 \$	-
NOTAS:								
LUGAR: GUASAVE, SINALOA								
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025								
SUPERVISOR: ING. VIANEY DENNIS LEYVA CERVANTES								
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAO								
VOTO: ING. JUAN MANUEL MEDINA GERRARD								
COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA								
REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ								
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA								



CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION NO: 2 (DOS)

PERIODO DEL : 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPORTE: \$1,417,315.68

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N°: JUMAPAG/R3356/2025

NO. DE OBRA: PR-25QU056

IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17

FECHA:

25 DE DICIEMBRE DEL 2025

NUMERO	PARTIDA DESCRIPCION	UNIDAD	SEGUN	CANTIDAD DE OBRA HASTA ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
			PROYECTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
9.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML	150.00	0.00	0.00	0.00	\$ 102.95	\$ -
9.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 12 DE COBRE	ML	50.00	0.00	0.00	0.00	\$ 96.65	\$ -
9.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4"	PZA	8.00	0.00	0.00	0.00	\$ 52.57	\$ -
9.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 104.58	\$ -
9.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR UCUANTE DE 3/4"	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	\$ 120.88	\$ -
9.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO UCUANTE DE 3/4" Ø	ML	3.00	0.00	0.00	0.00	\$ 225.35	\$ -
	ALUMBRADO							
9.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X50 AMP S.D.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,152.51	\$ -
9.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X70 AMP S.D.	PZA	2.00	0.00	0.00	0.00	\$ 3,152.51	\$ -
9.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO 10 KVA 440/220/110 V.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	\$ 27,959.56	\$ -
Total de PARTIDA 9.- OBRA ELECTRICA								\$ -
TOTAL DE ESTIMACION								\$ 2,443,647.73

LUGAR: GUASAVE, SINALOA

FECHA: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

SUPERVISOR: ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

Vbo: ING. JUAN MANUEL ARENAL GERRARDO

COORDINADOR DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRA

ELABORO

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

CONFORME ING. CLAUDIA MARTIN CERVANTES LEYVA
GERENCIA TECNICA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUATUSIL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,698.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/59/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-26GU0056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL HUATUSIL, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										
	1.- REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS CRUDAS										
1.1	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.65 X 0.75 M CON MARCO DE ANGULAR 1" X 1" X 1/8" Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", LAMINA ANTIDERRAPANTE.	PZA								0.00	PZA
1.2	REPARACION DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE 1.00 M DE TUBERIA PVC HIDRAULICA, RD-32.6 DE 6" DE DIAMETRO, 2 JUNTAS GILBAULT DE 160 MM, EXCAVACIONES Y RELLENOS A UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 M	LOTE								0.00	LOTE
1.3	DEMOLICION Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESPESOR DE 7 CMS	M2								0.00	M2
	2.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS CRUDAS										
	EQUIPOS DE BOMBEO										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE BOMBEO QUE INCORPORA BOMBA MARCA GORMAN RUPP CENTRIFUGA AUTOCENTRANTE PARA 50 LPS Y 1.5 M.C.A. SERIE ULTRA Y MODELO VARGA-TAMANO 8" X 8" TAMANO 8" X 8" 1203 MM X 154 MM) CARRETES BRIDADOS, CARGASA DE LA BOMBA, HIERRO GRIS NO. 30, MAXIMA PRESION DE OPERACION 129 PSI (889 KPA) IMPULSOR TIPO SEMI-ABIERTO DE 2 ALABES, HIERRO DUCTIL 66-45-12 MANEJA SOLIDOS ESFERICOS DE 3" DE Ø (76.2 MM) EJE DEL IMPULSOR: ALEACION DE ACERO 4150, PLATO DE DESGASTE REEMPLAZABLE, ACERO AL CARBON ASTM A36 TAPA FRONTAL AJUSTABLE SIN LAINAS, HIERRO GRIS NO. 30 TAPA DE INSPECCION, HIERRO GRIS NO. 30 VALVULA TIPO ALETA REMOVIBLE, NEOPRENO CON NYLON Y REFUERZO DE ACERO BRIDA DE SUCCION, HIERRO GRIS NO. 30 ASIENTO DE LA VALVULA TIPO ALETA, HIERRO GRIS NO. 30 ALACIMIENTO DE RODAMIENTOS, HIERRO GRIS NO. 30 PLATOS DEL SELLO, HIERRO GRIS # 30 MANGA DEL EJE, ALEACION DE ACERO 4130 RODAMIENTOS RADIALES Y DE EMPUJE, ABIERTOS DOBLE FILA, TIPO BOLA LUBRICACION DE LAS CAVIDADES DEL SELLO Y DE LOS RODAMIENTOS, ACEITE SAE 30 NO DETERGENTE JUNTAS, BUWAN, FIBRAS SINTETICAS COMPRIMIDAS, EPTE, FIBRA VEGETAL, CORCHO Y HULE, O-RINGS, BUWAN, TORILLERIA, ACERO ESTANDAR, PLATEADO VALVULA DE ALIVIO DE PRESION, LATON MIRILLAS INDEPENDIENTES INDICADORAS DE LOS NIVELES DE ACEITE PARA EL SELLO MECANICO, LUBRICADO CON ACEITE, DOBLE FLOTACION, AUTOLUBRIZABLE, CARAS EN ACERO INOXIDABLE NO. 316, ELASTOMEROS DE FLUOROCARBON (DUPONT VITON® O EQUIVALENTE), JULIA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE NO. 18-8 TEMPERATURA MAXIMA DE LIQUIDO A BOMBLEAR: 71°C (158°F) TIPO DE ACOPLAMIENTO Y MOTOR LA BOMBA SE ACOPLARA POR MEDIO DE POLEAS Y BANDAS A UN MOTOR ELECTRICO DE 20 HP 4 POLOS, 1750 RPM, ARMAZON 238T, TIPO TCCV, PARA 3F., 230/460V., 60HZ, TODO ESTO MONTADO SOBRE BASE VERTICAL DE ACERO ESTRUCTURAL, SOPORTANTE DE LA UNIDAD, SE INCLUYE GUARDA BANDAS.	PZA						0.50	0.50	0.50	PZA

AUTORIZO: ING. VANEEY DENESSE LEYVA CERVANTES

ELABORO: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISO: ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL MUTUISI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,886.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/59/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 2 (POS)
NO. DE OBRA: PR-256U096
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	PIEZAS ESPECIALES										
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE RECURRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA	ML						0.00			ML
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA	ML						0.00			ML
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO. FO. DE 90° X 10" s.	PZA						0.00			PZA
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FO BRIDADO DE 90° X 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO. FO. DE 10" X 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION EXCENTRICA DE ACERO AL CARBON DE 12" X 10" s. BRIDADA POR UN EXTREMO. (VER DETALLE EN PLANO)	PZA						0.00			PZA
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 10" s.	PZA						0.00			PZA
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" s.	PZA						0.00			PZA
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" s.	PZA						0.00			PZA
2.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4"	PZA						0.00			PZA
2.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA						0.00			PZA
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1/2" s.	PZA						0.00			PZA
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.25X2" s.	PZA						0.00			PZA
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2") s. ACERO INOXIDABLE. NEMA 4X, TIPO INTERPERE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO.	PZA						0.00			PZA
3.- REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS											
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGAS DE LECHEO FILTRANTE DUAL DE ARENA SILICA (4000 kg) Y LECHEO DE SOPORTE Y DISTRIBUCION DE GRANULOMETRIA ESCALONADA PIEDRA BOLA (2 TON) # 4 (2 TON) # 3 (2 TON) # 2 (2 TON) # 1 GRAVILLA (2 TON) A PRESION DE SECCION TUBULAR, DIMENSIONES POR UNIDAD FILTRANTE 1.50 X 3.25 M. MANO DE OBRA	PZA						4.00	4.00	4.00	PZA
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA FLOCULACION O MEZCLA RAPIDA DE PVC COLOR GRIS DE 120 X 240 X 4, INCLUYE CORTES A LA MEDIDA	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PINEZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR35692025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION (NO. 2 IDOS)
No. DE OBRA: PR-2590056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER DE 6" # INCLUIRE RETIRO DE LA EXISTENTE	PZA						10.00	10.00	10.00	PZA
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER DE 8" #	PZA						4.00	4.00	4.00	PZA
3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 1/2"	PZA						112.00	112.00	112.00	PZA
3.6	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN AREAS DE FLOCULACION, SEDIMENTACION Y FILTROS, INCLUIRE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M2						300.00	300.00	300.00	M2
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS INCLUIRE: LIMPIEZA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	M2						202.00	202.00	202.00	M2
3.8	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO EN AREAS DE FLOCULACION Y SEDIMENTACION DE PLANTA POTABILIZADORA POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR. INCLUIRE MANIOBRAS DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE CELDAS	HR						7.00	7.00	7.00	HR
	4.- REHABILITACION DE CARGAMO DE DISTRIBUCION										
4.1	DEMOLICION DE MUROS Y LOSA EN CASITA DE CARGAMO DE DISTRIBUCION EXISTENTE A BASE DE MUROS DE LADRILLO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM, INCLUIRE CARGA Y RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM.	M3						12.68	12.68	12.68	M3
4.2	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3. INCLUIRE ACABADO DE MATERIALES.	M2						3.40	3.40	3.40	M2
4.3	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETIL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUIRE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2						3.40	3.40	3.40	M2
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PASA HOMBRE, SECCION DE 0.75X0.75 MTS. INCLUIRE TAPA METALICA DE PLACA DE ACERO DE 1/8". CON MARCO DE ANGULAR DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/4". INCLUIRE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
4.5	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION 20X16 CM. A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 4 VARRILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS.	ML						17.00	17.00	17.00	ML
4.6	CONSTRUCCION DE BASE PARA EQUIPO DE BOMBEO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2, DE SECCION DE 0.50X0.50 MTS A BASE DE SARDINEL DE SECCION DE 15X30 CMS.	PZA						4.00	4.00	4.00	PZA
4.7	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN INTERIOR DE ESTRUCTURA DE CARGAMO DE DISTRIBUCION A BASE DE REDONDO DE 3/4" DE 3.50 MTS DE LONGITUD Y 40 CMS DE ANCHO, CON Peldaños A CADA 30 CMS (VER DETALLE EN PLANO). INCLUIRE RETIRO DE LA EXISTENTE.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VANNEY BENISSE JENYA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

CONTRATISTA

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GLASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,686.17

PROGRAMA: RAMO 33

CONTRATO N°: JUMAPAGR33/59/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 2 (POS)

No. DE OBRA: PR-26GU056

PERIODO DE ESTIMACION:

11 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	8.- ARREGLO HIDRAULICO EN CARGAMO DE DISTRIBUCION										
	EQUIPOS DE BOMBEO DISTRIBUCION HUITUSI 20 LPS 70 MCA										
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL PARA UN GASTO DE 20 LPS Y 70 MCA, A BASE DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BRU, MODELO BRN, DE 8 ETAPAS, LUBRICADA POR ACEITE, COMPUERTA POR: 1 PIEZA, CABLEZAL DE DESCARGA, TIPO SOBRE SUPERFICIE, MODELO 12X676F (LUBRICACION ACEITE), FABRICADO EN PLACA DE ACERO ASTM A-36, DESCARGA DE 6" Ø, ADECUADA PARA SOPORTAR MOTOR ELECTRICÓ DE 40 HP, INCLUYE FLECHA DE AJUSTE TRES METROS DE COLUMNA ROSQUETA (LUBRICACION ACEITE) DE 6" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A-36, BR. B, CON CORDON DE 40' DE LARGO, EN LA COLUMNA ROSQUETA, FABRICADA EN ACERO AL CARBON SAE-1045, TIPO CUBRE FLECHA DE 2 PULG. FABRICADA EN ACERO AL CARBON CED 40, LOS TRAMOS DE COLUMNA SON DE 10 FT DE LONGITUD, 1 PIEZA, CIERRO DE TAZONES TIPO TURBINA, MODELO BRN DE 8 ETAPAS FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48 CL-30, IMPULSORES EN BRONCE SAE-40, LA FLECHA DE BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, ZONA HUMEDA DE TAZONES PORCELANIZADOS, 1 PIEZA, COLADOR TIPO CONICO DE 6" Ø, 1 PIEZA, MOTOR ELECTRICÓ VERTICAL, FLECHA, HUECA MARCA US MOTORS CON POTENCIA DE 30HP, 3F, 480V, 60HZ, 1800RPM, DE INDUCCION TIPO JAULA DE ARDILLA, DE ALTO EMPUJE AXIAL DE 5,700 KGS, EFICIENCIA PREMIUM, PARA OPERAR A 40°C DE TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA, TIPO UAS, FACTOR DE SERVICIO 1.15, CON TRINQUETE DE NO RETROCESO.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, MARCA EQUIELECTRONICS PARA UN GASTO DE CARGAMO DE 440V, OPERA DOS MOTORES DE 10HP DOS MOTORES DE 15HP Y DOS MOTORES DE 20HP, POR NIVELES, CLIENTA CON ARRANQUE A TENSION PLENA Y PROTECCION POR BAJO NIVEL, PROTECCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, CENSA POR MEDIO DE INTERRUPTORES DE NIVEL TIPO PERA, ENSAMBLADO CON: CONTROL, ELECTRONICO, COMBINACIONES DE ARRANCADOR A TENSION PLENA, CONTROL, ELECTRONICO, COMBINACIONES DE ARRANCADOR A TENSION PLENA, SELECTORES DE OPERACION MANO FUERA AUTO DE 22 MM Ø, LUCES PILOTO DE BOMBA OPERANDO DE 22 MM Ø A 12VCA EN COLOR VERDE, TABLILLA TERMINAL DE CONEXIONES, GABINETE METALICO PARA SERVICIO INDUSTRIAL, FABRICADO EN ACERO AL CARBON CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA HORNEADA, MANUAL DE OPERACION E INSTALACION DEL TABLERO, INCLUYE DIAGRAMAS	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
	PIEZAS ESPECIALES										
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO CED. 40 DE 6" DE DIAMETRO 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE PROTECCION ANTICORROSIVA, PINTURA, CORTES Y SOLDADURA	ML								0.00	ML
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO. FO. DE 6" X 6" s	PZA								0.00	PZA
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOFU BRIDADA DE 6"	PZA								0.00	PZA
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 6" s	PZA								0.00	PZA

AUTORIZO:

ELABORO:

REVISO:

ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

C. JESUS FELIX GARCIA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

CONTRATISTA

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES



OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,698.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR36/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (POS)
No. DE OBRA: PR-25G0056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 6" ø	PZA						0.00			PZA
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE DE PVC DE 6" ø	PZA						0.00			PZA
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 0.19X7ø.	PZA						0.00			PZA
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1/2".	PZA						0.00			PZA
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.20X7ø.	PZA						0.00			PZA
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.20 MTS.	PZA						0.00			PZA
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 6" ø.	PZA						0.00			PZA
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIGO DE 6" ø	PZA						0.00			PZA
5.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" ø	PZA						0.00			PZA
5.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO, MARCA ARI, MODELO D-040 P "BARAC", CUERPO DE NYLON REFORZADO, FLOTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO, ROSCADA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA						0.00			PZA
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUIDO TIPO MECANICO TIPO TURBINA, CON TOTALIZADOR Y PREPARACION DE LECTURA REMOTA, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO BRIDADO, WOLTMAN DOROT, DE DIAMETRO NOMINAL DE 162.4 MM (6")	PZA						0.00			PZA
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2") ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO.	PZA						0.00			PZA
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" ø	PZA						0.00			PZA
5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" ø	PZA						0.00			PZA
5.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA						0.00			PZA
5.22	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE PC= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 47X1/4" DE ESPESOR PARA SUECCION DE TUBO EN TREN DE DESCARGA.	PZA						0.00			PZA

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISE LEIVA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR356/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 2 (POS)
No. DE OBRA: PR-256U096
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	EQUIPOS DE BOMBEO DISTRIBUCION CARACOL COLORADITO 12 LPS 40 MCA										
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNU MODELO 8 AC PARA UN GASTO DE 12 LPS Y 40 M.C.A., DE 4 ETAPAS, LUBRICADA POR ACEITE COMPLETA POR CAJETAZAL DE DESCARGA, TIPO SOBRE SUPERFICIE MODELO 10X4X4" (LUBRICACION ACEITE), FABRICADO EN PLACA DE ACERO ASTM A-36, DESCARGA DE 47", INCLUYE FLECHA DE AJUSTE, ADECUADO PARA SOPORTAR MOTOR ELECTRICO DE 10HP, 3 METROS DE COLUMNA ROSCADA (LUBRICACION ACEITE) DE 4" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A53 GR. B, CON COSTURA PERDIDA 40, FLECHA DE TRANSMISION DE 1" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON ASTM A53 GR. B, SOBRE LA COLUMNA DE 4" Ø, FABRICADA EN ACERO AL CARBON CERO 80, LOS TORNILLOS DE COLUMNA SON TIPO TORNILLO DE AL CARBON CERO 80, LOS TORNILLOS TIPO TURBINA, MODELO 8 AC DE 4 ETAPAS, FABRICADO EN FIERRO FUNDIDO ASTM A-48 CL-30, IMPULSORES EN BRONCE SAE-40, LA FLECHA DE BOMBA ES DE ACERO INOXIDABLE AISI 416, ZONA HUMEDA DE TAZONES PORCELANIZADOS, 1 PIEZA, COLADOR TIPO CANASTA DE 4" Ø, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA MARCA US DE INDUCCION TIPO JALIA DE ARDILLA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, WP-1, ARMAZON 215 TP, DE 10HP, TRIFASICO, 280V/480V, 60HZ, 4 POLOS (1800RPM) DE ALTO EMPUJE AXIAL, CON BASE ESTILO "P" DE 10", EFICIENCIA PREMIUM, FACTOR DE SERVICIO DE 1.15, PARA OPERAR A 40°C DE TEMPERATURA AMBIENTE.	PZA						1.00	1.00	1.00	PZA
	PIEZAS ESPECIALES										
5.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CERO 40 DE 4" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTE Y SOLDADURA.	ML								0.00	ML
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FO FO DE 4" X4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE FOGO BRIDADA DE 4" DE DIAMETRO.	PZA								0.00	PZA
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE DE PVC DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 0.15X2" Ø	PZA								0.00	PZA
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORLE SOLDABLE DE 1/2" Ø	PZA								0.00	PZA
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR UN EXTREMO DE 0.20X2" Ø	PZA								0.00	PZA
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.20 NTS	PZA								0.00	PZA
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 4" Ø CLASE 125 PSI.	PZA								0.00	PZA
5.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 2" Ø	PZA								0.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES



OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,799,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR33/69/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO. 2 (005)
No. DE OBRA: PR-25GU056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
5.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPAULSION Y ELIMINACION DE AIRE DE 7" DE DIAMETRO PARA EL SELLADO P. BARAK. CUERPO DE NYLON REFORZADO. FILTADOR DE ESPUMA DE POLIPROPILENO ROSCADA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.	PZA								0.00	PZA
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO TIPO MECANICO, CON TOTALIZADOR Y PREPARACION DE LECTURA REMOTA. CUERPO EN HIERRO FUNDIDO BRIDADO, VOLTMAN DOROT, DE DIAMETRO NOMINAL DE 4".	PZA								0.00	PZA
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0.7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/2") ACERO INOXIDABLE. NEMA 4X, TIPO INTERPERE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO.	PZA								0.00	PZA
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø	PZA								0.00	PZA
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE Ø8 X 3	PZA								0.00	PZA
5.43	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE FC= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL, ARMADA CON VARILLA DE 3Ø DE 0.90 X 0.90 X 0.80 MTS. BASE SUPERIOR DE 30 CMS. INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLETA DE 47X14" DE ESPESOR PARA SUECCION DE TUBO EN TREN DE DESCARGA.	PZA								0.00	PZA
	8.- CASETA DE CLORACION										
	REHABILITACION DE CASETA										
6.1	DEMOLICION DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR EN AREA DE MEZCLA DE PRODUCTO QUIMICO.	M2								0.00	M2
6.2	LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3Ø A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2								0.00	M2

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEON CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

CONTRATISTA

JEF. DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES



ESTIMACION NO: 2 (DOS)

No. DE OBRA: PR-269U066

PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA,
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,996.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR3399/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	7.- EQUIPAMIENTO DE CLORACION EN PLANTA POTABILIZADORA										
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE VACIO MARCA WALLACE & TIERNAN, MODELO: 2108 INTEGRADA A UN VUO AUTO ALINEABLE DISEÑADO SEGUN EL DIBUJO 189 DEL INSTITUTO DEL CLORO Y CON UNA PERILLA INDICADORA DE 3 DIFERENTES MODOS DE OPERACION: MODO DE OPERACION NORMAL, MODO DE CILINDRO VACIO Y MODO DE VALVULA CERRADA QUE PERMITE EL CERRADO DE CILINDRO SIN QUE LE ENTRE POLVO, CERRANDO LA MANGUERA Y LOS TUBOS EN LOS ENLACE Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: • TUBERIAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, TT, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE							0.00	LOTE	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INYECTOR DE VACIO DE 3/4 MARCA WALLACE & TIERNAN 200 A 300 PSI. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: TUBERIAS CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, TT, VALVULAS, ETC. PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							0.00	PZA	
7.3	SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL DE 3" CON ROTAMETRO DE 24 KG/DIA, MARCA WALLACE & TIERNAN, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: • TUBERIAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, TT, VALVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACION. MANO DE OBRA	PZA							0.00	PZA	
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DOSIFICADORA DE LIQUIDOS (POLIMEROS) MARCA WALLACE & TIERNAN, MODELO ENCORE 770 SIMPLE CAJAZAL CON CAJAZAL DE 2" CON CAPACIDAD DE 24 GPH A 175 PSI DE PRESION MAXIMA DE TRABAJO, MOTOR DE 1/2 HP, 115/230 V Y 1725 RPM. INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSIDERANDO: • TUBERIAS PVC CEDULA 40 Y COMPONENTES HIDRAULICOS COMO CODOS, TT, VALVULAS, ETC., PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							0.00	PZA	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PREPARACION DE MEZCLAS PARA SULFATO Y POLIMERO QUE INCLUYE: 2 TANQUES DE PREPARACION DE 1100 LTS.	LOTE							0.00	LOTE	
8.1	8.- CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS	M2								0.00	M2

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAGR3562025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-25GU056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
8.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3								0.00	M3
8.3	RELLENO ARISOMADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3								0.00	M3
8.4	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 PARA PLANTILLA CON ESPESOR DE 5 CM. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES PETREOS	M3								0.00	M3
8.5	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO POSICIONADO / PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2, CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, VIBRADO Y CURADO, CON TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 2.54 CM (1")	M3								0.00	M3
8.6	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #4	KG								0.00	KG
8.7	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3	KG								0.00	KG
8.8	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2	KG								0.00	KG
8.9	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2								0.00	M2
	DALA DE DESPLANTE										
8.10	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2	M3								0.00	M3
8.11	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #2	KG								0.00	KG
8.12	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3	KG								0.00	KG
8.13	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2								0.00	M2
	MUROS										
8.14	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 7 X14X28 CM, JUNTADO CON MORTERO CEM-ARENA, CON PROPORCION 1:3 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, FABRICACION DE MORTERO Y MANO DE OBRA	M2								0.00	M2

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENNIS LEIVA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS OPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33562025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO. 2 (POS)
No. DE OBRA: PR-259U056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
	CASTILLOS										
8.15	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=160 KG/CM2	M3						0.00			M3
8.16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO ARMEX PARA CASTILLOS, DE 15 X 15 CMS	ML						0.00			ML
8.17	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2						0.00			M2
	LOSA										
8.18	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3						0.00			M3
8.19	CONCRETO PREMEZCLADO F' C=160 KG/CM2	M3						0.00			M3
8.20	SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO DE VARILLA DE ACERO #3.	KG						0.00			KG
8.21	SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO TIPO MALLA LAC, PARA LOSA INFERIOR (PISO)	M2						0.00			M2
8.22	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN CIMBRADO Y DECIMBRADO EN: ZAPATAS Y DADOS, DALA DE DESPLANTE, CASTILLOS, COLUMNAS, LOSA SUPERIOR Y, LOSA INFERIOR, ACABADO TIPO COMUN DE SEGUNDA MANO.	M2						0.00			M2
	ACABADOS										
8.23	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANDADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, INCLUYE ACABADO DE MATERIALES.	M2						0.00			M2
8.24	APLICACION DE PINTURA VINILICA DE COLOR BLANCO EN MUROS, LOSAS Y PRETL DE LOSA SUPERIOR A DOS MANOS, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2						0.00			M2
8.25	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION.	M2						0.00			M2
8.26	INTERVENIABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2						0.00			M2

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33592205
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (005)
No. DE OBRA: PR-2660056
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
8.27	PROTECCION EN EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CASITA DE CONTROLES, FABRICADA CON LAMINA ESTRADA CALIBRE 8 CON DOS PUERTAS DE ABATIMIENTO EXTERIOR DE 2.00 X 1.00 MTS. CADA UNA, CON CHAPA PAVIL, PINTURA ROJO OXIDO, MARCO Y CONTRAMARCO DE PERIL PIR Y 6 BISAGRAS DE T-8, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION.	PZA								0.00	PZA
8.28	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO, APAGADOR Y CONTACTO DE 110 VOL.T. CON CALA, OCTAGONAL, CABLE #10, CALA CHALUPA DE DOS VENTANAS, APAGADOR, CONTACTO O ROSETA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA								0.00	PZA
8.29	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES PERIMETRALES EN OBRA CIVIL DE 0.80 M DE ANCHO Y 7 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA LAC 8X6-10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	ML								0.00	ML
	9.- OBRA ELECTRICA										
	SUBESTACION ELECTRICA										
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE MADERA PM-14.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO PT 250	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE	KG						0.00	0.00	0.00	KG
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLEJE GALVANIZADO 3/8"	ML						0.00	0.00	0.00	ML
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLA GALVANIZADA PARA FLEJE	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO PR 200 GALVANIZADA	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARRILLA METALICA PARA DOBLE POSTE.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV-1	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LERMA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33562225
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (DCS)
No. DE OBRA: PR-26G0066
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8X1/2	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTE RAYOS 27 KV.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE DE 34.5 KV.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 4	KG						0.00	0.00	0.00	KG
9.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBO DE COBRE 4	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 150 KVA 34.5 KV/440 V 3F TIPO COSTA ENFRIADO POR ACEITE CON PROTOCOLO, NORMA CFE.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DOBLE ROSCA 5/8 X 20.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 5/8 X 6.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA GALVANIZADA DE 3".	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 3"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 3" PARED GRUESA	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 30 AWG DE COBRE	ML						0.00	0.00	0.00	ML
9.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC USO PESADO DE 3" #.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION 13-20, CON TABLILLA DE PRUEBAS	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA TCS	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE GALVANIZADO CON ROSCA DE 3"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 3"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO CR DE 3"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 A C/GABINETE	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE ANGULO PARA SOPORTE EQUIPO DE MEDICION E INTERRUPTOR GENERAL	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VANEY DENISSE LEIVA CERVANTES

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

CONTRATISTA

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

NUMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,686.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR3359/2025
DEPENDENCIA ELECTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (005)
NO. DE OBRA: PR-256055
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
									PARCIAL	TOTAL	
9.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO						0.00	0.00	0.00	TRAMO
9.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 3 PLG	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
	TIERRA FISICA EN DELTA SEPARACION 3M ENTRE ELECTRODO										
9.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 3MX16MM PROTOCOLIZADA	TRAMO						0.00	0.00	0.00	TRAMO
9.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW 1/0 DE COBRE DESNUDO	ML						0.00	0.00	0.00	ML
	BALSA TENSION										
	EQUIPOS DE BOMBEO AGUAS CRUDAS 20HP										
9.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" s.	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 18 DE 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICAVAL 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICAVAL DE 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PVC DE 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 8 AWG	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 8 AWG DE COBRE	ML						0.00	0.00	0.00	ML
9.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE	ML						0.00	0.00	0.00	ML
9.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT 1" PARED GRUESA	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LIQUATITE DE 1"	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA
9.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LIQUATITE DE 1" Ø	ML						0.00	0.00	0.00	ML
9.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTROCO	PZA						0.00	0.00	0.00	PZA

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISE NEVIA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/56/2026
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-26GU066

PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVEGIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAGR33/66/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-26GU066

PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

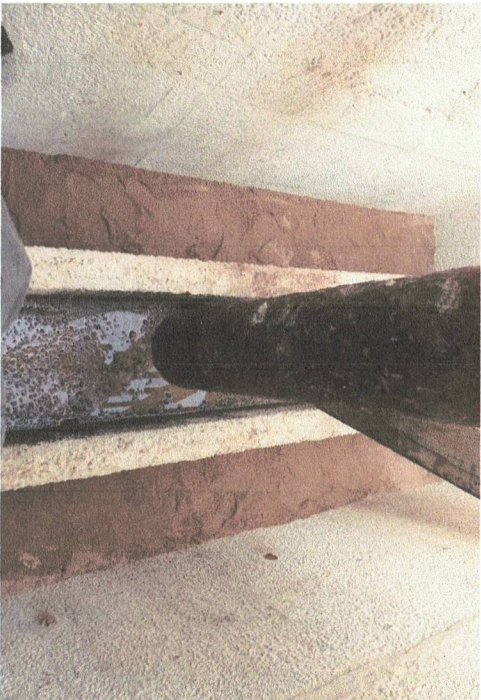

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LERVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/66/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-25GU056

PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

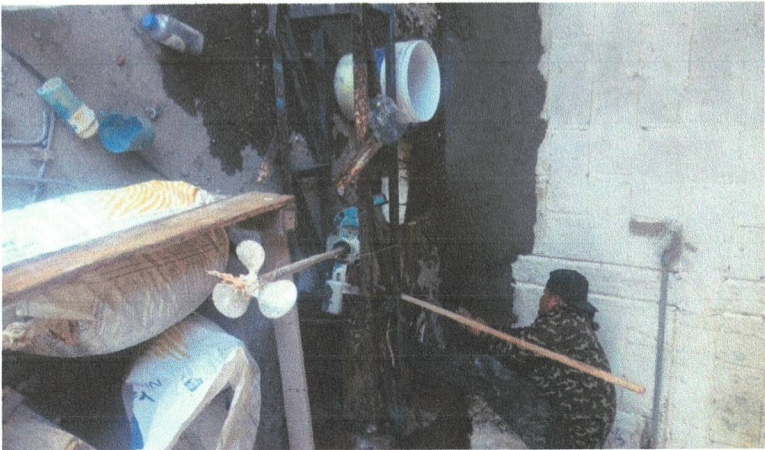

AUTORIZO:
 ING. VIANEY DENISSE NEVIA CERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
 C. JESUS FELIX GARCIA
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO


OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/6/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-26GU066

PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

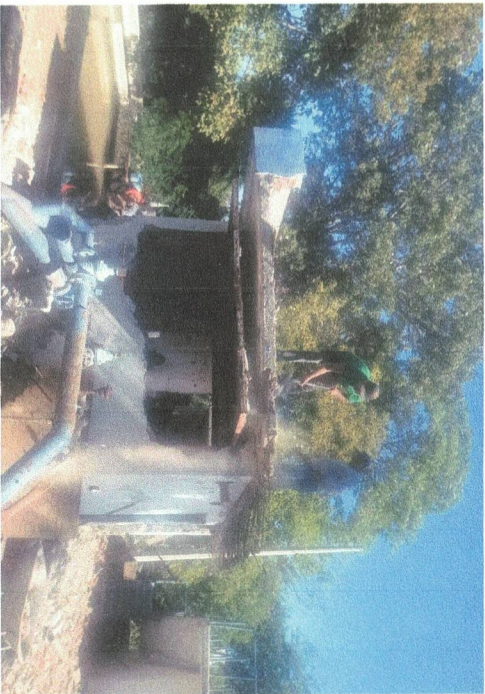

AUTORIZO:
 ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
 SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
 CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
 C. JESUS FELIX GARCIA
 CONTRATISTA

REVISO:
 ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/66/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-26GU066
 PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LERMA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSÉ DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE EL HUITSUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/66/2026
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-26GU066
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

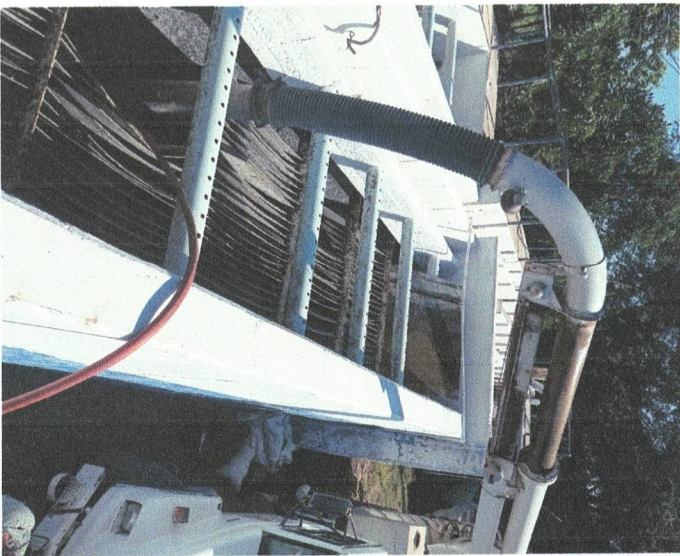

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,686.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°. JUMAPAG/R33/56/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

ESTIMACION NO: 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-25GU056

PERIODO DE ESTIMACION:

11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025



CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	



AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSA LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVECCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
 UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITSUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
 IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
 PROGRAMA: RAMO 33
 CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/66/2025
 DEPENDENCIA EJECUTORIA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (DOS)
 No. DE OBRA: PR-26GU066
 PERIODO DE ESTIMACION:
 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

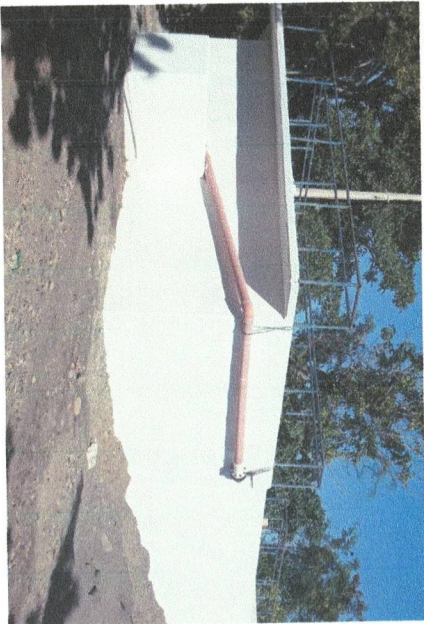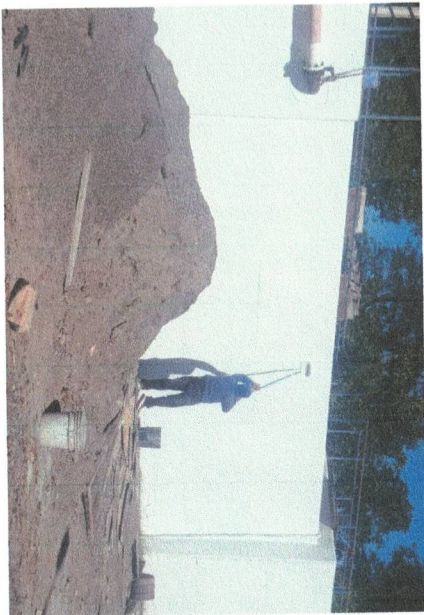

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEIVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA


CROQUIS

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/66/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO: 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-25GU066
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

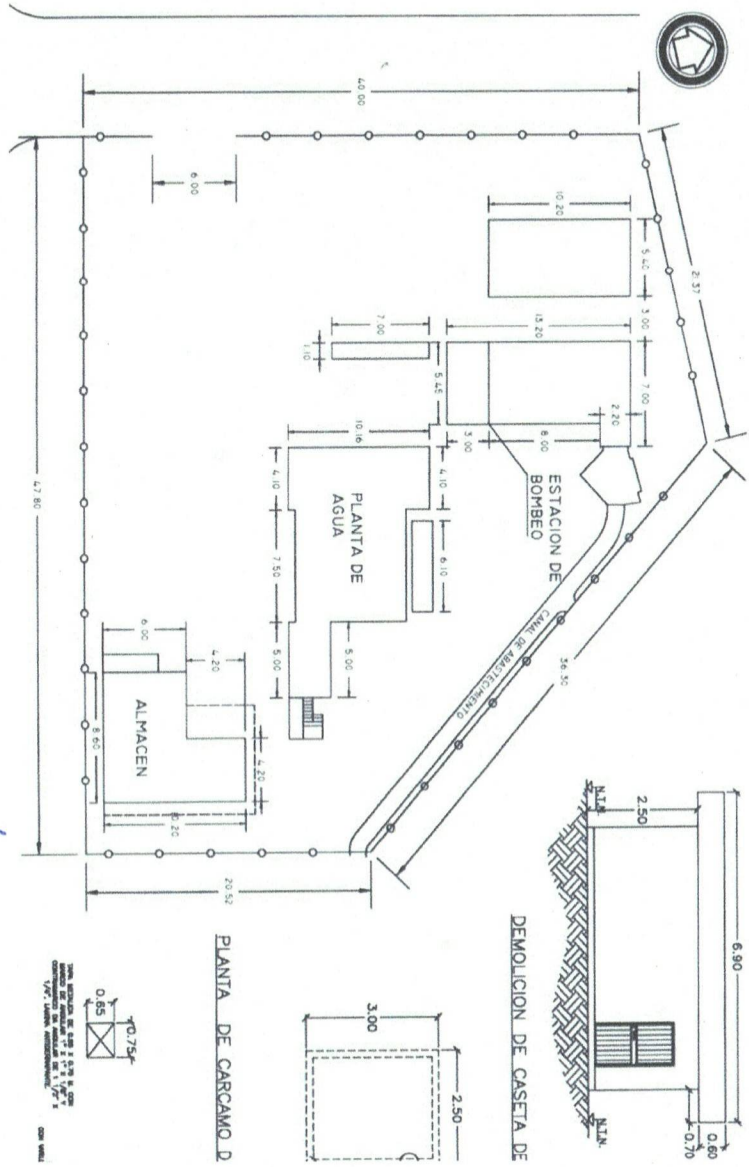

AUTORIZO:

ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:

CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

REVISO:

ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA




CROQUIS

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAG/R33/66/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG



ESTIMACION NO.: 2 (DOS)
No. DE OBRA: PR-25GU066
PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

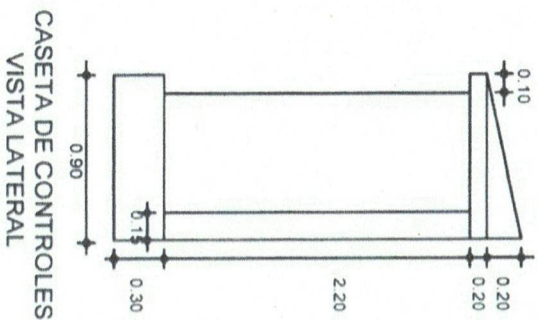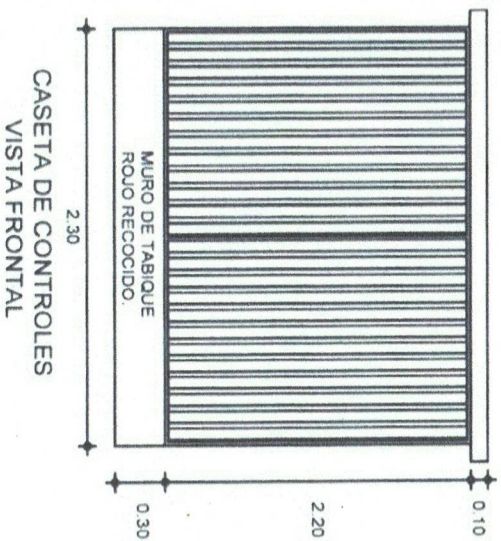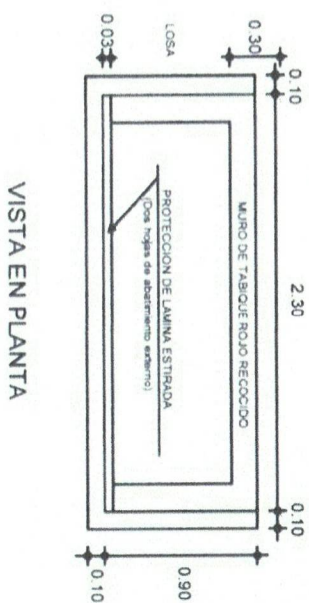

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISSE DE VYA CERVANTES

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

ELABORO:
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)

UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17

PROGRAMA: RAMO 33

CONTRATO N°: JUMAPAGR33/66/2025

DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

CROQUIS




ESTIMACION NO. 2 (DOS)

No. DE OBRA: PR-25GU066

PERIODO DE ESTIMACION:
11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE	LARGO	ANCHO	ALTURA	PIEZA	CANTIDAD		OBSERVACION
								PARCIAL	TOTAL	

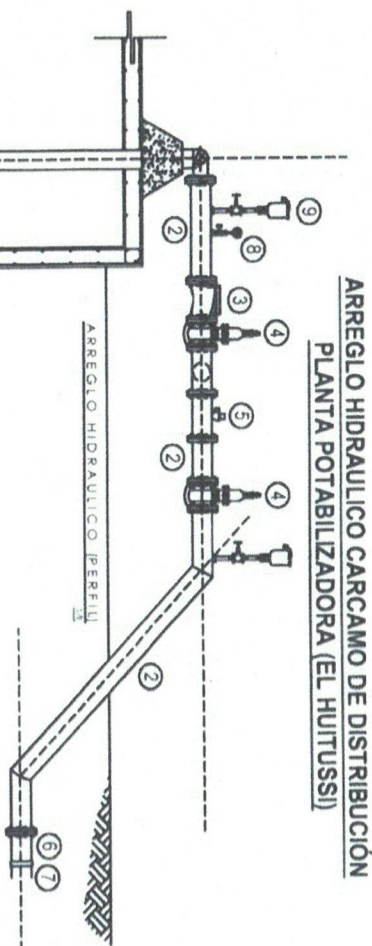

CANTIDADES DE OBRA		
ID	DESCRIPCION	CANT
1	Estado de borden de 20 ton y 70 mca	2.00
2	Taladro de acero 6"0	12.00
3	Valvula conica de 6"0	2.00
4	Valvula conica de 6"0	2.00
5	Manijer de 1/2" de 6"0	1.00
6	Extensidad rapida 6"0	1.00
7	Cable insulacion PVC 6"0	1.00
8	Bata soldable de 6"0	11.00
9	Cable soldable de 1/2"0	2.00
10	Cable soldable de 1/2"0	2.00
11	Napa Fo 60 de 1/2" x 0.25 m	2.00
12	Napa Fo 60 de 1/2" x 0.25 m	2.00
13	Manijer tipo bordon de 1/2"0	2.00
14	Valvula conica de 6"0 con: regulacion y manijer tipo bordon de 1/2"0	2.00
15	Empaque de goma de 6"0	12.00
16	Empaque de neopreno de 6"0	1.00
17	Empaque de neopreno de 6"0	2.00
18	Score de concreto	2.00

AUTORIZO:
ING. VIANEY DENISE LEYVA CERVANTES

ELABORO:
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG

REVISO:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ

C. JESUS FELIX GARCIA

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUTTUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO: 7,769,696.17
PROGRAMA: RAMO 33
CONTRATO N°: JUMAPAGR3366/2025
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG

CANTIDAD		OBSERVACION
PARCIAL	TOTAL	

ARREGLO HIDRAULICO (PERFIL 1)

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	Equipo de bombeo de 12 hp y 40 m c.a	PZA	2.00
2	Tubo de acero 4"Ø	M.	12.00
3	Valvula de acero 4"Ø	PZA	2.00
4	Valvula cono de 4"Ø	PZA	3.00
5	Manómetro de flujo de 4"Ø	PZA	1.00
6	Extensidad 4"Ø	PZA	1.00
7	Cable reparacion PVC 4"Ø	PZA	1.00
8	Bolsa siltante de 4"Ø	PZA	11.00
9	Cable siltante de 1/2"Ø	PZA	2.00

CANTIDADES DE OBRA			
ID	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.
1	Empaño de bordado de 12" por 42" m = 3	PZA	2.00
2	Tubo en acero 4"Ø	ML	12.00
3	Varilla 036 de 4"Ø	PZA	2.00
4	Varilla 036 de 4"Ø	PZA	3.00
5	Varilla 036 de 4"Ø	PZA	1.00
6	Moedor de fuso de 4"Ø	PZA	1.00
7	Extensitas 100g 5"Ø	PZA	1.00
8	Cable 16 conductor por 4"Ø	PZA	1.00
9	Boca 16 conductor de 4"Ø	PZA	11.00
10	Cable soldado de 1"Ø	PZA	2.00
11	Cable soldado de 1"Ø	PZA	3.00
12	Nivel F3.00 de 12" x 0.25 m	PZA	2.00
13	Nivel F3.00 de 12" x 0.25 m	PZA	2.00
14	Mantenedor tipo bordado de 1"Ø	PZA	2.00
15	Varilla conectora de adhesión + expansion y refinoración de una parrilla metálica (marca RCI) modelo D-0-0-0-BL-0-0-X	PZA	3.00
16	Empaño de pino de 4"Ø	PZA	12.00
17	Empaño de pino de 4"Ø	PZA	1.00
18	Empaño de marmota de 4"Ø	PZA	2.00
19	Soplo de concreto		


ELABORÓ:
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.
C. JESUS FELIX GARCIA
CONTRATISTA

REVISOR:
ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
Jefe de Supervision de Obra

CROQUIS		ESTIMACION NO: 2 (DOS)	
OBRA: REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 40 LPS (PRIMERA ETAPA)		No. DE OBRA: PR-25GU066	
UBICACION: LOCALIDAD DE EL HUITUSI, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA		PERIODO DE ESTIMACION:	
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.		11 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025	
IMPORTE DE CONTRATO: 7,789,696.17			
PROGRAMA: RAMO 33			
CONTRATO N°: JUMAPAGR33/66/2025			
DEPENDENCIA EJECUTORA: JUMAPAG			



ARREGLO HIDRAULICO CARCAMO DE AGUAS CRUDAS
PLANTA POTABILIZADORA (EL HUITUSI)

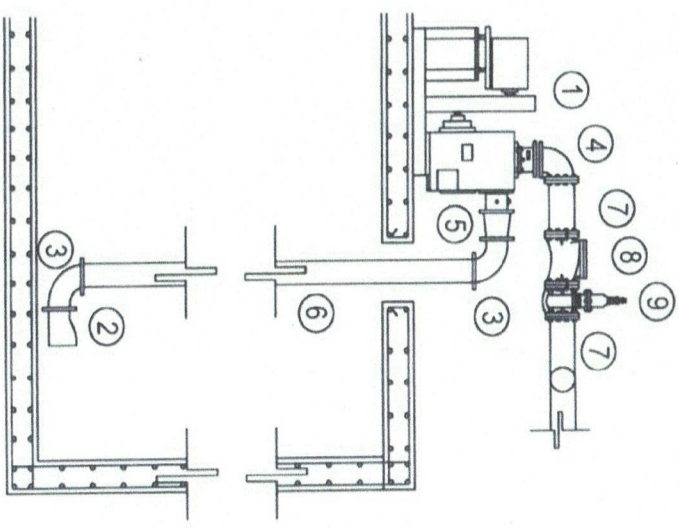

CANTIDADES DE OBRA CARCAMO DE AGUAS CRUDAS		
ID	DESCRIPCION	CANT
1	Equipo de bombeo de 50 hp y 15 m c.a	7.00
2	Reduccion excentrica 12"x10"	1.00
3	Codo 10 lb de 6"	4.00
4	Reduccion 10 lb de 10"x8"	2.00
5	Tuberia de acero de 10"	2.00
6	Tuberia de acero de 6"	7.00
7	Valvula check de 6"	2.00
8	Valvula comp de 6"	2.00
9	Brida soldable de 10"	3.00
	Brida soldable de 6"	3.00
	Empaque de pomo de 6"	3.00
	Empaque de pomo de 8"	3.00
	Tomillos de acero inoxidable de 7/8"x4"	80.00
	Tomillos de acero inoxidable de 3/4"x3 1/2"	96.00

AUTORIZO:	ELABORO:	REVISO:
ING. VIANEY DENISSE LEYVA CERVANTES	CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.	ING. JOSE DE JESUS LOPEZ PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS JUMAPAG	C. JESUS FELIX GARCIA	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA
	CONTRATISTA	
