



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/756/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
01 NORMAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 10 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL CABILDO MUNICIPAL, CON EL ACTA DE CABILDO NÚMERO: 18 (DIECIOCHO) CON FECHA DE 30 DE JUNIO DE 2025, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASI COMO ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-GC-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,654,053.43 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$1,032,357.49 (UN MILLON TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DEL GASTO CORRIENTE MUNICIPAL, EJERCICIO 2025
- EMPRESA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
- R.F.C. SACD821117AJ7
- DOMICILIO FISCAL: BLVD. FRANCISCO I. MADERO # 1798 COLONIA HIGUEL HIDALGO, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80090
- No. DE FACTURA: # 4766, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

8:16 AM
11 DIC 2025

Recibido



Emisor

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

RFC: SACD821117AJ7

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: BLVD. FRANCISCO I MADERO 1798 Miguel Hidalgo Culiacán Sinaloa México 80090

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Gabriel Leyva Solano S/N Badiraguato Badiraguato, Sinaloa México 80500

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 547

Fecha: 10/Dic/2025 13:54:10

Lugar de expedición (C.P.) 80090

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)</p> <p>DE LA OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, ASI COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-GC-008/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,654,053.43</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 1,425,908.13 MAS I.V.A 16 % \$ 228,145.30 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,654,053.43</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 499,067.84 MAS I.V.A.: \$ 79,850.85 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 578,918.70</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 926,840.29 MAS I.V.A \$ 148,294.44 MONTO NETO A FACTURAR \$ 1,075,134.73</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 42,777.24 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 621,695.94</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 1,032,357.49</p>	\$926,840.29	IVA, - Importe: 148294.44	\$926,840.29

Total con letra:
un millon setenta y cinco mil ciento treinta y cuatro Pesos 73/100 M.N.

Subtotal: \$926,840.29

IVA 16 %: \$148,294.44

Total: \$1,075,134.73



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000703927080
Folio Fiscal: B8B61DE6-1CBA-4C2C-852B-F138FACD4766
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-10T14:54:16

Sello del SAT

P9RJzKPO4EspOHfXG2HLBXtvvQZnp9XYPuWFgg+TxllNYX3mEG4+ugyP1/NLdHr+QtbU3mD+u0F5BceQCLQ879/m431APameRrAX5QC5SuBOda8fbUk0b1z3Uik09GvBYI161i5P/fp
wOSuMb1sWlKjQpu7YCdEX+hrBongVJBve3Gt+/L9wxdXj4ZHUFa4O8PpcV29pgsP+5YTAJIE9w9pe7NifvJPd1rwKMLUeLWVuM9GMRMDsVgFmpmF4DqfwkNVkZoWE2fjCHC+myc2I7
dgAfkKIdznJxKUB2w4XthGyTJv15cN1T74qwr0/rUBUGy+FXVvix6bEkWrfHhDwA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B8B61DE6-1CBA-4C2C-852B-F138FACD4766|2025-12-10T14:54:16|MAS0810247C0|TK495xICTYS1hXEG0KyJ4Alhw9tU7jnCsiGRwe7DfPMUVPlv3PLnCX7xPbuRxYeoYRWH
c/zLNZV/A/ulFbdV02XSnzXHgp/ZazQgiOzOkHyEtL2iBiwXzDBot9SSR8HSL/bv1c8ceorqbajBsMWMpispnP53gxUmEvFNHadmWdRl+Hvq150UKkUjdOxSzk9frYfWocXRW8cUnYc8g6mln
UCNnhM9PictqoMrc5BBRqpP63/KTUrA444p8JBWawOa0XpJOj1Vn6QfBfsvQtu/KVUnTb2s1plzi41eBikbwsL2d0XUzphU+yl+/JLQndsPMu1dPzEvDYDmvyqyn6zxcg==|00001000000 709182898

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDM5MjcwODAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVkIDSU8gREUGgQURN5UJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-12-10T13:54:10" Folio="547" FormaPago="03" LugarExpedicion="80090" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000703927080"
Sello="TK495x1CTYS1hXEG0KyJ4Alhw9tU7jnCsIGRwe7DfPMUVPiV3PLnCX7xPbuRxYEOYRWHC/zLNZV/A/u1FbdV02XSnzXHgp/ZazQgiOzOkHyEtL2iBiWxzDBoI9SSR8HSL/bv1c8ceorqbaj8s1
SubTotal="926840.29" TipoDeComprobante="I" Total="1075134.73" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="DENISE ACELA SALAS CAZAREZ" RegimenFiscal="612" Rfc="SACD821117A37"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE SISTEMAS ELÉCTRICOSPAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
FINQUITO(UNICA)DE LA OBRA: DISTRIBUCION Y ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO ILUMINACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENABADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DENOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERAMUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-AD-GC-008/2025MONTO DEL CONTRATO: $
1,654,053.43IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $1,425,908.13MAS I.V.A 16 % $ 228,145.30TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $1,654,053.43AMORTIZACIÓN
ANICIPO 35% $ 499,067.84MAS I.V.A.: $ 79,850.85TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANICIPO: $ 578,918.70Importe TOTAL A FACTURAR $ 926,840.29MAS I.V.A $
148,294.44MONTO NETO A FACTURAR $ 1,075,134.73RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 42,777.24TOTAL DEDUCCIONES: $ 621,695.94MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $
1,032,357.49" Importe="926840.29" NoIdentificacion="SER01" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="926840.2900">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="926840.29" Importe="148294.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="148294.44">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="926840.29" Importe="148294.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B8B61DE6-1CBA-4C2C-852B-F138FACD4766"
FechaTimbrado="2025-12-10T14:54:16" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="TK495x1CTYS1hXEG0KyJ4Alhw9tU7jnCsIGRwe7DfPMUVPiV3PLnCX7xPbuRxYEOYRWHC/zLNZV/A/u1FbdV02XSnzXHgp/ZazQgiOzOkHyEtL2iBiWxzDBoI9SSR8HSL/bv1c8ceor
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="P9RJzKP04EspOHFXG2HLBxtvVZnp9XYPWUFGq+TxIINX3mEG4+uGyP1/NLdHr+QtBu3mD+u0F5BceQCLQ879/m431APameRrAX5QC5SuB0da8fbUk0b1z3UtK09GvBYI161i5P/fp
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SACD821117AJ7	DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8B61DE6-1CBA-4C2C-852B-F138FACD4766	2025-12-10T13:54:10	2025-12-10T14:54:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,075,134.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 18-ago-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090

TELÉFONO: (66) 71 06 34 89 CEL: (66) 71 06 34 89

R.F.C.

SACD821117AJ7.

ESTIMACIÓN No: 01 NORMAL
FINIQUITO (UNICA)

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 09-jul-25

AL 02-ago-25

FECHA DE CONTRATO:

08-jul-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATOLOCALIDAD: MUNICIPIO:
BADIRAGUATO BADIRAGUATOPERIODO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

INICIO: 09-jul-25

TERMINACIÓN: 02-ago-25

DESCRIPCIÓN:

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-GC-008/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$1,654,053.43

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$1,654,053.43

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$578,918.70

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$1,654,053.43

BUENO POR: \$ 1,032,357.49

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 1,032,357.49 (SON UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL
FINIQUITO (UNICA)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 499,067.84

MAS I.V.A.:

\$ 79,850.85

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 578,918.70

3 % SVIFYC:

\$ 42,777.24

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 621,695.94

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 1,425,908.13

MAS I.V.A 16 %

\$ 228,145.30

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 1,654,053.43

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 621,695.94

SALDO A PAGAR:

\$ 1,032,357.49

ELABORO

Dinse Salas C.
C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

Control de Estimaciones

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA, BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		Estimacion:		
			Fecha: 18 de agosto de 2025		01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)		
Periodo de la estimacion: 09/07/2025 al 02/08/2025			Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución: 09/07/2025 al 02/08/2025			BADIRAGUATO		MBGBR-AD-GC-008/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,654,053.43		\$ 1,425,908.13		\$ 578,918.70		\$ 499,067.84	100%
							% Avance Total
							100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 1,425,908.13	ESTA ESTIMACION
\$ 578,918.70	16 % I.V.A (+) \$ 228,145.30	\$ 1,654,053.43
	Sub- Total A (=) \$ 1,654,053.43	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 499,067.84	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 79,850.85	\$ -
	Total (=) \$ 578,918.70	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 926,840.29	TOTAL ACUMULADO.
\$ 578,918.70	16 % I.V.A (+) \$ 148,294.45	\$ 1,654,053.43
	Total (=) \$ 1,075,134.73	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 42,777.24	CONTRATADO
\$ 578,918.70	Total Deducciones (=) \$ 621,695.94	\$ 1,654,053.43
	Importe T O T A L \$ 1,032,357.49	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,032,357.49	SALDO
\$ -	Son: (SON UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.)	\$ -

ELABORO

Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

Rubiel Rincon Ramos
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONTRATISTA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ	DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
DOMICILIO: Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090	
R.F.C.: SACD821117AJ7.	

ESTADO DE CUENTA

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	UT NOROCCIDENTAL FINQUITO (LÍNEA A)
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
FECHA INICIO CONTRATO:	09-jul-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	02-ago-25	CONTRATO:	MBGBR-AD-GC-008/2025
					08-jul-25
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,654,053.43	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$578,918.70	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL	
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,654,053.43	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$1,654,053.43
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%
				TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A PAGAR

	09-jul-25	02-ago-25	\$	1,654,053.43	\$	1,425,908.13	\$	42,777.24	\$	578,918.70	\$	621,695.94	\$	1,032,357.49
01 NORMAL FINQUITO (UNICA)														
TOTALES:			\$	1,654,053.43	\$	1,425,908.13	\$	42,777.24	\$	578,918.70	\$	621,695.94	\$	1,032,357.49
SALDO DEL CONTRATO:				\$0.00		SALDO POR AMORTIZAR:				\$0.00				

ELABORO	 C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ REPRESENTANTE LEGAL	REVISÓ  ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	 ING. RUBIEL RINCON RAMOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	AUTORIZO
---------	---	--	--	----------



FECHA

18/08/2025

CONTRATISTA:**DENISE ACELA SALAS CAZAREZ****DOMICILIO:** Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán,
Sinaloa, C.P. 80090**R.F.C.**
SACD821117AJ7.**DEPENDENCIA:****AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO****DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.****RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,654,053.43**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:** \$578,918.70**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:** \$1,654,053.43

OBRA		IMPORTE
1	RED ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR	\$ 1,302,190.80
2	TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA	\$ 123,717.33
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 1,425,908.13

SUB TOTAL=**\$ 1,425,908.13****I.V.A AL 16 %****\$ 228,145.30****TOTAL =****\$ 1,654,053.43**

ELABORO

Denise Salas
C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO

[Firma]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Bvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,

C.P. 80090

R.F.C.:

SACD82117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

1 de 6

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:			\$1,654,053.43		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$578,918.70		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			\$1,654,053.43		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	RED ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR									
1.1	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION									
GBR101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$ 1,242.10	\$ 1,242.10	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 1,242.10
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,815.60	\$ 2,815.60	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 2,815.60
GBR103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXION DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,417.04	\$ 3,417.04	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 3,417.04
GBR104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 71,915.01	\$ 71,915.01	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 71,915.01
GBR105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE INDIVIDUAL PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 5,158.95	\$ 10,317.90	2.0	0.00	0.00	2.00	\$ 10,317.90
GBR106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE CON INT. PPAL DE 3X250 AMP. CON SEIS ESPACIOS PARA DERIVADOS , INCLUYE MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 109,910.65	\$ 109,910.65	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 109,910.65

ELABORÓ

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ

JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZÓ

ING. ROBIEL RINCON RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



FECHA
HOJA: 18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Bvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090

R.F.C.

SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

2 de 6

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	
			01 NORMAL	FINIQUITO
DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,654,053.43

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$578,918.70

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,654,053.43

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR107	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 23,672.87	\$ 23,672.87	1.0		0.00	1.00	\$ 23,672.87
GBR108	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$ 9,057.76	\$ 27,173.28	3.0	0.00	0.00	3.00	\$ 27,173.28
GBR109	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 5,686.42	\$ 11,372.84	2.0	0.00	0.00	2.00	\$ 11,372.84
1.2	SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA									
GBR110	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$ 5,406.08	\$ 16,218.24	3.0	0.00	0.00	3.00	\$ 16,218.24
GBR111	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	\$ 3,452.14	\$ 20,712.84	6.0	0.00	0.00	6.00	\$ 20,712.84

ELABORO

Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Bldv. Francisco I Madero #1793, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090

R.F.C.

SACD82117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

3 de 6

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	\$ 2,815.60	\$ 25,340.40	9.0	0.00	0.00	9.00	\$ 25,340.40
GBR113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIFLEX ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	250.00	\$ 445.50	\$ 111,375.00	250.0	0.00	0.00	250.00	\$ 111,375.00
GBR114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	250.00	\$ 10.40	\$ 2,600.00	250.0	0.00	0.00	250.00	\$ 2,600.00
GBR115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.00	\$ 478.37	\$ 33,485.90	70.0	0.00	0.00	70.00	\$ 33,485.90
GBR116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	180.00	\$ 636.68	\$ 114,602.40	180.0	0.00	0.00	180.00	\$ 114,602.40
GBR117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	\$ 4,025.32	\$ 16,101.28	4.0	0.00	0.00	4.00	\$ 16,101.28
GBR118	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: GRUA, CARGA, ACARREO A CENTRO DE ACOPIO..	PZA	5.00	\$ 1,781.16	\$ 8,905.80	5.0	0.00	0.00	5.00	\$ 8,905.80
PREVIOS										AUTORIZO

ELABORO

Denise Salas C.

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Bvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090

R.F.C. SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

4 de 6

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	OT NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,654,053.43			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$578,918.70			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,654,053.43			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1.3	LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES									
GBR119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 8,925.37	\$ 8,925.37	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 8,925.37
GBR120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	\$ 13,997.38	\$ 27,994.76	2.0	0.00	0.00	2.00	\$ 27,994.76
GBR121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 15,400.50	\$ 15,400.50	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 15,400.50
GBR122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTOS TIPO APARENTE, INCLUYE: CAJA FS, DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	19.00	\$ 3,120.06	\$ 59,281.14	19.0	0.00	0.00	19.00	\$ 59,281.14
GBR123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE CONTACTOS EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	83.00	\$ 1,067.07	\$ 88,566.81	83.0	0.00	0.00	83.00	\$ 88,566.81
GBR124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIAS TIPO APARENTE, INCLUYE: DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, CABLEADO, CAJA GALVANIZADA, MATERIAL DE SUJECCIÓN COLGANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	38.00	\$ 2,622.39	\$ 99,650.82	38.0	0.00	0.00	38.00	\$ 99,650.82

ELABORO

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Denise Salas C

AUTORIZO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA
HOJA:

18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

Bvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090

R.F.C. | SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

5 de 6

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:			\$1,654,053.43		
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:			\$578,918.70		
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:			\$1,654,053.43		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EN PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, DUCTERIA, CABLEADO, BOTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	12.00	\$ 1,924.12	\$ 23,089.44	12.0	0.00	0.00	12.00	\$ 23,089.44
GBR126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	185.00	\$ 1,067.07	\$ 197,407.95	185.0	0.00	0.00	185.00	\$ 197,407.95
GBR127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE APAGADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	29.00	\$ 1,315.15	\$ 38,139.35	29.0	0.00	0.00	29.00	\$ 38,139.35
GBR128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE ABANICO EXISTENTES. INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 12 PARA NEUTRO, CABLE THW CAL. 14 PARA TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	8.00	\$ 1,500.30	\$ 12,002.40	8.0	0.00	0.00	8.00	\$ 12,002.40
GBR129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	\$ 621.56	\$ 9,323.40	15.0	0.00	0.00	15.00	\$ 9,323.40
GBR130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	5.00	\$ 1,060.93	\$ 5,304.65	5.0	0.00	0.00	5.00	\$ 5,304.65

ELABORÓ

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

REPRESENTANTE LEGAL

Denise Salas C.

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ

JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA
HOJA:

18/08/2025

CONTRATISTA:

DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

DOMICILIO:

Blvd. Francisco I Madero #1798, Colonia Miguel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa,
C.P. 80090

R.F.C.

SACD821117AJ7.

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

6 de 6

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	OT NORMAL FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$1,654,053.43			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$578,918.70			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,654,053.43			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GBR131	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	\$ 1,090.27	\$ 8,722.16	8.0	0.00	0.00	8.00	\$ 8,722.16
GBR132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, LINEA DE COMUNICACION A CONDENSADOR DE EVAPORADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	150.00	\$ 614.29	\$ 92,143.50	150.0	0.00	0.00	150.00	\$ 92,143.50
GBR133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONTACTOS PARA EXTERIOR, INCLUYE: TAPA PARA EXTERIOR, CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 505.94	\$ 5,059.40	10.0	0.00	0.00	10.00	\$ 5,059.40
1	TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA									
1.1	PAGO LIBRANZA, SUPERVISON, CFE, VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.									
GBR134	PAGO POR TRAMITE Y GESTORIA ANTE CFE	SERV	1.00	\$ 19,560.28	\$ 19,560.28	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 19,560.28
GBR135	PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES DE TC'S PARA SERVICIO POR AUMENTO	SERV	1.00	\$ 12,495.58	\$ 12,495.58	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 12,495.58
GBR136	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE	SERV	1.00	\$ 65,127.53	\$ 65,127.53	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 65,127.53
GBR137	PAGO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERV	1.00	\$ 26,533.94	\$ 26,533.94	1.0	0.00	0.00	1.00	\$ 26,533.94
TOTAL DE ESTIMACION \$ 1,425,908.13										
I.V.A \$ 228,149.00										
TOTAL \$ 1,654,053.43										

ELABORO

Denise Salas C.

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

REVISO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

<div>  NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. </div>									
GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
1							PARCIAL	TOTAL	
1.1	RED ELÉCTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR								
	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELÉCTRICA GENERAL EN SUBESTACION								
GBR101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTÓN FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTÓN FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA							VER CROQUIS
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO	1.00		
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							VER CROQUIS
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO	1.00		
GBR103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA							VER CROQUIS
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO	1.00		
GBR104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA							VER CROQUIS
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO	1.00		
						TOTAL EJECUTADO	1.00		

ELABORO


 C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ


 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO


 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA									
OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						3.00	3.00	3.00	
						TOTAL EJECUTADO		3.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						2.00	2.00		
						TOTAL EJECUTADO		2.00	
1.2	SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA								
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						3.00	3.00		
						TOTAL EJECUTADO		3.00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						6.00	6.00		
						TOTAL EJECUTADO		6.00	

AUTORIZO



ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

REVISÓ



SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO



C.DENISE ACÉLA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

<div>  <div> NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA </div> </div>									
GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS. SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA							
						9.00	9.00		
						TOTAL EJECUTADO		9.00	
GBR113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIFLEX ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML				250.00	250.00		
						TOTAL EJECUTADO		250.00	
GBR114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML				250.00	250.00		
						TOTAL EJECUTADO		250.00	
GBR115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3*1 DEL 1/0 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML				70.00	70.00		
						TOTAL EJECUTADO		70.00	

ELABORO *Donise Salas C.*
 C.DENISE ÁCELA SALAS CAZAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ *[Signature]*
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO *[Signature]*
 ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

<div>NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</div>									
GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
1.3	LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS								
GBR119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						1.00		1.00	
							TOTAL EJECUTADO	1.00	
GBR120	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						2.00		2.00	
							TOTAL EJECUTADO	2.00	
GBR121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						1.00		1.00	
							TOTAL EJECUTADO	1.00	

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

ELABORO

C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GBR130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						5.00	5.00		
						TOTAL EJECUTADO	5.00		
GBR131	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA							
						8.00	8.00		
						TOTAL EJECUTADO	8.00		
GBR132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, LINEA DE COMUNICACION A CONDENSADOR DE EVAPORADOR, MANO DE	ML							
						150.00	150.00		
						TOTAL EJECUTADO	150.00		
GBR133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONTACTOS PARA EXTERIOR. INCLUYE: TAPA PARA EXTERIOR, CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA							
						10.00	10.00		
						TOTAL EJECUTADO	10.00		

Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

 SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

OBRA: DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FORMAL FINIQUITO (UNICA)

GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA								
1.1	PAGO LIBRANZA, SUPERVISION, CFE, VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.								
	PAGO POR TRAMITE Y GESTORIA ANTE CFE								
GBR134		SERV							
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO		1.00	
	PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES DE TCS PARA SERVICIO POR AUMENTO								
GBR135		SERV							
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO		1.00	
	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE								
GBR136		SERV							
						1.00	1.00		
						TOTAL EJECUTADO		1.00	

Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA


 AU

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

<div>NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</div>									
GENERADORES ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
	PAGO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS						PARCIAL	TOTAL	
GBR137		SERV							
						1.00			
							1.00		
							TOTAL EJECUTADO		1.00

ELABORO

Denis Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 18/08/2025

DEPENDENCIA: **AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO**

CROQUIS

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA DE BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


CONTRATISTA: **DENISE ACELA SALAS CAZAREZ** OBRA: **BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.**

ESTIMACION: **01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)**

1.1	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION
1.2	SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA
1.3	LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS
1.1	PAGO LIBRANZA, SUPERVISION, CFE, VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.

SIMBOLOGIA

- POSTE EXISTENTE
- TRANSFORMADOR DE 225 KVA T/POSTE EXISTENTE EN SITIO
- REGISTRO DE CONCRETO DE 1.16x1.16
- REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40
- REGISTRO EXISTENTES
- LLEGADA A CENTRO DE CARGA
- TABLERO DE 20 CIRCUITOS
- TABLERO H/INE CON 6 ESPACIOS
- BASE DE MEDICION 13-200
- CABLE MULTIPLE 2+1 6 (CIRCUITO 4)
- CABLE MULTIPLE 3+1 1/0 (CIRCUITO 1)
- CABLE MULTIPLE 3+1 1/0 (CIRCUITO 2)
- CABLE MULTIPLE 3+1 1/0 (CIRCUITO 3)
- POLIDUCTO DE 3"
- GABINETE M-10 CON INT. DE 600 AMP Y ESPACIO PARA EQUIPOS TCS

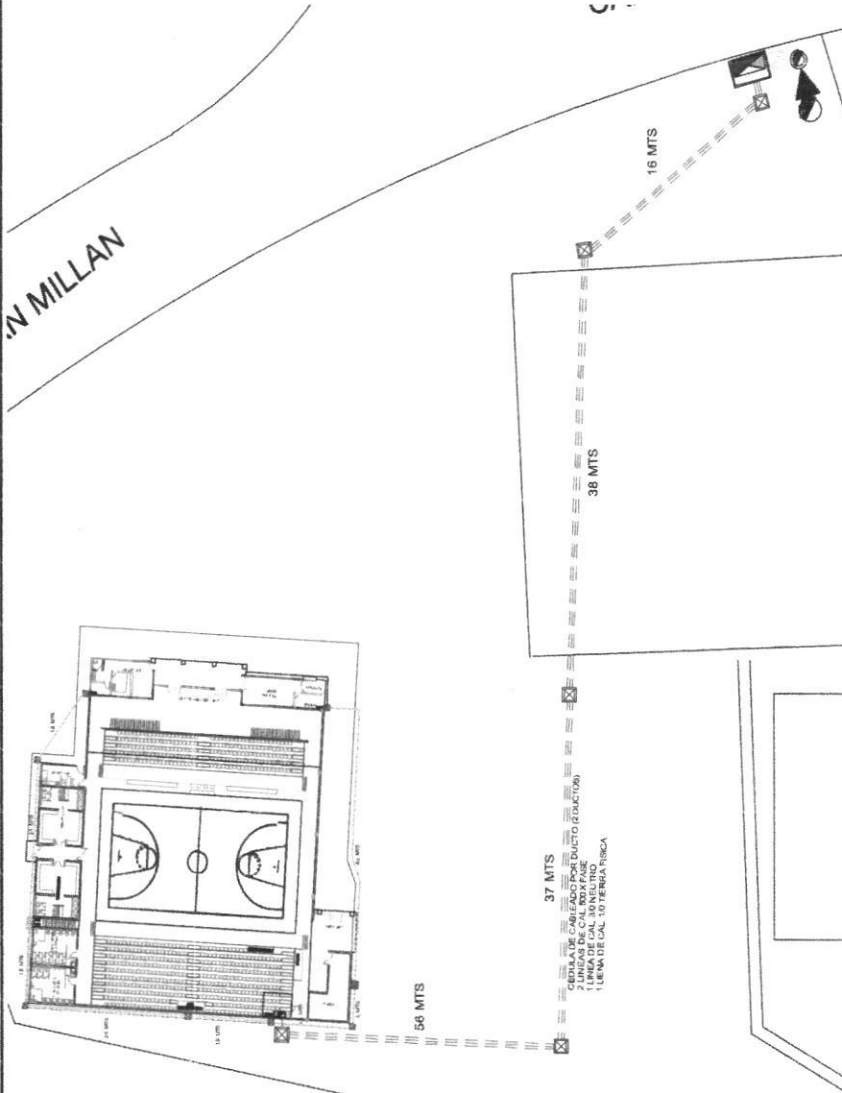

ELABORO

Denise Salas C.
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA: 18/08/2025

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

REPORTE FOTOGRAFICO

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATISTA: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ OBRA:


ESTIMACION: 01 NORMAL FINIQUITO (UNICA)

1.1 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION

1.2 SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA

1.3 LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS

1.1 PAGO LIBRANZA, SUPERVISION, CFE, VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.

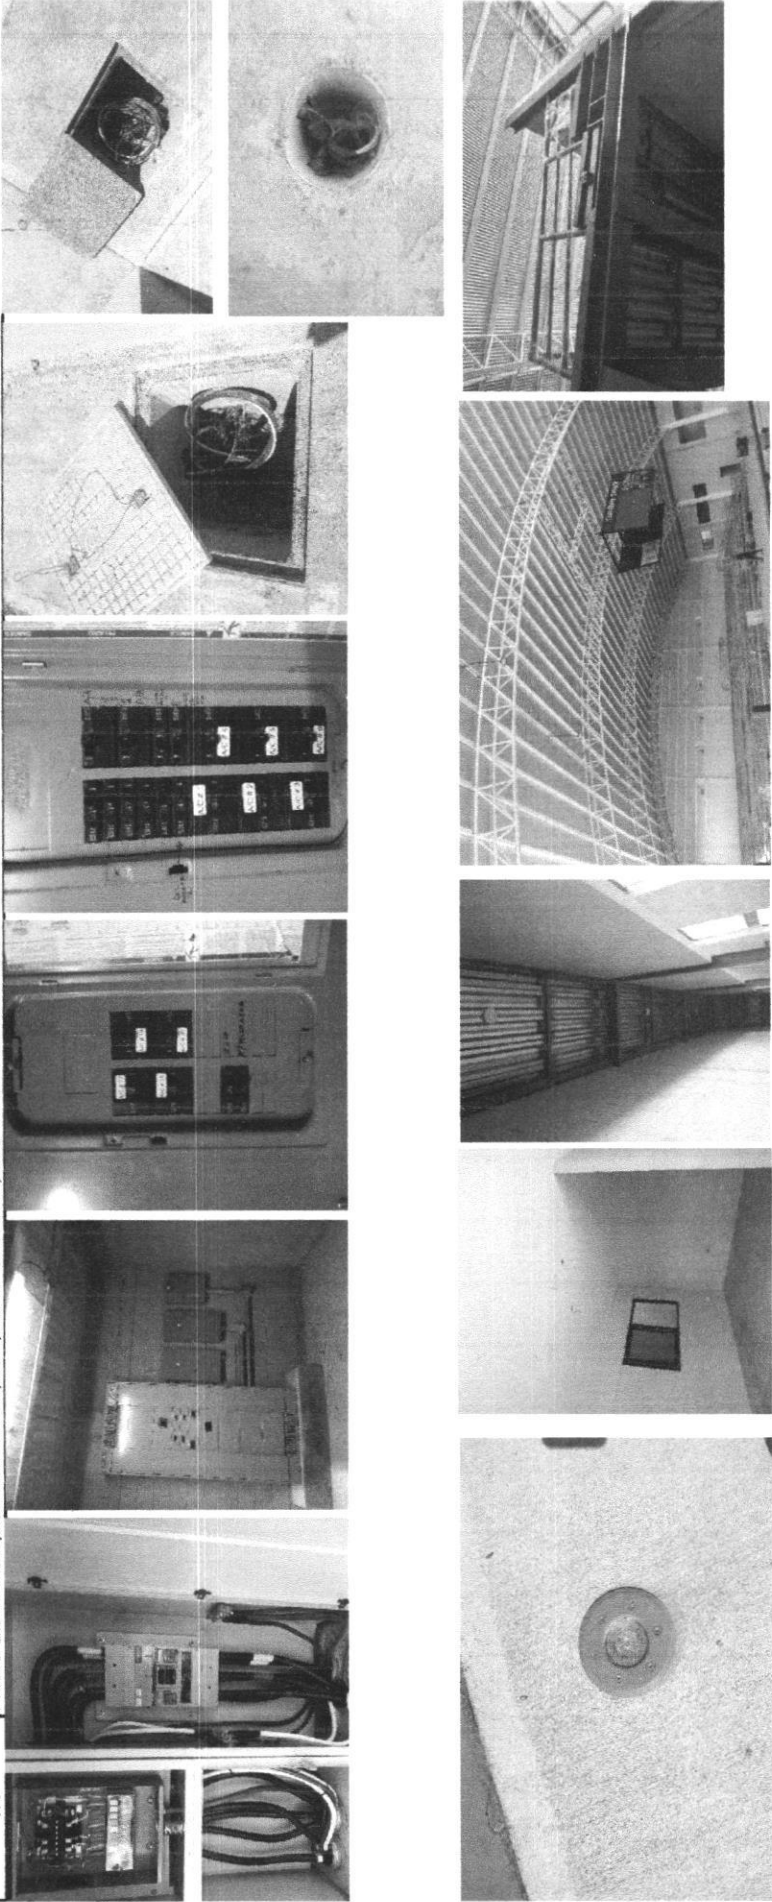

ELABORO

Denise Salas
C.DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

Supervisor de obra

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



Fecha y hora de consulta

16/02/2026 11:14:19 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR FIN AD08

Importe de la operación: 1,032,357.49 MXP

Cuenta de retiro: 0117899181

Cuenta de depósito: 072730012540654561

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: DENISE ACELA SALAS CAZAREZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 17/02/2026

Fecha de creación: 16/02/2026

Fecha de aplicación: 16/02/2026

Concepto de pago: EST 01 NOR FIN AD08

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 23:14:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000619450

Clave de rastreo: 002601002602170000619450

Folio de firma: 0012092084

Folio único: I401202602162314160012092090

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/02/2026
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/02/2026

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
