

CV-DPP-046/2026

Culiacán, Sinaloa, a 21 de mayo de 2026

ASUNTO: Finiquito de obra.

Lic. Francisco Antonio Castañeda Verduzco
Director General de la Comisión de Vivienda
del Estado de Sinaloa
Presente. -

At'n: Lic. María Nohemí García Jaime
Director de Administración y Finanzas

Por este conducto envío a usted la **estimación núm. 06 Normal y 07 Finiquito** (carátula, estimación y evidencia fotográfica) correspondiente al contrato de obra núm. **CV-DG-LP-RA-001/2025** de la empresa **Comercializadora CLN, S.A. de C.V.**, estimaciones en referencia a la "Ejecución de acciones de vivienda adheridas al suelo destinadas a casa habitación en terreno propiedad de los beneficiarios en la modalidad de mejoramiento de vivienda en las líneas de acción de "Recamara Adicional" y "Recamara Adicional con Baño".

Es preciso mencionar que los documentos físicos y digitales entregados por la empresa, fueron verificados y revisados por esta Dirección, y no presenta algún inconveniente para que se realicen los trámites correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS



ARQ. YONATHAN LOYA FLORES

C.c.p. Archivo.

Elena Solórzano
22/05/26

**COMERCIALIZADORA CLN**

CCL150216119

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
andador central, 297 A, Ignacio Allende, 80010, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa,
México
Tel. 6671402611

CLIENTE

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
CVE180815UVA

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80129

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
INSURGENTES SUR, 198, Palacio de Gobierno Del Estado de Sinaloa, 80129, Culiacán
Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 1931
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700079644

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-05-20T15:43:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80010

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACION 6(SEIS) DEL CONTRATO : CV-DG-LP-RA-001/2025 DE LA OBRA: EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO" IMPORTE DE ESTIMACION \$ 289,049.42 16 % IVA \$ 46,247.91 SUBTOTAL \$335,297.33 RETENCIONES AMORTIZACION 35% ANTICIPO \$117,354.07 3% FISCALIZACION Y CONTROL \$ 8,671.48 SUBTOTAL \$ 209,271.78 TOTAL \$ 209,271.78 Clave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporales de construcción Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 180406.71 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28,865.07	\$ 180,406.71	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 180,406.71

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS,
78/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 180,406.71
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28,865.07
TOTAL \$ 209,271.78

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT





COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA 15-ene-26 BUENO POR \$ 209,271.78
RECIBIMOS DE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 78/100 M.N.)
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 06 NORMAL
REFERENTE A TRABAJOS DE:

EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE
LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA
ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/09/2025 AL 15/01/2026
QUE AMPARA EL N° DE OBRA: No. CV-DG-LP-RA-001/2025

OBRA NORMAL \$ 289,049.42
16 % I.V.A. \$ 46,247.91
SUBTOTAL \$ 335,297.33

IMPORTE AUTORIZADO

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 35.00 % \$ 117,354.07
3.00% FISCALIZACION Y CONTROL \$ 8,671.48

SUBTOTAL \$ 209,271.78
TOTAL \$ 209,271.78

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGOS ANTERIORES	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO	POR EJERCER
CONTRATO	\$ 1,579,637.76	\$ 1,222,765.34	\$ 289,049.42	\$ 1,511,814.73	\$ 67,823.03
MONTO DEL CONVENIO					
CONTRATO+CONVENIO					
16% DE I.V.A.	\$ 252,742.04	\$ 195,642.45	\$ 46,247.91	\$ 241,890.36	\$ 10,851.68
TOTAL	\$ 1,832,379.80	\$ 1,418,407.79	\$ 335,297.33	\$ 1,753,705.09	\$ 78,674.71
SALDO TOTAL	1,832,379.80	1,418,407.79	335,297.33	1,753,705.09	78,674.71

RESUMEN DE DEDUCCIONES Y RETENCIONES

ANTICIPO
OTORGADO \$641,332.93
AMORTIZACIONES
ANTERIOR \$ 496,442.72
ESTA ESTIMACIÓN \$ 117,354.07
ACUMULADO \$ 613,796.78
POR AMORTIZAR \$27,536.15

MONTO DE FIANZAS
FIANZA DE ANTICIPO \$ 641,332.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$ 183,237.98

ARQ. YONATHAN LOYA FLORES
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS
COMISION DE VIVIENDA

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA
COMISION DE VIVIENDA

C. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA

COMERCIALIZADORA CLN,
S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

FECHA		
15	01	2026
D/A	MES	AÑO

RECIBO No.	
\$	209,271.78
06 NORMAL	

ESTIMACIÓN No	06 NORMAL
---------------	-----------

No. DE OBRA	FECHA INICIO:	IMPORTE TOTAL	FECHA TERM.	ANTICIPO	FONDO	GARANTIA	ACREDITADO
No. CV-DG-LP-RA-001/2025	20/may/2025	\$ 1,832,379.80	18/ene/2026	\$641,332.93		\$ 183,237.98	

[illegible]

	ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA COMISION DE VIVIENDA
---	--

C. EDUARDO GLOBANI ESPINOZA SORABIA
COMERCIALIZADORA CLIN, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA									
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA									
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACION NUM.									
08 NORMAL									
POR OBRA EJECUTADA DEL 25 DE OCTUBRE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2028									
IMPORTE \$ 289,049.42									
LUGAR:									
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.									
CONTRATO (No. Y No. CV-DG-LP-RA-001/2025 20 DE MAYO DE 2025									
FECHA) PRESUPUESTO									
EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".									
PARTIDA									
No.	DESCRIPCION	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS.	M2	222.12	200.26	184.57	21.86	15.69	\$ 19.21	\$ 301.40
2	CIMENTACION								\$ 301.40
2.01	ZAPATA AISLADA Y COLINDANTE DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS., CON PROF. MINIMA DE 1.50 Mts., ARMADA CON VARILLA No. 3 (3/8") EN AMBOS SENTIDOS, F'Y=4200 KG/CM2, COLADA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: FIRME DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR PARA PARRILLA DE ZAPATAS, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, EXCAVACION, DADO DE 0.15 X 0.15 X 1.00 MTS DE ALTURA, ANCLAJES, RELLENOS, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	80.00	76.00	60.00	4.00	16.00	\$ 2,021.83	\$ 32,349.28
2.05	DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CMS., ARMADA CON ARMEX 12 X 20-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRADO Y DESIMBRADO.	ML	234.33	211.68	166.96	22.65	44.72	\$ 357.90	\$ 16,005.29
2.06	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA.	M3	37.32	37.32	27.91	0.00	9.41	\$ 449.52	\$ 4,229.98
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	222.12	218.90	165.41	3.22	53.4869	\$ 543.81	\$ 29,086.71
3	ESTRUCTURA								\$ 79,846.07
3.01	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS., TIPO PESADO, ACABADO APARENTE AMBAS CARAS, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	495.50	463.91	369.07	31.59	94.8418	\$ 437.77	\$ 41,518.89
3.02	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 12 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	126.00	102.83	82.67	23.17	20.16	\$ 330.60	\$ 6,664.90
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 15-16 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	52.92	52.92	49.12	0.00	3.80	\$ 396.56	\$ 1,506.93




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM.									
08 NORMAL		POR OBRA EJECUTADA DEL 25 DE OCTUBRE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026		IMPORTE \$		289,611.71		HOJA 1 DE 1	
LUGAR: CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.									
OBRA: EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".									
CONTRATO (No. Y FECHA) No. CV-DG-LP-RA-001/2025 20 DE MAYO DE 2025 PRESUPUESTO									
PARTIDA									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3.04	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 19 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	88.20	88.20	71.59	0.00	16.61	\$ 430.96	\$ 7,158.25
3.05	CELDA AHOGADA DE CONCRETO EN BLOCK DE 12 X 12 X 40 CMS. CON 1 VARILLA DE 3/8, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2. INCLUYE: ANCLAJE, VIBRADO, MATERIALES.	PZA	136.08	128.98	103.74	7.10	25.24	\$ 126.55	\$ 3,194.12
3.06	DALA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS, ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.	ML	235.61	218.37	173.45	17.24	44.92	\$ 440.85	\$ 19,802.98
4	LOSAS							\$	20,762.33
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, COLADO Y CURADO.	M2	238.68	238.68	221.58	0.00	17.0972	\$ 1,214.37	\$ 20,762.33
5	GUBIERTA							\$	2,253.41
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.	M2	238.68	238.68	221.58	0.00	17.0972	\$ 131.80	\$ 2,253.41
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA							\$	10,438.11
6.02	APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 EN AREA DE REGADERA (BAÑO), ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	\$ 199.31	\$ -
6.03	ENJARRER CON YESO, EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	193.95	193.95	146.32	0.00	47.63	\$ 219.15	\$ 10,438.11
7	PINTURA							\$	11,840.24

R

+

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACION NUM.									
08 NORMAL									
POR OBRA EJECUTADA DEL 25 DE OCTUBRE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026									
IMPORTE \$ 289,611.71									
LUGAR:									
COMERCIALIZADORA GLN, S.A. DE C.V.									
OBRA:									
CONTRATO (No. Y No. CV-DG-LP-RA-001/2025) 20 DE MAYO DE 2025									
Y " RECAMARA ADICIONAL EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " PRESUPUESTO									
PARTIDA									
CANTIDAD DE OBRA (VOLUMENES)									
No.	DESCRIPCION	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7.01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA BEREL KALOS TONE O SIMILAR, CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL.	1152.47	1,005.97	831.41	146.50	174.5576	\$ 67.83	\$ 11,840.24
8	INSTALACION HIDRAULICAS Y SANITARIAS								
8.01	INSTALACION HIDRAULICA SEGUN PROYECTO A PROYECTO A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA EN ALIMENTACION DE AGUA FRIA.	SAL.	28.00	28.00	26.00	0.00	2.00	\$ 461.59	\$ 923.18
8.02	INSTALACION SANITARIA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES UNICOPL E CEMENTABLES PARA DESCARGA, INCLUYE TRAMO DE CONEXION DE LA VIVIENDA A LA RED MUNICIPAL, MAXIMO DE 6.00 MTS.	SAL.	21.00	21.00	18.00	0.00	3.00	\$ 672.85	\$ 2,018.55
9	INSTALACION ELECTRICA								
9.01	INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, SOQUETS DE BAQUELITA Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA QUINZINO O SIMILAR, DE PLASTICO.	SAL.	86.00	86.00	71.00	0.00	15.00	\$ 835.60	\$ 12,534.00
9.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q06 BTICINIO O SIMILAR; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA.	PZA.	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 2,086.84	\$ 4,173.68
10	SUM. Y COLOCACION DE MUEBLES DIVERSOS								
10.01	SUM. Y COLOCACION DE JUEGO DE MUEBLES PARA BAÑO MARCA CORONA O SIMILAR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: W.C., LAVABO, ACCESORIOS, EMPAQUES, LLAVES ETC.	JGO	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 3,956.70	\$ 7,913.40
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ELECTRICA MARCA LORENZETTI O SIMILAR DE 110 VOLTS CON POTENCIA DE 3850 WATTS, CON CABLE CAL. # 10 EN ALIMENTACION Y CABLE CAL. #13, PARA SISTEMAS DE TIERRA, FORMANDO UN CIRCUITO SECUNDARIO E INDEPENDIENTE CON PASTILLA 1 POLO DE 30 AMP., MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: REGADERA ELECTRICA, CABLES, PASTILLA 30 AMP., MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA.	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 1,342.11	\$ 2,684.22

R

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA									
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA									
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES									
ESTIMACIÓN NUM.									
06 NORMAL		POR OBRA EJECUTADA DEL 25 DE OCTUBRE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026		IMPORTE \$		289,049.42		HOJA 1	
LUGAR:		CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLIN, S.A. DE C.V.				DE 1	
OBRA:		CONTRATO (No. Y FECHA)		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		20 DE MAYO DE 2025			
Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		PRESUPUESTO							
PARTIDA									
No.	DESCRIPCIÓN	UNI	CONTRATADO EN PRESUPUESTO	ACUMULADA EJECUTADO	ESTIMACION EJECUTADO ANTERIOR	RESTANTE	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.03	INSTALACION DE TUBO DE VENTILA DE PVC DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 417.96	\$ 835.92
10.031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO; MARCA TEKA, INCLUYE: CESPOL DE PLASTICO, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO Y SOPORTES FREGADERO	PZA.	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 2,388.04	\$ 4,776.08
11	HERRERIA Y CANCELERIA							\$	20,676.18
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 1.00 x 1.00 M.	PZA	20.00	19.00	12.00	1.00	7.00	\$ 1,691.10	\$ 11,837.70
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 0.60 x 0.40 M.	PZA.	7.00	6.00	5.00	1.00	1.00	\$ 1,252.86	\$ 1,252.86
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PREFABRICADOS DE PERFIL TUBULAR No 129 CAL 20 O SIMILAR; INCLUYE: PINTURA, BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA.	20.00	19.00	12.00	1.00	7.00	\$ 1,083.66	\$ 7,585.62
12	CARPINTERIA							\$	14,173.94
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 80 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.	PZA	13.00	12.00	7.00	1.00	5.00	\$ 2,161.22	\$ 10,806.10
12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 70 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.	PZA.	7.00	7.00	5.00	0.00	2.00	\$ 1,683.92	\$ 3,367.84
13	VIARIOS							\$	11,227.45
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBANTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	13.00	13.00	8.00	0.00	5.00	\$ 2,245.49	\$ 11,227.45
TOTAL:								\$	289,049.42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GENERADOR

Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-007/2025		ESTIMACION		06 NORMAL		
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".			FECHA	PERIODO DE EJECUCION		15-ene-28	
				DE	28-est-28			
				AL	15-ene-28			
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV							
No.		CONCEPTO	LOCALIZACION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO
1		OBRAS PRELIMINARES	EJE TRAMO TIPO					PARCIAL TOTAL
1.01		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS.		M2				
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	1-2 A-B		3.10	4.04		12.52
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	B-D 2-3		6.02	3.64		21.91
			A-D 1-2		2.13	1.06		2.26
					ESTIMACION 1 NORMAL			21.00
2		CIMENTACION						ESTIMACION 6 NORMAL 15.69
2.01		ZAPATA AISLADA Y COLINDANTE DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS., CON PROF. MINIMA DE 1.50 Mts., ARMADA CON VARILLA No 3 (3/8") EN AMBOS SENTIDOS, ACERO F'Y=4200 KG/CM2, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE; FIRME DE CONCRETO DE 05 CMS DE ESPESOR PARA PARRILLA DE ZAPATAS, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, EXCAVACION, DADO DE 0.15 X 0.15 X 1.00 Mts DE ALTURA, ANCLAJES, RELLENOS, CIMBRA Y DESCIMBRA.		PZA				16.00
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON(AHOME)	1 A. B.					4.00
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	1 A. B.					2 4.00
			2 A. B.					2
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A 1-3					3 8.00
			B 1-2					2
			C 1-3					3
2.05		DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CMS., ARMADA CON ARMEX 12 X 20-4, CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CIMBRADO Y DESIMBRADO.						44.72
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	1 A-B	ML	5.56			5.56
			2 A-B		3.73			3.73
			1 A-B	ML	4.04			4.04
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	2 A-B		4.04			4.04
			A 1-2		2.80			2.80
			B 1-2		2.80			2.80
			A 1-2	ML	6.00			6.00
			B 1-2		2.11			2.11
			C 1-3		6.00			6.00
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	1 A-C		3.05			3.05
			2 A-C		1.39			1.39
			3 A-C		3.20			3.20
2.06		SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA .		M3				9.78
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	1-2 A-B		5.56	3.73	0.20	4.15
								4.15
			1-2 A-B					
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)			3.74	2.80	0.20	2.09
								2.09
			A-B 1-2					
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	B-C 1-2		1.39	1.83	0.20	0.51
			A-C 1-4		1.97	1.85	0.20	0.65
					3.72	3.20	0.20	2.38

ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO
ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

GENERADOR									
Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025				ESTIMACION		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".				FECHA		15-nov-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV				PERIODO DE EJECUCION		25-oct-25	
						DE		15-nov-26	
						AL			
3.03		CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 16-16 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.							
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	1	B			2.52	1	2.52
			C	2-3			2.52	2	5.04
								EST 6 NORMAL	3.80
								ADICIONAL	3.76
3.04		CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 19 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.							
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A	1-3			2.52	2	5.04
			B	2			2.52	1	2.52
			C	1-3			2.52	2	5.04
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	1	A-B			2.54	3	7.62
			2	A-B			2.54	1	2.54
								EST 6 NORMAL	16.61
								ADICIONAL	6.15
3.05		CELDA AHOGADA DE CONCRETO EN BLOCK DE 12 X 12 X 40 CMS. CON 1 VARILLA DE 3/8, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; ANCLAJE, VIBRADO, MATERIALES.							
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	B	1-2			2	2.54	5.08
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	B	1-2			2	2.52	5.04
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3			2.52	4	10.08
			2	A-B			2.52	2	5.04
		ING. EDUARDO GIBARAY ESPINOZA SARABIA REPRESENTANTE LEGAL							
		ARQ. RODOLFO MEZA AGOSTA SUPERVISOR DE OBRA							

[Handwritten signature]

No. CV-DG-LP-RA-001/2025

[illegible]

ING. EDUARDO GIGBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Penafe Meza Acosta
ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

Q. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

No. CV-DG-LP-RA-001/2025

Nº DE CONTRATO	OBRA	Nº. CV-DG-LP-RA-007/2025	ESTIMACION		PERIODO DE EJECUCION	DE NORMAL
			FECHA			
			DE	AL		
			25-ene-26	15-ene-26		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.02	APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 EN AREA REGADERA (BAÑO), ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.		B	1-2	1.00	2.10
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	1	A - B	0.70	2.10
						1.47
						EST 6 NORMAL
						ADICIONAL
						3.57
6.03	ENJARRE CON YESO, EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					48.6674
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	1-2	A-D	3.89	5.26
						19.41
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	1-2	A-D	2.86	3.8
						10.87
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A - C	1-3	5.76	3.26
			B	1-2	-1.87	0.12
			2	A - B	-1.44	0.12
						(-)
						(-)
						-0.17
						EST 6 NORMAL
						ADICIONAL
						47.63
						1.04

ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

GENERADOR									
Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION		06 NORMAL			
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		FECHA		15-nov-26			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV		PERIODO DE EJECUCION		25-sep-26			
				AL		15-nov-26			
7	PINTURA								
7.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA BEREL KALOS TONE O SIMILAR, CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				m2				174.5576
		A, B	1-2	AREA MUROS INTER	2.86	2.72	2	15.56	
		B	1-2	VENTANA	-1.22	1.05	(-)	-1.28	
		1, 2	A-B		3.80	2.72	2	20.67	
		1	A-B	PUERTA	-0.97	2.10	(-)	-2.04	
		A, B	1-2	AREA MUROS EXTER	3.10	2.82	2	17.48	
				VENTANA	-1.22	1.05	(-)	-1.28	
		1	A-B		4.04	2.72		10.99	
				PUERTA	-0.97	2.10	(-)	-2.04	
		2	A-B		4.04	2.82		11.39	
		A	1-3	AREA INTERIOR	5.76	2.72		15.67	105.11
				VENTANA	-0.40	0.60	(-)	-0.24	
		B	1-2		1.87	2.72		5.09	
				ENJARRE	-1.00	2.10	(-)	-2.10	
		B	1-2		1.99	2.72		5.41	
		C	1-3		5.76	2.72		15.67	
				VENTANA	-1.00	1.00	(-)	-2.00	
				PUERTA	-0.96	2.10	(-)	-2.02	
		1	A - C		3.14	2.72		8.54	
				ENJARRE	-0.70	2.10	(-)	-1.47	
		2	A - B		1.44	2.72		3.92	
					1.56	2.72		4.24	
				PUERTA	-0.76	2.10	(-)	-3.19	
		3	A - C		3.26	2.72		8.87	
		A	1-3	AREA EXTERIOR	6.00	2.82		16.92	
				VENTANA	-0.40	0.60	(-)	-0.24	
		C	1-3		6.00	2.72		16.32	
				VENTANA	-1.00	1.00	(-)	-2.00	
				PUERTA	-0.96	2.10	(-)	-2.02	
		1	A - C		3.50	2.82		9.87	
		3	A - C		3.50	2.82		9.87	
ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)									
ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA REPRESENTANTE LEGAL									
ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA SUPERVISOR DE OBRA									

Percepción

8

GENERADOR									
No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION		FECHA		04 NORMAL		15-ene-26	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO "		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-28		15-ene-26	
CONTRATISTA		DE		AL		15-ene-26		15-ene-26	
8		COMERCIALIZADORA CLIN SA DE CV							
8.01		INSTALACION HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
		INSTALACION HIDRAULICA SEGUN PROYECTO A PROYECTO A BASE DE TUBERIA PVC		1-2		A-B		Sal.	
		HIDRAULICA EN ALIMENTACION DE AGUA FRIA.						Regadera	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)						W C	
								Lavabo	
								tarja	
								1	
								EST 6 NORMAL	
								ADICIONAL	
								2.00	
								2.00	
								10.00	
8.02		INSTALACION SANITARIA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES UNICOPLE O CEMENTABLES PARA DESCARGA, INCLUYE TRAMO DE CONEXION DE LA VIVIENDA A LA RED MUNICIPAL, MAXIMO DE 6.00 MTS.		1-2		A-B		Sal.	
		ALEXIS NATANAHEL CRUZ GERARDO		1-2		A-B		Tarja	
		LEYDI BIBIANA PERAZA PABALAY		1-2		A-B		Tarja	
		ARMIDA ARAID GERARDO VAZQUEZ		1-2		A-B		Tarja	
		AZALIA ERENDIRA CHAVIRA PABALAY		1-2		A-B		Tarja	
		AMERICA VIANEY PROAÑO TOPETE		1-2		A-B		Tarja	
		JESUS DE LOS REYES FLORES		1-2		A-B		Tarja	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)		1-2		A-B		Regadera	
								W C	
								Lavabo	
								Tarja	
								1	
								EST 6 NORMAL	
								ADICIONAL	
								3.00	
								7.00	
9		INSTALACION ELECTRICA							
9.01		INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, SOQUETS DE BAQUELITA Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA QUINZINO O SIMILAR, DE PLASTICO. .							
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)		A-B		1-2		Sal.	
								Recamara	
								Contactos	
				A-B		1-2		Recamara	
				1		A-B		Sal.	
								Volado	
								Contactos	
								Recamara	
								Recamara	
				A - C		2-3		Sal.	
				A - B		1-2		Usos Multiples	
				B - C		1-2		Baño	
				C		1-3		Cocina	
								MARQUESINA	
								USOS MULTIPLES	
								Contactos	
								Cocina	
								Baño	
								1	
								EST 6 NORMAL	
								ADICIONAL	
								15.00	
								2.00	
9.02		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q06 BTICINIO O SIMILAR; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA.						PZA	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)		C		2-3		PZA	
								USOS MULTIPLES	
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)		C		2-3		PZA	
								USOS MULTIPLES	
								1	
								1.00	
								2.00	
								2.00	
								15.00	
								ADICIONAL	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
								2.00	
		</							

ING. EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA
Rodolfo Meza Acosta

[Handwritten signature]

GENERADOR

Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACION		04 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO " .		FECHA		15-ene-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLIN SA DE CV		DE		PERIODO DE EJECUCION	
				AL		28-oct-26	
						15-ene-26	
10		SUM. Y COLOCACION DE MUEBLES DIVERSOS					
10.01		SUM. Y COLOCACION DE JUEGO DE MUEBLES PARA BAÑO MARCA CORONA O SIMILAR EN COLOR BLANCO, INCLUYE: W.C., LAVABO, ACCESORIOS, EMPAQUES, LLAVES ETC.			JGO		2.00
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	A-B	2-3	Jgo	1	1.00
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A-B	2-3	Jgo	1	1.00
10.02		SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ELECTRICA MARCA LORENZETTI O SIMILAR DE 110 VOLTS CON POTENCIA DE 3850 WATTS, CON CABLE CAL. # 10 EN ALIMENTACION Y CABLE CAL. #13, PARA SISTEMAS DE TIERRA, FORMANDO UN CIRCUITO SECUNDARIO E INDEPENDIENTE CON PASTILLA 1 POLO DE 30 AMP., MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: REGADERA ELECTRICA, CABLES, PASTILLA 30 AMP., MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.			PZA		2.00
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	A-B	2-3	Jgo	1	1.00
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A-B	2-3	Jgo	1	1.00
10.03		INSTALACION DE TUBO DE VENTILA DE PVC DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.			PZA		2.00
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	1	A - B	Pza	1	1.00
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	1	A - B	Pza	1	
10.031		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO; MARCA TEKA, INCLUYE: CESPOL DE PLASTICO, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO Y SOPORTES FREGADERO			PZA		2.00
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3	Pza	1	1.00
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3	Pza	1	

ING. EDUARDO GIOVANNI ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Rodolfo Meza Acosta

[Handwritten signature]

GENERADOR									
Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025							
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".							
		ESTIMACION		FECHA				06 NORMAL	
		15-ene-26							
		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-25					
CONTRATISTA:		DE		AL		15-ene-26			
		COMERCIALIZADORA CLIN SA DE CV							

M E D I D A S									
No.	CONCEPTO	LOCALIZACION		UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	
		EJE	TRAMO					PARCIAL	TOTAL
11	HERRERIA Y CANCELERIA								
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 1.00 x 1.00 M.			m2					7.00
	ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	C	1-3	Pza				1	
	ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	C	1-3	Pza				1	
	MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)	C	1-3	Pza				1	
	JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3	Pza				2	
	ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3	Pza				2	
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 0.60 x 0.40 M.			PZA					1
	ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	A	1-2	Pza				1	

GENERADOR									
N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025			ESTIMACION		06 NORMAL			
	OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	FECHA		PERIODO DE EJECUCION				
			DE	AL	25-oct-25	15-ene-26			
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLIN SA DE CV								
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PREFABRICADOS DE PERFIL TUBULAR No 129 CAL 20 O SIMILAR; INCLUYE: PINTURA, BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.				PZA				7.00
	ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	C	1-3		Pza			1	
	ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	C	1-3		Pza			1	
	MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)	C	1-3		Pza			1	
	JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3		Pza			2	
	ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3		Pza			2	

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Recibo de Obra

[Handwritten signature]


Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO ".		FECHA		15-ene-26	
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV		DE		25-oct-25	
				AL		15-ene-26	
12	CARPINTERIA						
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.				PZA		5.00
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	C	1-3	Pza	1	
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	C	1-3	Pza	1	
		MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)	C	1-3	Pza	1	
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3	Pza	1	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3	Pza	1	
12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 70 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.				PZA		2.00
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3	Pza	1	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3	Pza	1	
13	VARIOS						
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRENTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.				LOTE		5.00
		ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)	C	2-3	Pza	1	
		ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)	C	2-3	Pza	1	
		MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)	C	2-3	Pza	1	
		JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)	C	1-3	Pza	1	
		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	C	1-3	Pza	1	

ING. EDUARDO GIBAN Y ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Rodolfo Meza Acosta

7

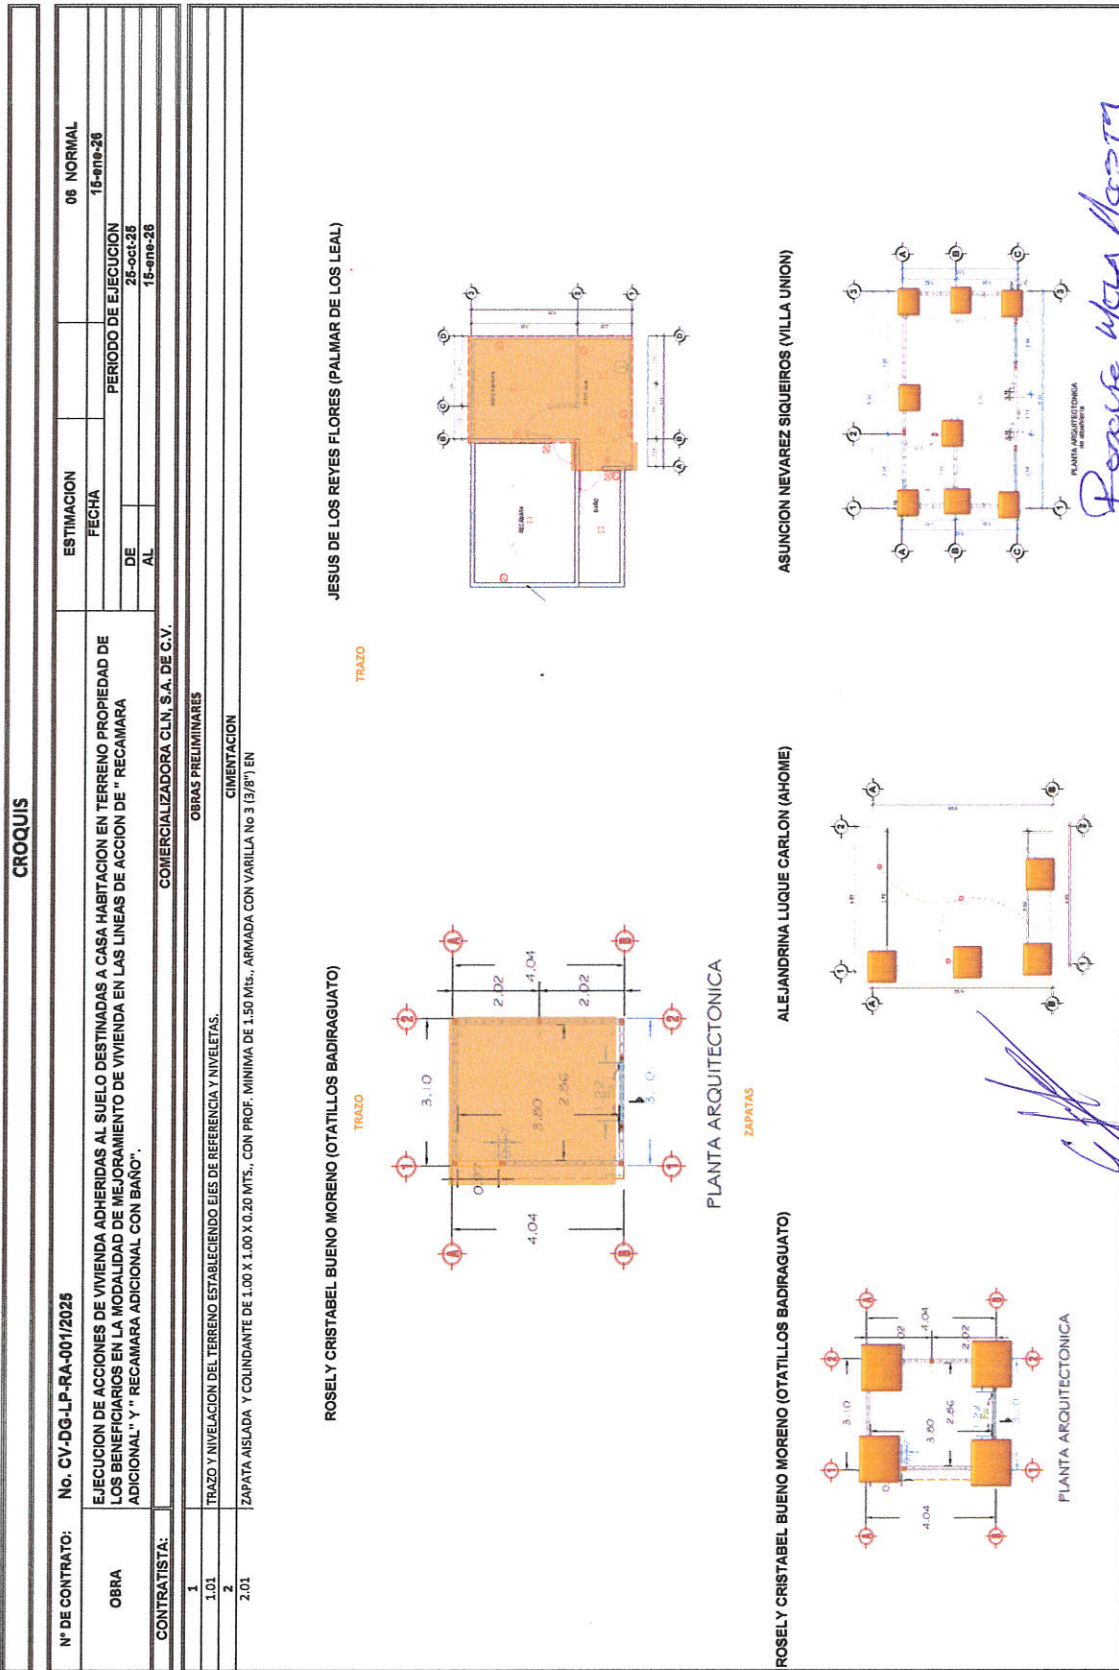

ING. EDUARDO GIOVANNY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

PLANTA ARGUMENTONICA
de disciplina

1


CROQUIS

Nº DE CONTRATO:	Nº. CV-DG-LP-RA-067/2026	ESTIMACIÓN	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	FECHA	16-ene-26
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN S.A. DE C.V.	PERIODO DE EJECUCION	26-oct-25
		DE	16-ene-26
		AL	


2	CIMENTACION
2.05	DALA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 20 CMS., ARMADA CON ARMEX 12 X 20-4, CONCRETO F'C-200 KG/CM2., INCLUYE; CIMBRADO Y DESMIBADO.
2.06	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA.
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C-200 KG/CM2., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.

DALAS DE DESPLANTE


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

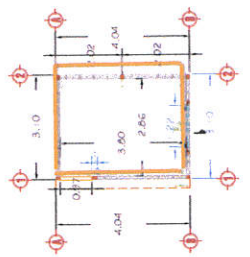


ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)




ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

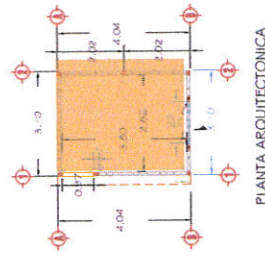

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

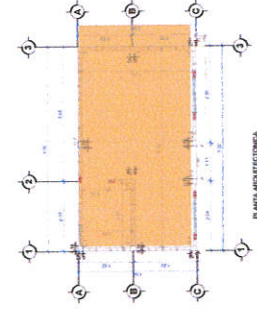

Rodolfo Meza Acosta

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

ING. EDUARDO GUICHAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]




CROQUIS

N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025			ESTIMACION	FECHA	PERIODO DE EJECUCION	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".			DE	28-oct-25	18-nov-25	18-nov-25
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.			AL	18-nov-25		


ESTRUCTURA

3.01	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS., TIPO PESADO, ACABADO APARENTE CARAS, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
3.02	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 12 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO FC=200 KG/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 15-16 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO FC=200 KG/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.
3.04	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 19 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO FC=200 KG/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO) ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

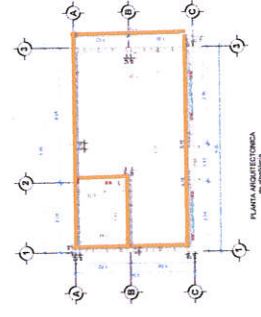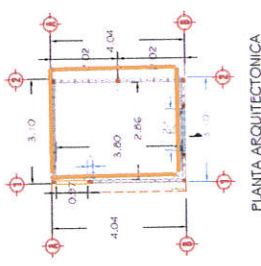


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

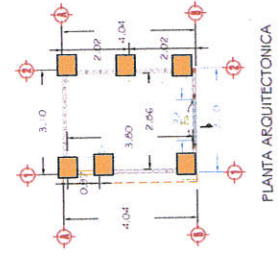

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

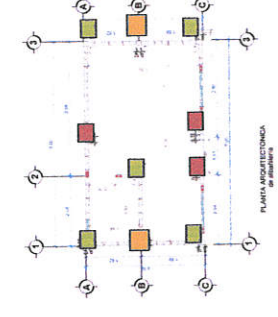

ING. EDUARDO GIGBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARO. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA


Rodolfo Meza Acosta

[Handwritten signature]

CROQUIS


N° DE CONTRATO: NO. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACIÓN		OS NORMAL	
EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO ".		FECHA		15-ene-26	
		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-26	
		DE		15-ene-26	
		AL			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.			
4		LOSA			
4.1		LOSA MAGAZA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA A BASE DE BARROTE, TUJUNO Y DUELA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, COIADO Y CUBADO.			
5.01		LOSA; IMPERMEABILIZANTE			

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)




PLANTA ARQUITECTONICA

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

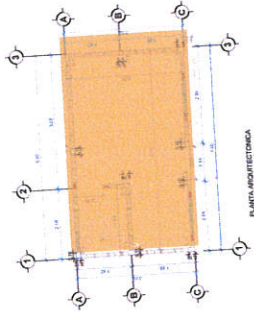

PLANTA ARQUITECTONICA

ING. EDUARDO GIBBANT ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Rodolfo Meza Acosta

ARC. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

CROQUIS

CROQUIS			
No. CV-DG-LP-RA-007/2025			
EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO ".			
ESTIMACION		FECHA	
DE		AL	
PERIODO DE EJECUCION		28-oct-25	
06 NORMAL		15-ene-26	

DETALLES DE ALBANILERIA


6 APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 EN AREA REGADERA (BAÑO), ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

6.02 ENJARRE CON YESO. EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

6.03


APLANADO

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

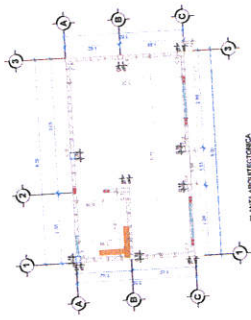


ENJARRE CON YESO


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

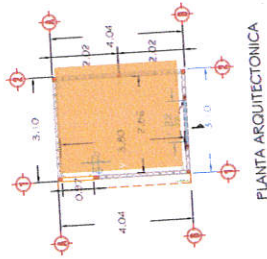

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

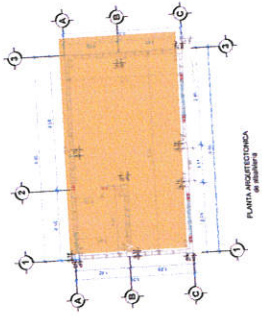

ING. EDUARDO GIBBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Percepcion Acosta
ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA



[Handwritten signature]

CROQUIS

Nº DE CONTRATO:		Nº. GV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO ".		FECHA		16-ene-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-25 15-ene-26	
		PINTURA					
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. MARCA BEREL KALOS TONE O SIMILAR. CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
		PINTURA					

ROSEL Y CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

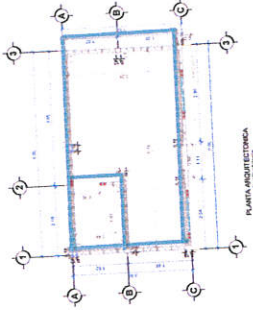

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA


CROQUIS

N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACION		06 NORMAL	
			FECHA		15-ene-26	
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " REGAMARA ADICIONAL" Y " REGAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-25	
			DE		15-ene-26	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		AL			

INSTALACION HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
INSTALACION HIDRAULICA SEGUN PROYECTO A PROYECTO A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA EN ALIMENTACION DE AGUA FRIA.						
INSTALACION SANITARIA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES UNICOPE O CEMENTARIAS PARA DESCARGA, INCLUYE TRAMO DE CONEXION DE LA VIVIENDA A LA RED MUNICIPAL, MAXIMO DE 6.00 MTS.						

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)


INSTALACION HIDRAULICA

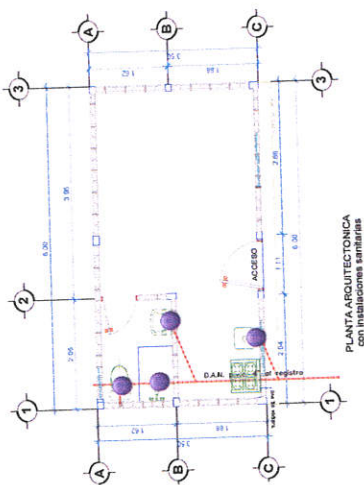

PLANTA ARQUITECTONICA con instalaciones sanitarias

INSTALACION SANITARIA
ALEXIS NATANAHEL CRUZ GERARDO
LEYDI BIBIANA PERAZA PABALAY
ARMIDA ARAID GERARDO VAZQUEZ
AZALIA ERENDIRA CHAVIRA PABALAY
AMERICA VIANEY PROANO TOPETE
JESUS DE LOS REYES FLORES


ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

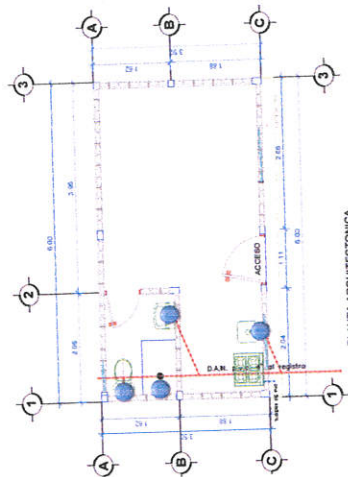

PLANTA ARQUITECTONICA con instalaciones sanitarias

Rodolfo Meza Acosta

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

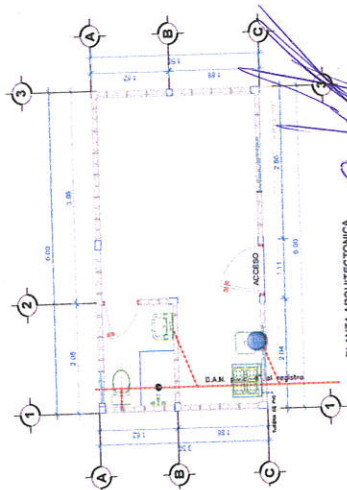

PLANTA ARQUITECTONICA con instalaciones sanitarias

ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

CROQUIS

N° DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2026		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO ".		PERIODO DE EJECUCION 25-oct-26 15-ene-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		ESTIMACION FECHA DE AL	


9
9.01
9.02

INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" CASAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, SOQUETS DE BAQUELITA Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA QUINZIRO O SIMILAR, DE PLASTICO. .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QUE BTICINO O SIMILAR, INCLUIE PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA.

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

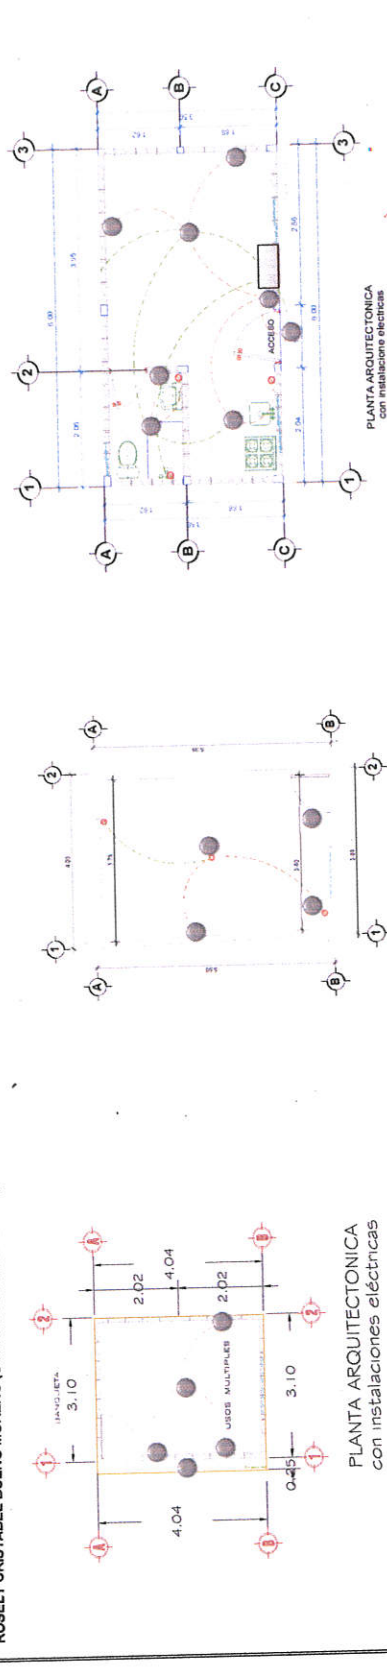

ING. EDUARDO GIBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Rodolfo Meza Acosta

[Signature]

[Signature]



CROQUIS

N° DE CONTRATO: No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION	
OBRA		FECHA	
CONTRATISTA:		PERIODO DE EJECUCION	
		DE	25-oct-25
		AL	15-ene-26

COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
SUMA Y COLOCACION DE MUEBLES DIVERSOS	
SUMA Y COLOCACION DE JUEGO DE MUEBLES PARA BAÑO MARCA CORONA O SIMILAR EN COLOR BLANCO. INCLUYE: W.C., LAVABO, ACCESORIOS, EMPAQUES, LLAVES ETC.	
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ELECTRICA MARCA LORENZETTI O SIMILAR DE 110 VOLTS CON POTENCIA DE 3850 WATTS, CON CABLE CAL. # 10 EN ALIMENTACION Y CABLE CAL. # 13, PARA SISTEMAS DE TIERRA, FORMANDO UN CIRCUITO SECUNDARIO E	
INSTALACION DE TUBO DE VENTILA DE PVC DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESQUIRDERO; MARCA TEKA, INCLUYE: CESPOL DE PLASTICO, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO Y SOPORTES FREGADERO	

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

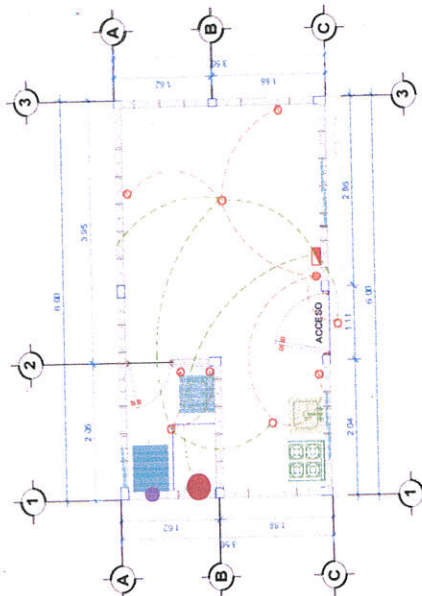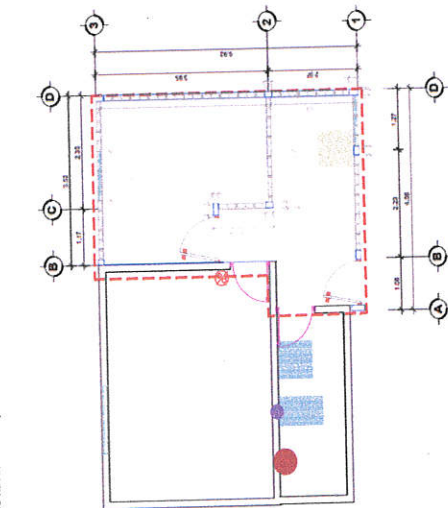

[Signature]

ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
ARQ. RODOLFO MEZA AGOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

CROQUIS

Nº DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACIÓN		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		FECHA		15-ene-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJECUCION		25-oct-25 15-ene-26	
				DE		AL	



11	HERRERIA Y CANCELERIA
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM. PARA VANO DE 1.00 x 1.00 M.
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM. PARA VANO DE 0.50 x 0.40 M.
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PREFABRICADOS DE PERIL TUBULAR No 129 CAL. 20 O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

VENTANA DE 1X1
VENTANA DE 0.6"x0.4
MARCOS PREFABRICADO PARA PUERTAS

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOWE)

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)

MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)

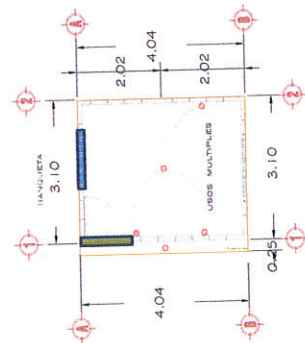
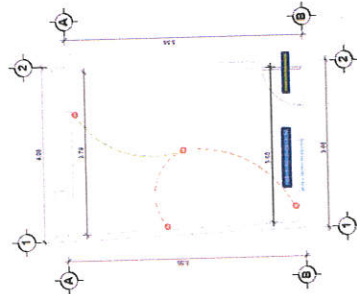


PLANTA ARQUITECTONICA
con instalaciones eléctricas

PLANTA ARQUITECTONICA
con instalaciones eléctricas

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

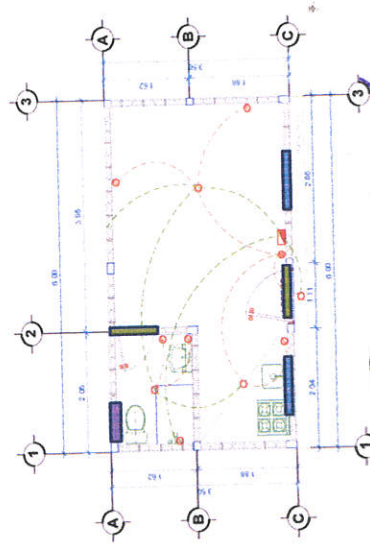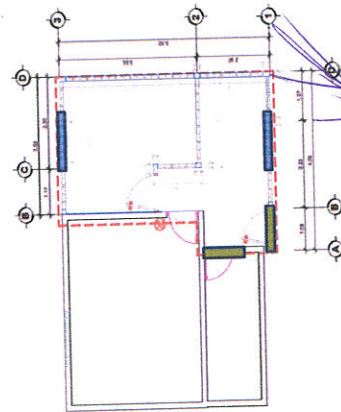

Percepción

ING. EDUARDO GUZMAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

[Signature]

CROQUIS

N° DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACION		06 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		FECHA		16-ene-26	
				PERIODO DE EJECUCION		25-oct-26	
				DE		AL	
				18-ene-26			
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.					




12	CARPINTERIA
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.
12.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 70 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.

PUERTA MULTIPANEL
PUERTA DE TAMBOR

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)

MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)

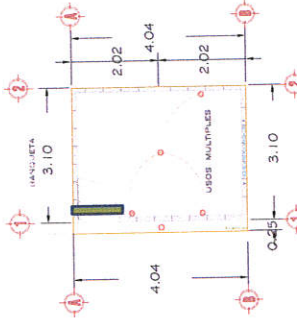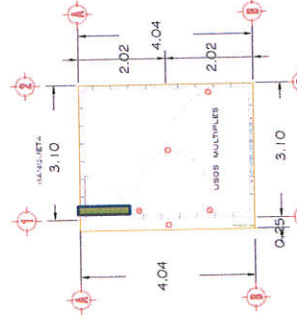
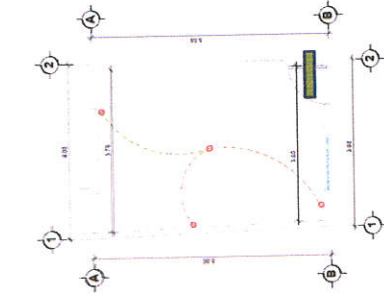


PLANTA ARQUITECTONICA
con instalaciones eléctricas

PLANTA ARQUITECTONICA
con instalaciones eléctricas

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)

ASUNCION NEVAREZ SIQUEROS (VILLA UNION)

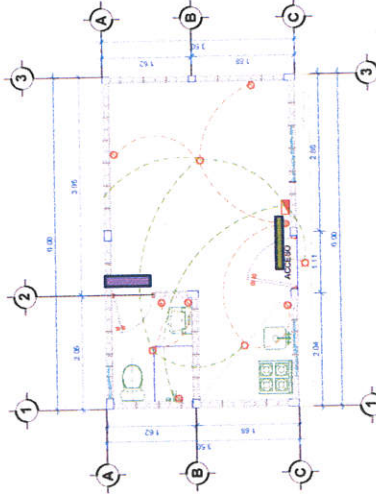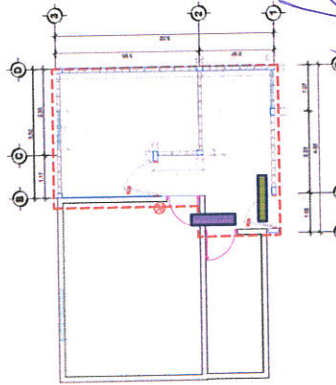

ING. EDUARDO GIORANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Percepcion
ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA


CROQUIS

N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2026		08 NORMAL	
	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		PERIODO DE EJECUCION	
OBRAS			DE	
			AL	
CONTRATISTA:			15-ene-26	
			15-ene-26	


COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
------------------------------------	--

VARIOS	
--------	--


13	13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE, RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRIANTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON, VARIOS
----	-------	---

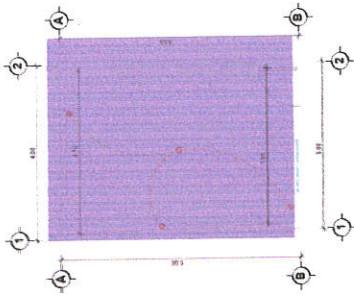


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)

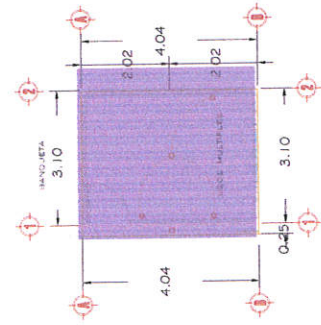


MARIA GRISELDA NUÑEZ CHAIDEZ (COSALA)

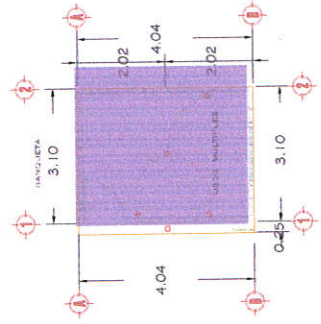

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)

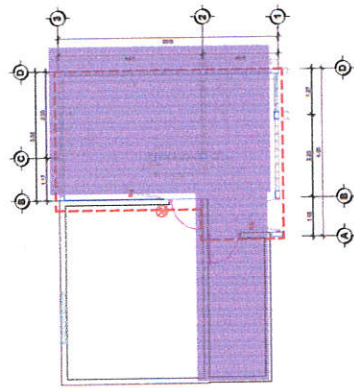

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

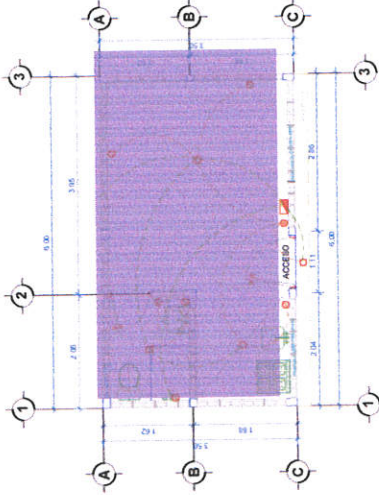

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Rosely Bueno Moreno

ARG. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025			ESTIMACION	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".			FECHA	15-ene-26
				DE	25-oct-25
				AL	15-ene-26

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA CLM, S.A. DE C.V.

OBRA PRELIMINARES

1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELITAS.	CIMENTACION
2	ZAPATA AISLADA Y COUNDANTE DE 1.00 X 1.00 X 0.20 MTS., CON PROF. MINIMA DE 1.50 Mts., ARNADA CON VARILLA No 3 (3/8") EN	

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)



TRAZO

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)



TRAZO

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)



ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ZAPATAS

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)



ING. EDUARDO GIBBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO				
N° DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMANA ADICIONAL Y " RECAMANA ADICIONAL CON BARO".			ESTIMACION FECHA
				DE AL
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLM, S.A. DE C.V.			PERIODO DE EJECUCION 20-oct-23 19-07-26
ESTRUCTURA				
3.01	MURO DE BLOCK 12 X 20 X 40 CMS., TIPO PESADO, ACABADO APARENTE CARAS, ACENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.			
3.02	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 12 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.			
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 15-16 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.			
3.04	CASTILLO DE CONCRETO DE 12 X 13 CMS., ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 12-4, CONCRETO Fc=200 kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.			
MURGO				
ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)	ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	
				
ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)	ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)		ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)	
				

ING. RODOLFO MEZA ACORTA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Rosely

REPORTE FOTOGRAFICO

N° DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO "		FECHA	15-ene-26
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA GLI, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJECUCION	24-oct-25
			DE	15-ene-20
			AL	

3.05	CELDA AHOGADA DE CONCRETO EN BLOCK DE 12 X 12 X 40 CMS. CON 1 VARILLA DE 3/8. CONCRETO Fc=200 kg/cm2. INCLUYE: ANCLAJE, VIBRADO, MATERIALES.
3.06	DALA DE CERRAMIENTO DE 12 X 20 CMS. ACABADO APARENTE, ARMADO CON ARMEX 12 X 20-4 Y CONCRETO Fc=200kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES.

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

CELDA AHOGADA, DALA DE CERRAMIENTO

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)



Rodolfo Meza Acosta

ARG. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

ING. EDUARDO GIOVANNI ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

7


REPORTE FOTOGRAFICO

Nº DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACION	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		FECHA	15-ene-26
CONTRATISTA:			PERIODO DE EJECUCION	28-oct-25
			DE	18-nov-26
			AL	

COMERCIALIZADORA CLH, S.A. DE C.V.	LOSA
LOSA MACIZA DE 10 CMS DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 40 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA, A BASE DE BARROTE, TUINO Y DUELA, APUNTALADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, COLADO Y CURADO.	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA	

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)

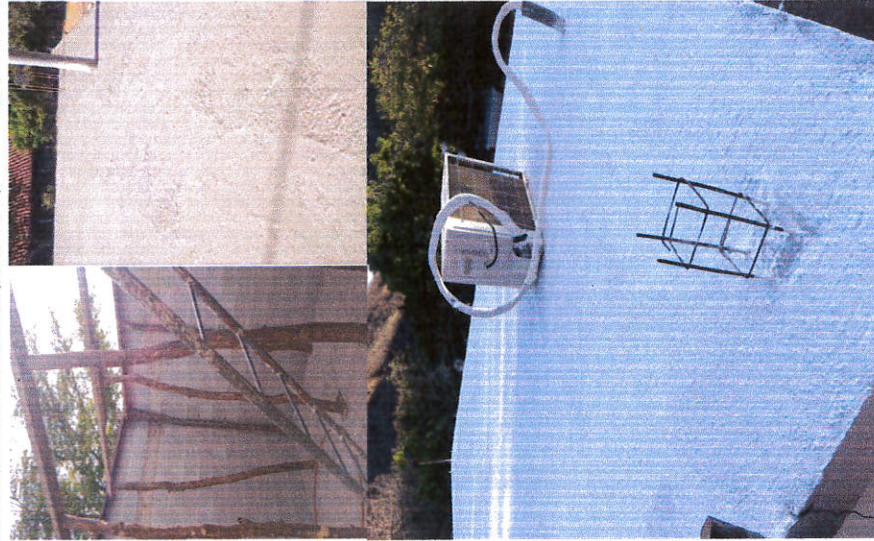

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)



Rodolfo Meza Acosta

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

ING. EDUARDO GIOBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

Nº DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025			ESTIMACION	06 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO "			FECHA	15-ene-28
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLM, S.A. DE C.V.			PERIODO DE EJECUCION	23-oct-25
				DE	15-ene-28
				AL	

6	APLANADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 EN AREA REGADERA (BAÑO), ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
6.03	ENARRE CON YESO, EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

APLANADO

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)



ENARRE CON YESO


ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS B.)



ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

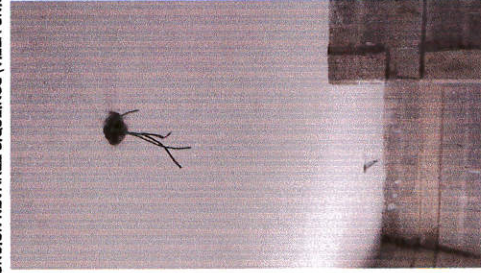

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Rodolfo Meza Acosta

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

N° DE CONTRATO:		No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION		00 NORMAL	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO "		FECHA		15-ene-26	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJECUCION		28-oct-25	
				DE		19-ene-26	
				AL			



7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES. MARCA BEREL KALOS TONE O SIMILAR, CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
---	---

PINTURA

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

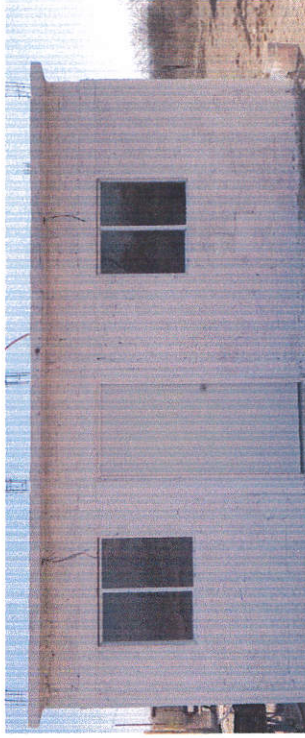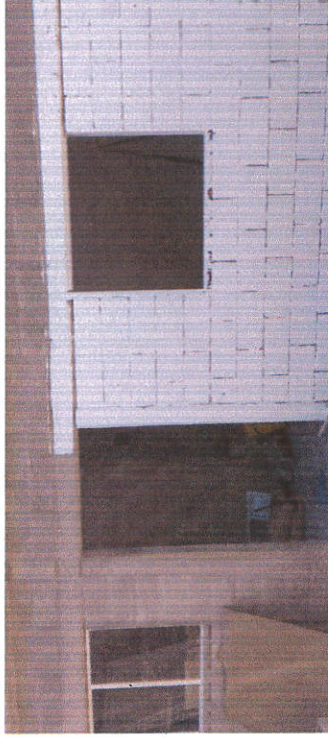

ING. EDUARDO GILMAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

ASO. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Rosely Bueno Moreno

[Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO

Nº DE CONTRATO:	Nº. CV-DG-LP-RA-001/2025	
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
	ESTIMACION FECHA	06 NORMAL 15-ene-26
	DE	PERIODO DE EJECUCION 28-oct-25
	AL	15-ene-26


8	INSTALACION HIDRAULICA SEGUN PROYECTO A PROYECTO A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA EN ALIMENTACION DE AGUA FRIA.	
8.02	INSTALACION SANITARIA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES UNICOPIE O CEMENTABLES PARA DESCARGA. INCLUYE TRAMO DE CONEXIÓN DE LA VIVIENDA A LA RED MUNICIPAL, MÁXIMO DE 6.00 MTS.	

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)
INSTALACION HIDRAULICA



INSTALACION SANITARIA
ALEXIS NATANAHEL CRUZ GERARDO
LEYDI BIBIANA PERAZA PABALAY
ARMIDA ARAID GERARDO VAZQUEZ
AZALIA ERENDIRA CHAVIRA PABALAY
AMERICA VIANEY PROAÑO TOPETE
JESUS DE LOS REYES FLORES

ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)

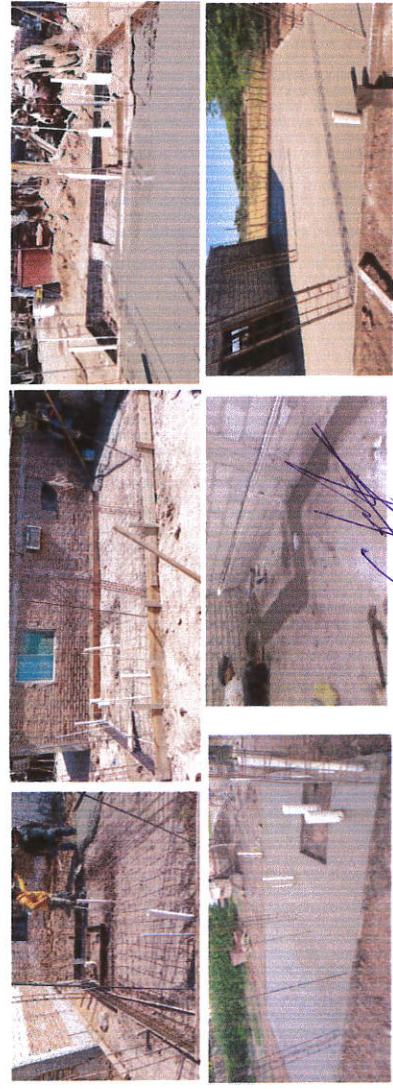

Rodolfo Meza Acosta
ARO. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. EDUARDO GILMAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

T


REPORTE FOTOGRAFICO

Nº DE CONTRATO:	No. CV-DG-LP-RA-001/2025		ESTIMACION	00 NORMAL
OBRA	EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE " RECAMARA ADICIONAL " Y " RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO "		FECHA	15-ene-20
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CLH, S.A. DE C.V.		PERIODO DE EJECUCION	26-ene-20
			DE	19-ene-20
			AL	19-ene-20

9	INSTALACION ELECTRICA	ASUNCION NEVAREZ SIQUEIROS (VILLA UNION)
9.01	INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, SOQUETS DE BAQUELITA Y ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA QUINZINO O SIMILAR, DE PLASTICO .	
9.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q06 BTICINIO O SIMILAR; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA.	

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS BADIRAGUATO)

ALEJANDRINA LUQUE CARLON (AHOME)

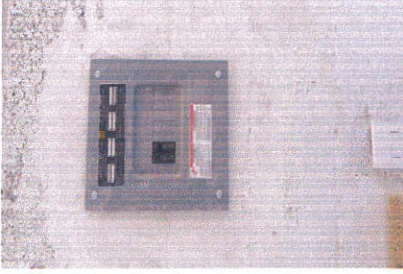

Rosely Crisabel Bueno Moreno
ARQ. RODOLFO MEZA AGOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. EDUARDO GIMARAY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

REPORTE FOTOGRAFICO


Nº DE CONTRATO:		Nº. CV-DG-LP-RA-001/2025	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
		ESTIMACION FECHA	06 NORMAL 15-ene-26
		DE	PERIODO DE EJECUCION 25-oct-25
		AL	15-nov-26

10	SUM. Y COLOCACION DE MUEBLES DIVERSOS
10.01	SUM. Y COLOCACION DE JUEGO DE MUEBLES PARA BAÑO MARCA CORONA O SIMILAR EN COLOR BLANCO. INCLUYE: W.C., LAVABO, ACCESORIOS, EMPAQUES, LLAVES ETC.
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGADERA ELECTRICA MARCA LORENZETTI O SIMILAR DE 110 VOLTS CON POTENCIA DE 3850 WATTS, CON CABLE CAL. # 10 EN ALIMENTACION Y CABLE CAL. # 13 PARA SISTEMAS DE TIERRA, FORMANDO UN CIRCUITO SECUNDARIO E
10.03	INSTALACION DE TUBO DE VENTILACION DE PVC DE 1 1/2". INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
10.031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO; MARCA TEKA. INCLUYE: CESPOL DE PLASTICO, LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO Y SOPORTES FREGADERO

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEA)



ASUNCION NEVAREZ BIQUEROS (VILLA UNION)

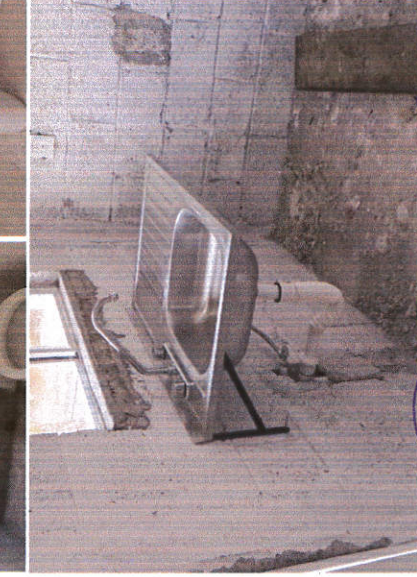

ING. EDUARDO GIORANI ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

RODOLFO MEZA AGOSTA
SUPERVISION DE OBRA

Handwritten signature or mark.

REPORTE FOTOGRAFICO

N° DE CONTRATO: No. CV-DG-LP-RA-001/2026		ESTIMACION		08 NORMAL
EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".		FECHA		15-ene-28
		DE		28-oct-25
		AL		18-feb-28
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.		

11	HERRERIA Y CANCELERIA
11.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 1.00 x 1.00 M.
11.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PREFABRICADA O SIMILAR DE 1 1/2" CORREDIZA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 3 MM, PARA VANO DE 0.60 x 0.40 M.
11.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS PREFABRICADOS DE PERIL TUBULAR No 129 CAL 20 O SIMILAR: INCLUDE: PINTURA, BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

VENTANA DE 1X1
VENTANA DE 0.6"x0.4

ALIJAIRINA LUQUE CARLON (ANOVE)



ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)




MARIA ORIBELDA NUÑEZ CHAVEZ (COSALLA)



JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEROS (VILLA UNION)



ING. EDUARDO GIBBANY ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISION DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO


Nº DE CONTRATO:		Nº. CV-06-LP-RA-001/2026	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
		ESTIMACION	06 NORMAL
		FECHA	15-ene-26
		PERIODO DE EJECUCION	28-oct-25
		DE	15-ene-26
		AL	

12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 90 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.
12.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 70 X 210-223 CMS. INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MARCA FANAL, PHILLIPS O SIMILAR.


PUERTA MULTIPANEL
PUERTA DE TAMBOR

ALEJANDRINA LUCHE CARLON (AHOME)

ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)

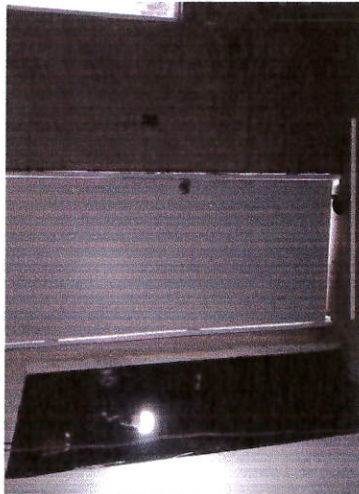


MARIA GRIBELDA NUÑEZ CHADEZ (COBALA)

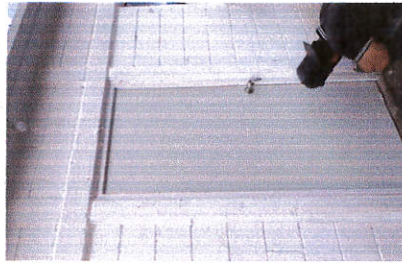

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)



ASUNCION NEVAREZ BIQUEROS (VILLA UNION)

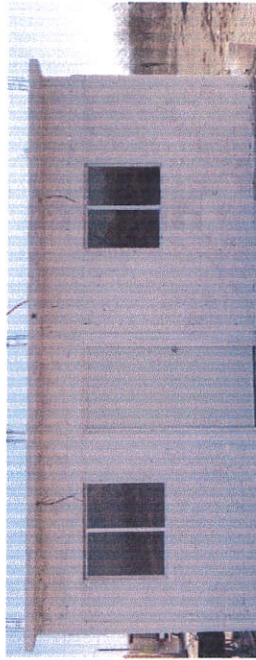

ING. EDUARDO GIBRAN ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

Rosely Moren
ARO. RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]

REPORTE FOTOGRAFICO


Nº DE CONTRATO:		Nº. CV-DG-LP-RA-001/2026	
OBRA		EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS A CASA HABITACION EN TERRENO PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LINEAS DE ACCION DE "RECAMARA ADICIONAL" Y "RECAMARA ADICIONAL CON BAÑO".	
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CLN, S.A. DE C.V.	
ESTIMACION		06 NORMAL	
FECHA		15-ene-20	
DE		28-ene-20	
AL		18-ene-20	

13		VARIOS	
13.01		LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL SOBRIANTE Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON, VARIOS	


ALEXANDRINA LUQUE CARLON (AHOWE)



ROSELY CRISTABEL BUENO MORENO (OTATILLOS)

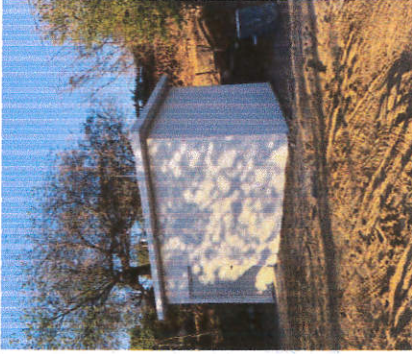


MARIA GRIBELDA NUÑEZ CHADEZ (COSALA)

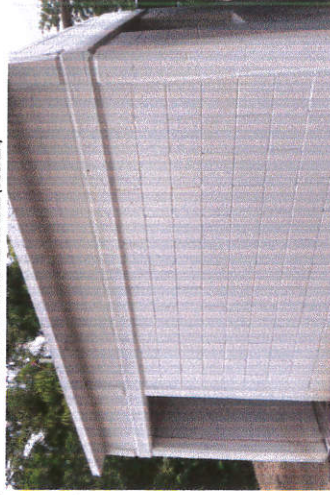

JESUS DE LOS REYES FLORES (PALMAR DE LOS LEAL)



ASUNCION NEVAREZ SIQUEROS (VELLA UNION)

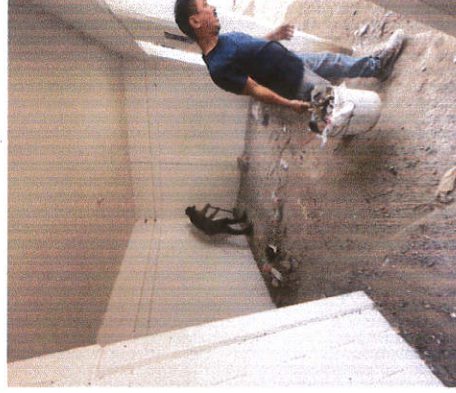

ING. EDUARDO GIOVANNI ESPINOZA SARABIA
REPRESENTANTE LEGAL

RODOLFO MEZA ACOSTA
SUPERVISOR DE OBRA
