

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION No. 2 (DOS)

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE,
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

FECHA: 19-jul-25

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-010

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO DEL CONTRATO S/IVA	\$ 1,389,660.02	
ESTIMACION No. 1 (UNO)	\$ 471,959.33	\$917,700.69
ESTIMACION No. 2 (DOS)	\$ 154,464.42	\$763,236.27

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ 694,830.01	
ESTIMACION No. 1 (UNO)	\$ 235,979.66	\$458,850.35
ESTIMACION No. 2 (DOS)	\$ 77,232.21	\$381,618.14

LIQUIDACION ESTIMACION No. 2	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/IVA	\$ 154,464.42
MENOS AMORTIZACION	\$ 77,232.21
SUMA	\$ 77,232.21
MAS 16% DE IVA	\$ 12,357.15
TOTAL	\$ 89,589.36
DEDUCCIONES	
3% INSP. CONTROL Y VIG.	\$4,633.93
SALDO LIQUIDO	\$ 84,955.43

FORMULO

ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA
CONTRATISTA

REVISO

ING. ROSARIO PEREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO DE LA JUMAPAS

AUTORIZO

ING. CARLOS EDUARDO BRACHO GARCIA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						MONTO DEL CONTRATO:	\$ 1,389,660.02
						ACUMULADO ANTERIOR:	\$471,959.33
CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.						ACUMULADO TOTAL:	\$626,423.75
CONTRATO No. FISM-JMA-SIN-2025-010 ESTIMACION No. 2 (DOS)						ESTA ESTIMACION:	\$154,464.42
OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						SALDO:	\$ 763,236.27
PERIODO DE EJECUCION: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025							

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA				IMPORTE	
				SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO							
	5030 00	PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL...							
1	5030 01	TIPO I DE 0 A 100 M.	ML	20.00	20.00	0.00	20.00	1,693.86	33,877.20
2	5030 09	TIPO II DE 0 A 100 M.	ML	34.00	30.00	0.00	30.00	3,048.93	91,467.90
	5040 02	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL...							
3	5040 19	TIPO I DE 0 A 100 M.	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	2,202.01	26,424.12
	5061 00	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME DE SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO							
4	5061 08	DE 18" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR.	ML	12.00	12.00	0.00	12.00	224.60	2,695.20
				TOTAL PARTIDA POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO:				154,464.42	
				TOTAL ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO):				\$154,464.42	

ELABORO:

ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA
CONTRATISTA

REVISO:

ING. ROSARIO PEREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO DE LA JUMAPAS

AUTORIZO:

ING. CARLOS EDUARDO BRACHO GARCIA
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA					ESTIMACION No. 2 (DOS)		EMPRESA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.				
NUMEROS GENERADORES											
CONTRATO:	FISM-JMA-SIN-2025-010			PERIODO	01 DE JULIO DEL 2025 A 16 DE AGOSTO DEL 2025					FECHA:	16/08/2025
OBRA:	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA..										
ESPECIFICACION	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	UNIDAD					PARCIAL	TOTAL	
1	POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO										
5030 00	PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL...										
5030 01	TIPO I DE 0 A 100 M.			ML	20.00				20.00	20.00	A ESTIMAR
5030 09	TIPO II DE 0 A 100 M.			ML	30.00				30.00	30.00	A ESTIMAR
5040 02	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL...										
5040 19	TIPO I DE 0 A 100 M.			ML	12.00				12.00	12.00	A ESTIMAR
5061 00	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME DE SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO										
5061 08	DE 18" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR.			ML	12.00				12.00	12.00	A ESTIMAR

ELABORO:


MORALES RUIZ Mario H.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:


ARMANDO V.
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

ROSARIO P.
ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

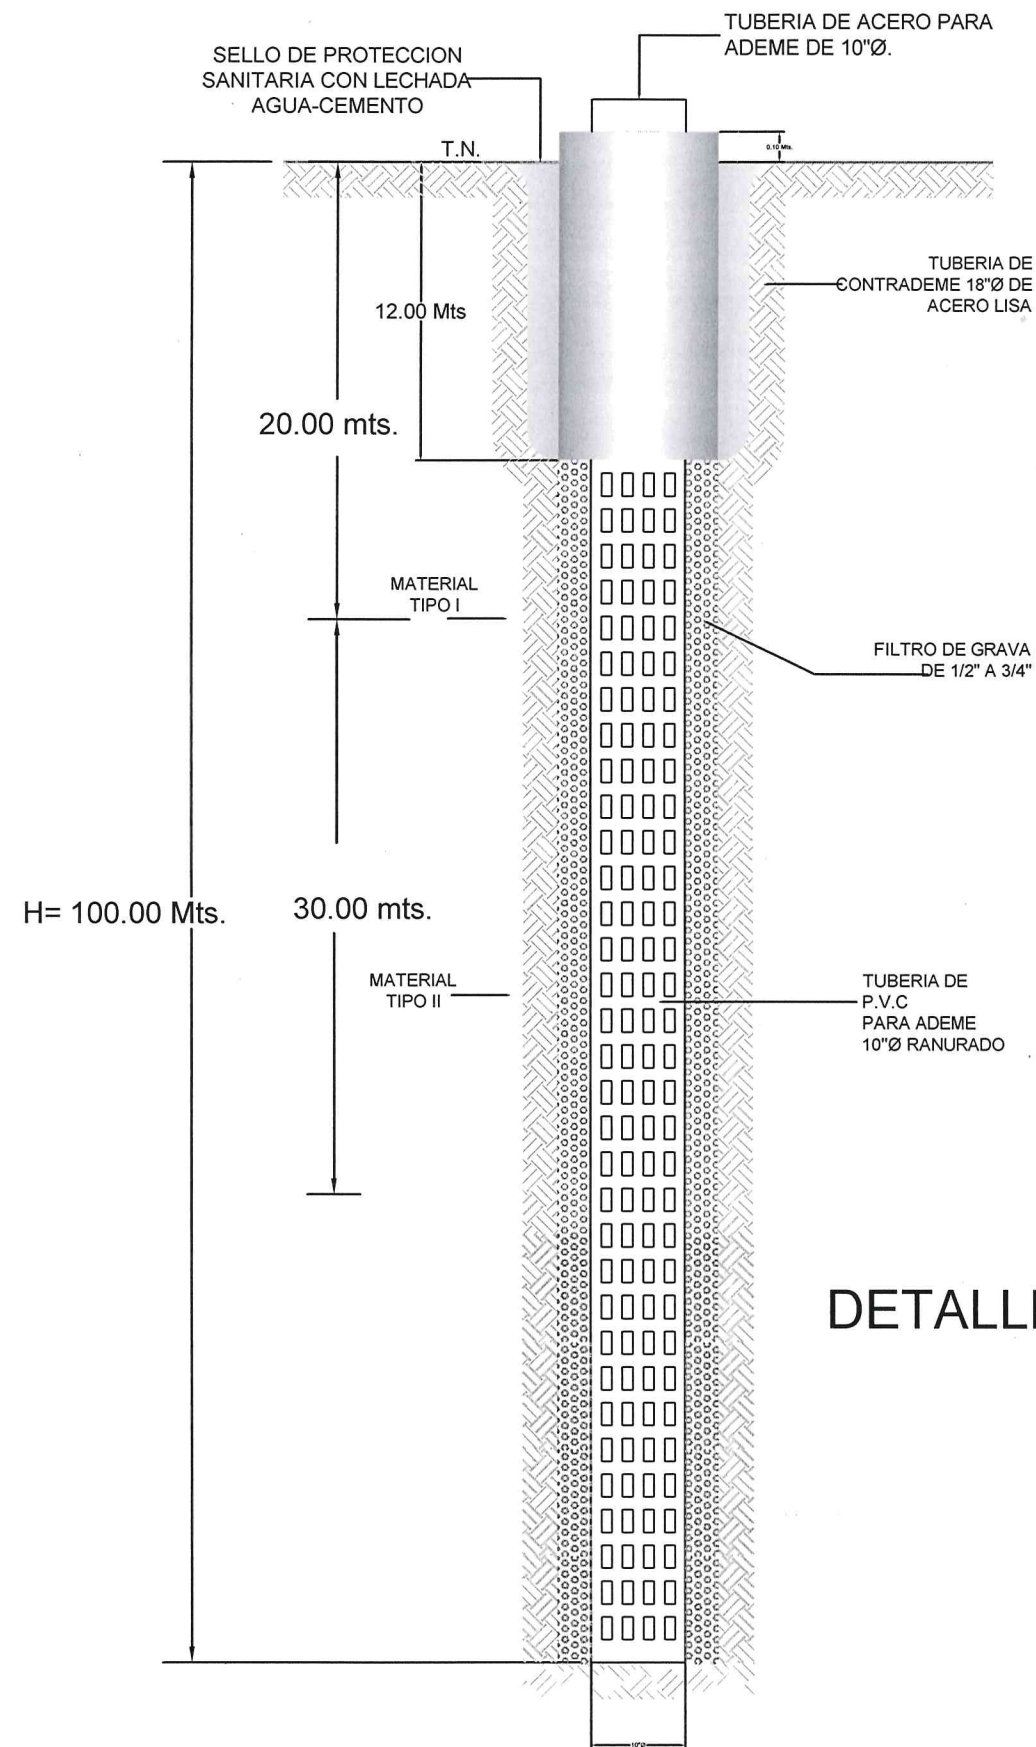

DETALLE DE POZO PROFUNDO

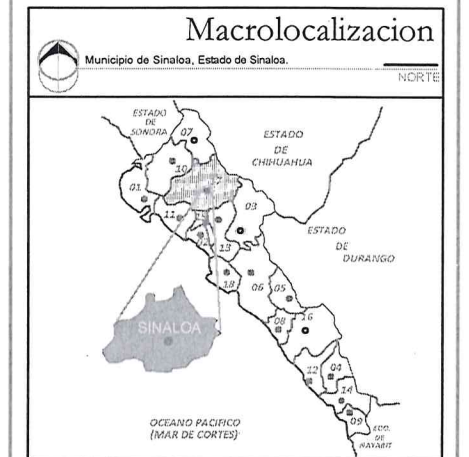

ESTIMACION No. 2 (DOS)

MORALES Ruiz Mario H.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA	
JUMAPAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA.	
Localizacion	Municipio
EL MEZQUITE	SINALOA
Obra CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.	
Contenido	
Detalle de Perforacion	
Acotaciones	Escala
En Metros	Sin escala
Dibujo	Proyecto
Ing. Armando Valenzuela Soto	Departamento Técnico de Jumapas.
Reviso	Vo.Bo.
Ing. Rosario Vazquez Armenta	Ing. Carlos Rolando Bracho Garcia
No. de plano	Fecha
01	JULIO/2025

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA:
OBRA:

NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 2 (DOS)

FECHA: 19-jul-25

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-010

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025

POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL...



* TIPO I DE 0 A 100 M.

ELABORO:

MORALES RUIZ MARIO H.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Armando V. Soto
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Rosario Pérez Armenta
ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 2 (DOS)

OBRA:

FECHA: 19-jul-25

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-010

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025

POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO
PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL...



* TIPO II DE 0 A 100 M.

ELABORO:

REVISO JUMAPAS:

REVISO JUMAPAS:

MORALES RUIZ MARIO H.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Armando S.
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

Rosario Pérez Armenta
ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 2 (DOS)

OBRA:

FECHA: 19-jul-25

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-010

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025

POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 20" EN MATERIAL...



* TIPO I DE 0 A 100 M.

ELABORO:

MORALES Ruiz Mario H.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Armando V S
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Rosario Pérez Armenta
ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACION No. 2 (DOS)

OBRA:

FECHA: 19-jul-25

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No.: FISM-JMA-SIN-2025-010

PERIODO: 01 DE JULIO DEL 2025 A 19 DE JULIO DEL 2025

POZO PROFUNDO DE 100 MTS Y 10" DE DIAMETRO

COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME DE SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO



* DE 18" DE DIÁMETRO X 1/4" DE ESPESOR.

ELABORO:

MORALES RUIZ MARIO F.
ING. MARIO HORACIO MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Armando V. Soto
ING. ARMANDO VALENZUELA SOTO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO JUMAPAS:

Rosario Pérez Armenta
ING. ROSARIO PÉREZ ARMENTA
SUBGERENTE TECNICO
