



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/730/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACIÓN 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 08 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$678,176.14 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA
- No. DE FACTURA: #8608, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.C.P. ARCHIVO

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
SECRETARÍA

08 DIC 2025
Adrian A
RECIBIDO
05:49 PM

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="156" Fecha="2025-12-
08T11:22:30"
Sello="YhXAvtGADkmZzCjgE1XNMqCROIdOoL6KngYDp8IoG6syOfvLvpqbm2wJWin5+t38NYTkzIzUfrX2qI0a3TiJbf+HlmGHZQBv4SxivieACVNBfGDIGHEGERMNwxUqDXgrCIOMi/wSAXuLBDq3vr
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUuMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="608859.79" Moneda="MXN" Total="706277.36" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO
NETO: $ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 936,707.37 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 327,847.58 TOTAL: $ 608,859.79 (+) MAS 16% IVA: $ 97,417.57
TOTAL: $ 706,277.36 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 28,101.22 SALDO LIQUIDO: $ 678,176.14" ValorUnitario="608859.79" Importe="608859.79" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="608859.79" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="97417.57"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97417.57">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="97417.57" Base="608859.79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5FE294A8-CF56-49CD-B096-5B60F5248608"
FechaTimbrado="2025-12-08T12:22:34" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="YhXAvtGADkmZzCjgE1XNMqCROIdOoL6KngYDp8IoG6syOfvLvpqbm2wJWin5+t38NYTkzIzUfrX2qI0a3TiJbf+HlmGHZQBv4SxivieACVNBfGDIGHEGERMNwxUqDXgrCIOMi/wSAXu
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="FhE80mYB6DwywGskPhPFm08I198LbxwXr0rohXP5OI0ZDxussuwfSr5vqumOk1Lhzn5LkiPu4c2KL3K+68RifU2ImPM0wT402ZPtWofGAKeGi3XPq77MPyi1B8TYKTe68hoDgQ5
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SC0230519155
NORTE 2 No. 2167 No. Int S/N,
Los Mochis C.P. 81271 Ahome
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 156

FECHA: 8/12/2025 11:22:30

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBG8R-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 936,707.37 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 327,847.58 TOTAL: \$ 608,859.79 (+) MAS 16% IVA: \$ 97,417.57 TOTAL: \$ 706,277.36 DEDUCCIONES 3% SVFYC: \$ 28,101.22 SALDO LIQUIDO: \$ 678,176.14	608,859.79 002 - IVA - 97,417.57	608,859.79

CANTIDAD CON LETRA: (SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$608,859.79
IVA 16%	\$97,417.57
TOTAL	\$706,277.36

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

5FE294A8-CF56-49CD-B096-5B60F5248608

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 8 2025 - 12:22:34

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YhXAVIGADkmZzCjgEIXNMqCROldOoL6KngYDpBloG6syOfvlpqbm2wJWin5+138NYTkzIzUfrX2qI0a3TlJbf+HlmGHZQBv4Sxi
vieACVNBIGDIGHEGERMNwXUqDXgrCIOM/w5AXuLBDq3vmyS5pyfcoyOK4FQd2mEjPrfISn5HS5xr3zf1f9z5X5vz+5GImOvS8c
vuor/Wfm7JpoXFJqqGkiBUZytKPKLJqD44r8TeKqXkW8213x4VcIcaHYCTNg8vplfY990BSltctvIGIEqczIOWAPkxW2AKBu8Yk
8zBG1voYwx36JiAJehxt6K+0u/XvO3sU8UzZ5UVw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5FE294A8-CF56-49CD-B096-5B60F5248608|2025-12-08T12:22:34|MAS0810247C0|YhXAVIGADkmZzCjgEIXNMqCR
OldOoL6KngYDpBloG6syOfvlpqbm2wJWin5+138NYTkzIzUfrX2qI0a3TlJbf+HlmGHZQBv4SxiACVNBIGDIGHEGERMNwXUq
DXgrCIOM/w5AXuLBDq3vmyS5pyfcoyOK4FQd2mEjPrfISn5HS5xr3zf1f9z5X5vz+5GImOvS8cvuor/Wfm7JpoXFJqqGkiBUZ
ytKPKLJqD44r8TeKqXkW8213x4VcIcaHYCTNg8vplfY990BSltctvIGIEqczIOWAPkxW2AKBu8Yk8zBG1voYwx36JiAJehxt6K
+0u/XvO3sU8UzZ5UVw==||00001000000709182898||

SELLO DEL SAT

PhE8OmYB6DwywGakPhPFmO8l198LbrwXr0rohXP5QIOZDxdussuwfS5vexumOkLhzn5LkiPu4c2KL3K+68RiIU2lmPM0WT402
ZPhwYofSAKEG3XKp77MPy1B8TYKT68hoDgQ5XV/SCGKKDK9EBzocQeS8bERsEjZDwuyT11+NNY8EX065ztUAsJi4txgky
M+dnfmhXQqVUWv8TqW9qjSwnxlcR8HstEXj+v3rDXgwMP4tPfgTEgJkxgs1vIvEmEDHGTpBUm4FkFDpK19C8mnU/TN1LH/I
+9zB04jCR064IH5PeAaJKQY0a1gixqyGnZV4/Jlw==

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. (706,277.36 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5 % mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma



Fecha: 02-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 01 (NORMAL)	
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO: 0	CEL: 6681861376	DEL	02-oct-25
R.F.C. SCO-230519-155		AL	02-nov-25
		FECHA DE CONTRATO: 19-sep-25	
DEPENDENCIA:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD:	MUNICIPIO:
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.	BADIRAGUATO	BADIRAGUATO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
		INICIO:	02-oct-25
		TERMINACIÓN:	30-nov-25
CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$3,572,318.11	\$4,143,889.01	\$1,450,361.15	\$4,143,889.01
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:			BUENO POR:
\$ 678,176.14 (SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)			\$ 678,176.14
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (NORMAL)			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 327,847.58	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 936,707.37
MAS I.V.A.:	\$ 52,455.61	MAS I.V.A 16 %	\$ 149,873.18
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 380,303.19	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,086,580.55
3 % SVIFYC:	\$ 28,101.22	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 408,404.41
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 408,404.41		
		SALDO A PAGAR:	\$ 678,176.14

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		Estimacion:	
		Fecha: 2 de noviembre de 2025		01 (NORMAL)	
Periodo de la estimacion: 02/10/2025 al 02/11/2025		Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución: 02/10/2025 al 30/11/2025		BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo	
\$ 4,143,889.01		\$ 3,572,318.11		\$ 1,450,361.15	
				Importe Anticipo sin I.V.A	
				\$ 1,250,311.34	
				% de Avance	
				26%	
				% Avance Total	
				26%	

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 936,707.37	ESTA ESTIMACION
\$ 380,303.19	16 % I.V.A (+) \$ 149,873.18	\$ 1,086,580.55
	Sub- Total A (=) \$ 1,086,580.55	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 327,847.58	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	16 % I.V.A (+) \$ 52,455.61	\$ -
	Total (=) \$ 380,303.19	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 608,859.79	TOTAL ACUMULADO.
\$ 380,303.19	16 % I.V.A (+) \$ 97,417.57	\$ 1,086,580.55
	Total (=) \$ 706,277.36	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 28,101.22	CONTRATADO
\$ 1,450,361.15	Total Deducciones (=) \$ 408,404.41	\$ 4,143,889.01
	Importe T O T A L \$ 678,176.14	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 678,176.14	SALDO
\$1,070,057.96	Son: (SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)	\$ 3,057,308.46

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 02/11/2025

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)			
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	02-oct-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	30-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025	FECHA CONTRATO:	19-sep-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRAS:	\$1,450,361.15	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO	\$4,143,889.01	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$4,143,889.01		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)	02-oct-25	02-nov-25	\$ 1,086,580.55	\$ 936,707.37	\$ 28,101.22	\$ 380,303.19	\$ 408,404.41	\$ 678,176.14
TOTALES:			\$ 1,086,580.55	\$ 936,707.37	\$ 28,101.22	\$ 380,303.19	\$ 408,404.41	\$ 678,176.14
SALDO DEL CONTRATO:			\$3,057,308.46	SALDO POR AMORTIZAR:		\$1,070,057.96		

C. ANA MARCELA ARMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO



ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA

02/11/2025

CONTRATISTA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

OBRA

IMPORTE

1	PRELIMINARES	\$	936,707.37
102	ESTRUCTURA	\$	-
1003	INSTALACIONES ESPECIALES	\$	-
105	TRABAJOS FINALES	\$	-

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$	936,707.37
----------------------	----	------------

SUB TOTAL=	\$	936,707.37
I.V.A AL 16 %	\$	149,873.18
TOTAL =	\$	1,086,580.55

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA 02/11/2025
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,276.24	\$ 22.19	\$ 50,509.77	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	\$ 38,677.17
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,251.93	\$ 118.82	\$ 148,754.32	958.65	0.00	0.00	958.65	\$ 113,906.79
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	2,276.24	\$ 36.90	\$ 83,993.26	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	\$ 64,316.70
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	2,276.24	\$ 168.66	\$ 383,910.64	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	\$ 293,974.38
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	2,276.24	\$ 193.09	\$ 439,519.18	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	\$ 336,555.87
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2 INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,276.24	\$ 51.22	\$ 116,589.01	1,743.00	0.00	0.00	1,743.00	\$ 89,276.46
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 936,707.37

TOTAL ESTIMACION	\$ 936,707.37
I.V.A.	\$ 149,873.18
TOTAL	\$ 1,086,580.55

ELABORO


C. ANA MARCELA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 1 de 2

GENERADORES ESTIMACION: 01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	210.00	8.30			1,743.00		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,743.00	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	210.00	8.30	0.55		958.65		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	958.65	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	210.00	8.30			1,743.00		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,743.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 2 de 2

GENERADORES ESTIMACION:

01 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	210.00	8.30			1,743.00		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,743.00	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	210.00	8.30			1,743.00		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,743.00	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	210.00	8.30			1,743.00		PAVIMENTO Y GUARNICIÓN
							TOTAL	1,743.00	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 02/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:


CONTRATISTA:

1 de 1

ESTIMACIÓN: 01 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

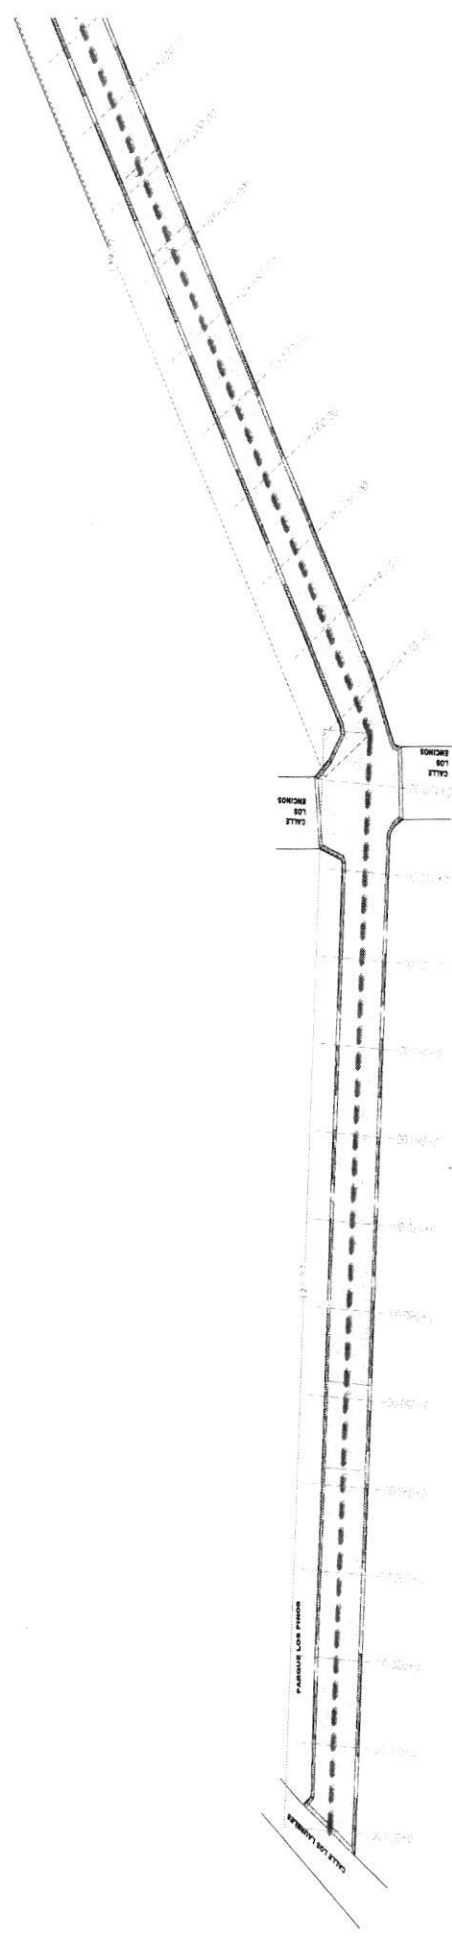

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESÚS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 02/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

OBRA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.







CONTRATISTA:

ESTIMACION: 01 (NORMAL)

1 de 1

PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORO

ING. JESÚS JOAQUÍN MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta10/12/2025 6:50:45 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 01 NORM LP 008	Importe de la operación: 678,176.14 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 030743900036659975
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta: SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV
Nombre banco destino: BAJIO	Fecha valor: 11/12/2025
Fecha de creación: 10/12/2025	Fecha de aplicación: 10/12/2025
Concepto de pago: EST 01 NORM LP 008	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 18:50:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000218882	Clave de rastreo: 002601002512110000218882
Folio de firma: 0067503021	Folio único: I401202512101850420067503027

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025
