



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/772/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACIÓN 02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025


MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$1,749,109.28 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 28/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA
- No. DE FACTURA: #525F, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.C.P. ARCHIVO
BADIRAGUATO, SINALOA.



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

15 DIC 2025
Adrián G
RECIBIDO
17:52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 159

FECHA: 13/12/2025 12:27:29

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBA80101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	<p>81101500-SERVICIOS ESTIMACION 02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADRAGUATO, SINALOA CONTRATO No.: MGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 4,143,889.01</p> <p>IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 2,415,896.79 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 845,563.88 TOTAL: \$ 1,570,332.91 (+) MAS 16% IVA: \$ 251,253.27 TOTAL: \$ 1,821,586.18 DEDUCCIONES 3% SVFYC: \$ 72,476.90</p> <p>SALDO LIQUIDO: \$ 1,749,109.28</p>	<p>1,570,332.91 002 - IVA - 251,253.27</p>	1,570,332.91

CANTIDAD CON LETRA: (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$1,570,332.91
IVA 16%	\$251,253.27
TOTAL	\$1,821,586.18

CFDI Көрсөткөчү:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

E04748AA-F244-46F7-927D-45E45497525F

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 13 2025 - 13:27:30

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NHhmzrGPWM85[zBBZkXz9UUHUFYr7D+8ZQJ9]DMe2T SXc24eXb0T7BgeTS+kiPafUe5VwZEBG6ZMYNF7zW5P1A/TfJAbHy+Z5fBgPjQlQtyDRaFBDgE2wly8Xn/DT/Lm0EMZipMWBaG3Zb0rCCTYPrCk89ID6+r+zlzG5ZY2PxKaQOIvZ+bFVU3CaGdcWJN/n/nu4YqyruXGEX9T8NoAbfJnQVdQVdcNoigAmZMpUyXfbit4mwUy1P5xVVFEXZnq/nwZzTfPwjcyxrbAnaCUl/wA/Ya

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11|1E04748AA-F244-4BF7-927D-45E45497525F|2025-12-13T13:27:30|MAS0810247C0|NhmzrGPNWM85zBBzKz29UJ
 HUY8XND+8Z0I9JMeZ12SXc4z6Z0T1Bgts+KpPalUE65vWZEB6G5VMYFNz7W5P1Af1JbHy+Z5f6PzQ1qItyH4R8D0gZc
 iU7eXNpD1/LTmoEMzPMWBEAg3z0RC7PjCtX89J6D+rhZ5G5ZV2zKqAO1Q7FVU3zG4QzHm7Nt4u4QzH9zQzH9zT1Nb
 AbfJzDwQVdcNblzAmZMpYobXfbitAmVUn1PsvkVEF7Zh07m0021P7WcycqzAltaCD7wAYbanSp4bg+Iqagf6A|NJS0C7
 3BrF+G3GseUVF0Z=0=10000100000709182898|

SEI LO DEL SAT

PTEx9amF6xhISLyWSd1odBPEqmiLVtB14QIXmu+YAWVYInquOdm1sJXv2DNwSRC+3i6qFkd+xsAxiXeoYJdSOXyOxa1t+dBcqXy
XN479bnkBiYw9G6wh7d6LS2KpocmoBnEzzureSjU72e5oLMOccpwbJjIcolczcFXL5d9AwB09/OmkHLA9H9EGdc35wnQmYep/bzs
OXyq4Hvm+EH2bGVEDVBgoHkw9prLxvJUNLFpWlhVEDNOAGAU02QxtSwrlqyXZuczhIPEKcHpeHAee4cB4InpPTWT02Rd14zrRi
ALL142c4Bm1q1AxbhG3m2G8uA9u3Gv5fcdD98uA=



Debo (emos) y pagare (mos) a la orden de **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA**. En esta ciudad de **LOS MOCHIS, SINALOA**, la cantidad **UN MILLON OCHO CIENTOS VEINTIMIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18100 M.N.M.** (\$1,821,586.18 M.N.). Valor de las mercancías arriba detalladas, que recibí (mos) de comercio exterior pagare (mos) mensualmente y a la orden por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos de no ser pagado domiciliarlo en su totalidad en el lugar, sujeto a su vencimiento me obligo pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns: xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="159" Fecha="2025-12-
13T12:27:29"
Sello="NHhmzrGP/WM8SIzBBZxKz9UUhUFYkr7D+8ZQI9jDMe2TSXc24eXb07zTBgetS+kiPaFUEe5VwfZEBq6ZMYNF7zWSPfA/TfJAbhY+Z5lFbgPjIqlytDRafBDgE2wIY/8Xn/DT/Lm0EMZ
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIIGjzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYKoZIHvNAQELBQAwgGVTUwMwYDVQDDCxBQYBERUwUgU0VSVDks1U8gREUgQURNSU5JUIR5QUJNT04gVFJ
SubTotal="1570332.91" Moneda="MXN" Total="1821586.18" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 02 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL
CONTRATO NETO: $ 4,143,889.91 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 2,415,896.79 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 845,563.88 TOTAL: $ 1,570,332.91 (+) MAS 16%
IVA: $ 251,253.27 TOTAL: $ 1,821,586.18 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 72,476.90 SALDO LIQUIDO: $ 1,749,109.28" ValorUnitario="1570332.91"
Importe="1570332.91" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1570332.91" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="251253.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Concepto>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="251253.27">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="251253.27" Base="1570332.91"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E04748AA-F244-46F7-927D-
45E45497525F" FechaTimbrado="2025-12-13T13:27:30" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="NHhmzrGP/WM8SIzBBZxKz9UUhUFYkr7D+8ZQI9jDMe2TSXc24eXb07zTBgetS+kiPaFUEe5VwfZEBq6ZMYNF7zWSPfA/TfJAbhY+Z5lFbgPjIqlytDRafBDgE2wIY/8Xn/DT/
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="PTEX9amF6xhlSLyWsd1odBPEqmIZVTib4QlXmu+YAWV1NquOdma1sJxv2DNwSRC+3i6cjFkd+xsAvIXe0YjldS0yOxaIt+dBogXyXN479bnkjbVw9g6wh7d6LS2KpocmoBnEzZu
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 30-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACIÓN No: 02 (NORMAL)
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.
TELÉFONO: 0 CEL: 6681861376
R.F.C. SCO-230519-155

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 02-nov-25

AL 30-nov-25

FECHA DE CONTRATO:

19-sep-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 02-oct-25

TERMINACIÓN: 30-nov-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$3,572,318.11

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$4,143,889.01

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$4,143,889.01

BUENO POR:

\$ 1,749,109.28

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 1,749,109.28 (SON UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 28/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 (NORMAL)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 845,563.88

MAS I.V.A.:

\$ 135,290.22

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 980,854.10

3 % SVIFYC:

\$ 72,476.90

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 1,053,331.00

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 2,415,896.79

MAS I.V.A 16 %

\$ 386,543.49

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 2,802,440.28

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 1,053,331.00

SALDO A PAGAR:

\$ 1,749,109.28

ELABORO

C. ANA MARCELA MADRADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		Estimacion:		
			Fecha: 30 de noviembre de 2025		02 (NORMAL)		
Periodo de la estimacion: 02/11/2025 al 30/11/2025			Localidad:		No. De contrato:		
Periodo de Ejecución: 02/10/2025 al 30/11/2025			BADIRAGUATO		MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025		
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 4,143,889.01		\$ 3,572,318.11		\$ 1,450,361.15		\$ 1,250,311.34	68%
						% Avance Total	94%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 2,415,896.79	ESTA ESTIMACION
\$ 980,854.10	16 % I.V.A (+) \$ 386,543.49	\$ 2,802,440.28
	Sub- Total A (=) \$ 2,802,440.28	
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 845,563.88	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 135,290.22	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 380,303.19	Total (=) \$ 980,854.10	\$ 1,086,580.55
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 1,570,332.91	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,361,157.29	16 % I.V.A (+) \$ 251,253.27	\$ 3,889,020.83
	Total (=) \$ 1,821,586.18	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 72,476.90	CONTRATADO
\$ 1,450,361.15	Total Deducciones (=) \$ 1,053,331.00	\$ 4,143,889.01
	Importe T O T A L \$ 1,749,109.28	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 1,749,109.28	SALDO
\$89,203.86	Son: (SON UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS 28/100 M.N.)	\$ 254,868.18

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA

30/11/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11				
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15				
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01				
OBRA		IMPORTE			
1	PRELIMINARES	\$	202,066.54		
102	ESTRUCTURA	\$	1,992,089.66		
1003	INSTALACIONES ESPECIALES	\$	199,764.79		
105	TRABAJOS FINALES	\$	21,975.80		
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$	2,415,896.79		
SUB TOTAL=		\$	2,415,896.79		
I.V.A AL 16 %		\$	386,543.49		
TOTAL =		\$	2,802,440.28		

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 1 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,276.24	\$ 22.19	\$ 50,509.77	2,119.00	1,743.00	0.00	376.00	\$ 8,343.44
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,251.93	\$ 118.82	\$ 148,754.32	1,165.45	958.65	0.00	206.80	\$ 24,571.98
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	2,276.24	\$ 36.90	\$ 83,993.26	2,119.00	1,743.00	0.00	376.00	\$ 13,874.40
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	2,276.24	\$ 168.66	\$ 383,910.64	2,119.00	1,743.00	0.00	376.00	\$ 63,416.16
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	2,276.24	\$ 193.09	\$ 439,519.18	2,119.00	1,743.00	0.00	376.00	\$ 72,601.84
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,276.24	\$ 51.22	\$ 116,589.01	2,119.00	1,743.00	0.00	376.00	\$ 19,258.72
TOTAL DE PRELIMINARES:										\$ 202,066.54
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	351.57	\$ 741.54	\$ 260,703.22	350.00	0.00	0.00	350.00	\$ 259,539.00

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 2 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	204.31	\$ 606.87	\$ 123,989.61	204.00	0.00	0.00	204.00	\$ 123,801.48
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,957.25	\$ 848.28	\$ 1,660,296.03	1,807.00	0.00	0.00	1,807.00	\$ 1,532,841.96
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	981.65	\$ 20.51	\$ 20,133.64	604.65	0.00	0.00	604.65	\$ 12,401.37
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	797.22	\$ 25.21	\$ 20,097.92	1,229.05	0.00	0.00	1,229.05	\$ 30,984.35
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	265.74	\$ 77.28	\$ 20,536.39	180.70	0.00	0.00	180.70	\$ 13,964.50
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	351.57	\$ 53.02	\$ 18,640.24	350.00	0.00	0.00	350.00	\$ 18,557.00
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 1,992,089.66
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	198.68	\$ 63.35	\$ 12,586.38	198.00	0.00	0.00	198.00	\$ 12,543.30
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	219.68	\$ 86.46	\$ 18,993.53	201.50	0.00	0.00	201.50	\$ 17,421.69
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 983.14	\$ 983.14	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 983.14

ELABORO

C. ANA MARCELA GUADALUPE
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 3 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	\$ 22,381.95	\$ 156,673.65	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 156,673.65
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$ 1,272.65	\$ 8,908.55	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 8,908.55
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,234.46	\$ 3,234.46	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,234.46
TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:										\$ 199,764.79
4	TRABAJOS FINALES									
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 4,600.00
GP101	LIMPIEZA DE OBRA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,276.24	\$ 8.20	\$ 18,665.17	2,119.00	0.00	0.00	2,119.00	\$ 17,375.80
TOTAL DE TRABAJOS FINALES:										\$ 21,975.80

TOTAL ESTIMACION	\$ 2,415,896.79
I.V.A.	\$ 386,543.49
TOTAL	\$ 2,802,440.28

ELABORO

C. ANAMARÍA ABELADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 1 de 9

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	1,743.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	376.00	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	260.00	8.15	0.55		1,165.45		
							TOTAL	1,165.45	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	958.65	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	206.80	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	1,743.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	376.00	

ELABORO


REVISO

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 2 de 9

02 (NORMAL)

GENERADORES ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		376.00	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		376.00	

ELABORO


REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 3 de 9

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		376.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 4 de 9

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
2	ESTRUCTURA						PARCIAL	TOTAL	
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	175.00			1.00	175.00		LADO DERECHO
			175.00			1.00	TOTAL	350.00	LADO IZQUIERDO
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	102.00			1.00	102.00		LADO DERECHO
			102.00			1.00	TOTAL	204.00	LADO IZQUIERDO
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	260.00	6.95			1,807.00		
							TOTAL	1,807.00	


ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 5 de 9

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	LONG TRAMO	@	LONG JUNTA	NO. PIEZAS	SUBTOTAL ML		
			260.00	3.00	6.95	87.00	604.65		
							TOTAL	604.65	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	260.00			1.00	260.00		LADO DERECHO
			260.00			1.00	260.00		LADO IZQUIERDO
			8.15			87.00	709.05		TRANSVERSALES
							TOTAL	1,229.05	
						EN ESTA ESTIMACIÓN	797.22		
						ADICIONAL	431.83		
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	NO. PIEZAS	LONG					
			26.00	6.95			180.70		
							TOTAL	180.70	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESÚS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 6 de 9

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	175.00			1.00	175.00		LADO DERECHO
			175.00			1.00	TOTAL	350.00	LADO IZQUIERDO
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00				25.00		L1-L2
			33.00				33.00		L2-L3
			30.00				30.00		L3-L4
			28.00				28.00		L4-L5
			45.00				45.00		L5-L6
			37.00				37.00		L6-L7
							TOTAL	198.00	

ELABORO


REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 7 de 9

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	25.00				25.00		L1-L2
			33.00				33.00		L2-L3
			30.00				30.00		L3-L4
			28.00				28.00		L4-L5
			45.00				45.00		L5-L6
			37.00				37.00		L6-L7
			0.50			7.00	3.50		
							TOTAL	201.50	
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONTE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 8 de 9

GENERADORES ESTIMACION:

02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA				7.00	7.00		
							TOTAL	7.00	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				7.00	7.00		
							TOTAL	7.00	

ELABORO


REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 9 de 9

GENERADORES ESTIMACION: 02 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
4	TRABAJOS FINALES								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA				1.00	1.00		
							TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	260.00	8.15			2,119.00		
							TOTAL	2,119.00	

ELABORO

ING. JESUS YANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.


OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.

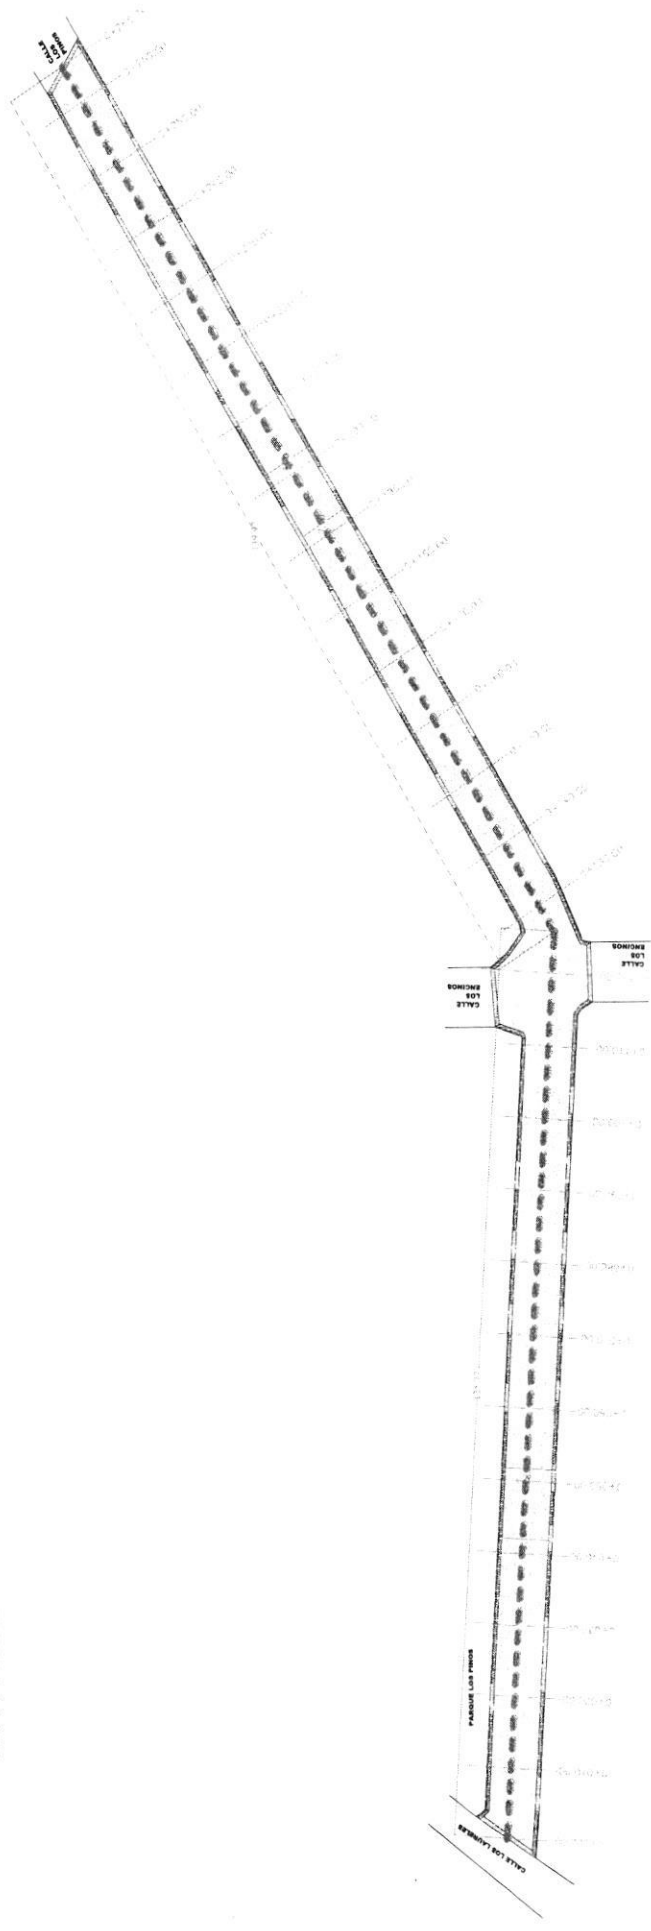

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 6


SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

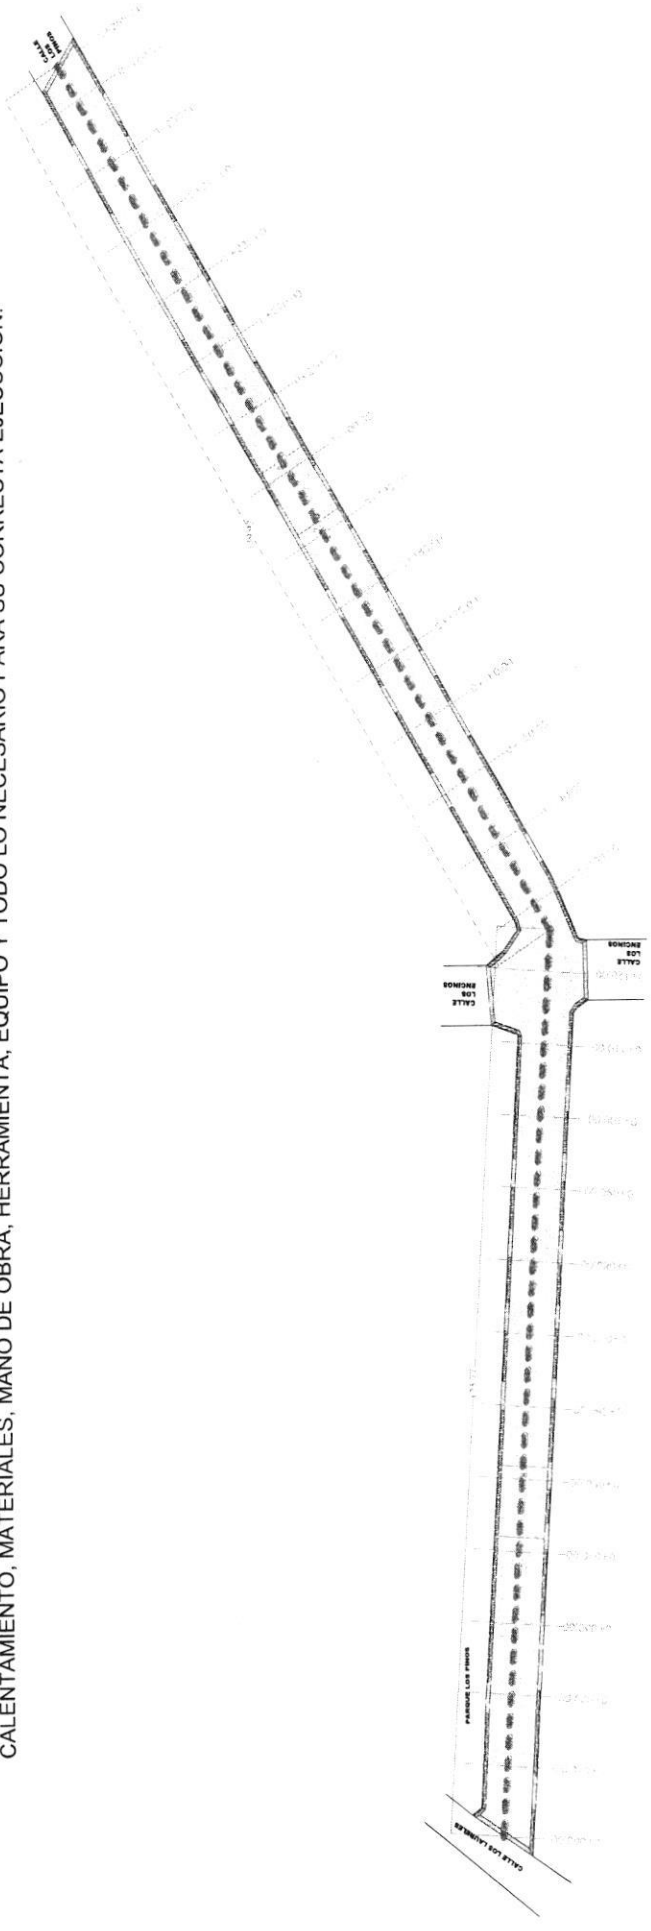

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS


CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO. EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

3 de 6

ESTIMACION:	02 (NORMAL)
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

4 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

GP13


CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

GP15

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GP11

PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

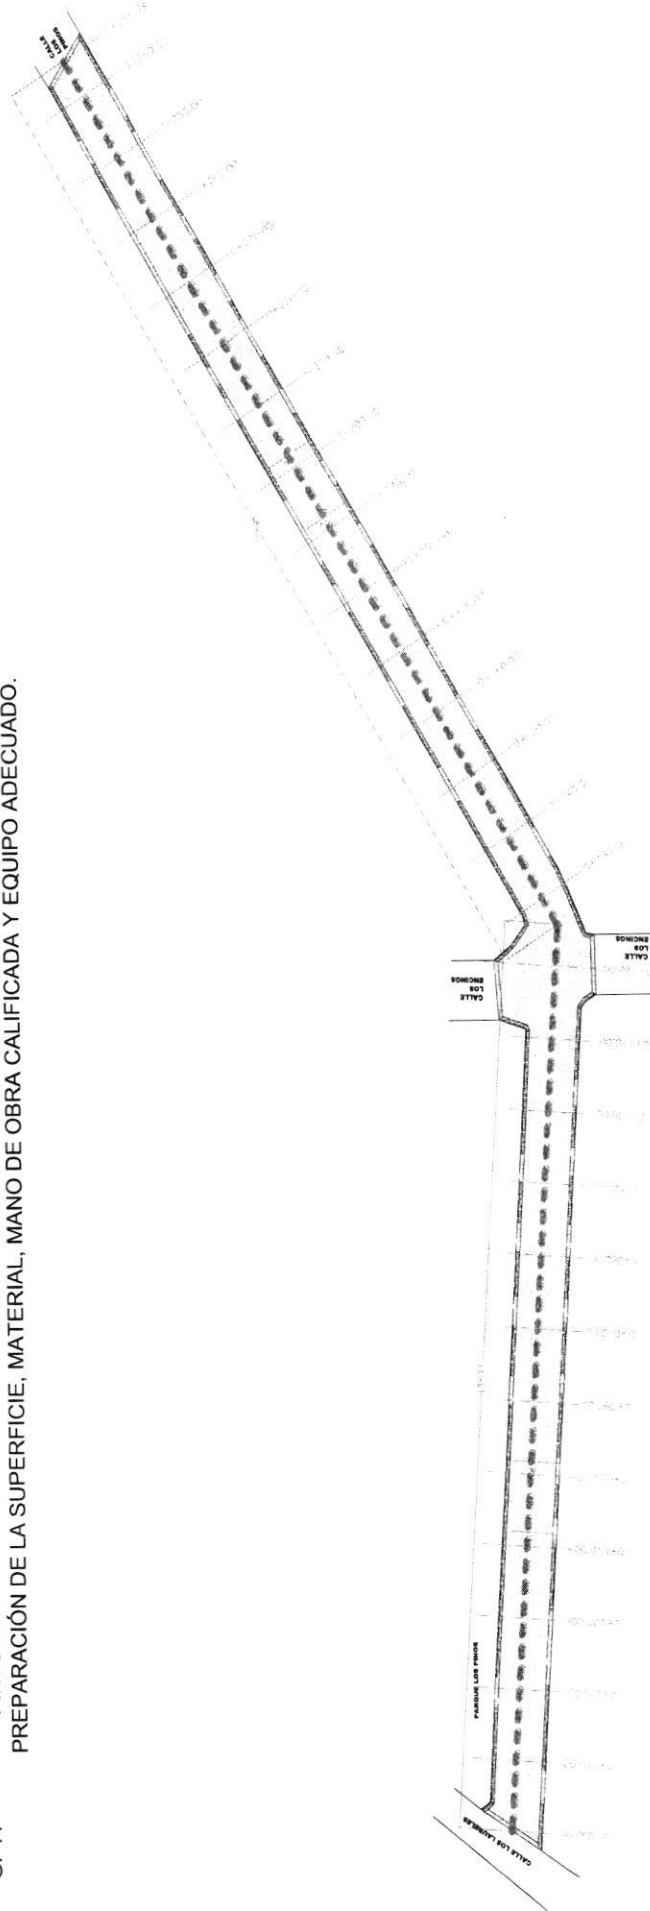

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

5 de 6

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

3 INSTALACIONES ESPECIALES

- GP20 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- GP22 SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP23 LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
- GP24 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP30 INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

6 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)


4 TRABAJOS FINALES

GBR671

LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP101

LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRAFICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

OBRA:








SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

- TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM², INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 2

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.





OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 02 (NORMAL)

ESTRUCTURA

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP109 LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP133 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.
- GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
- GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP11 PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

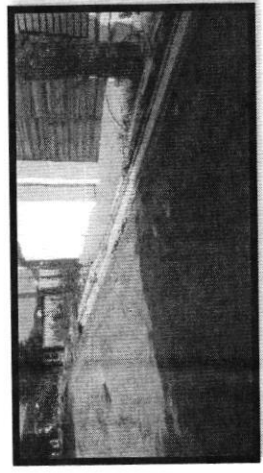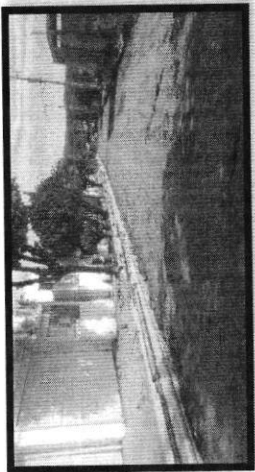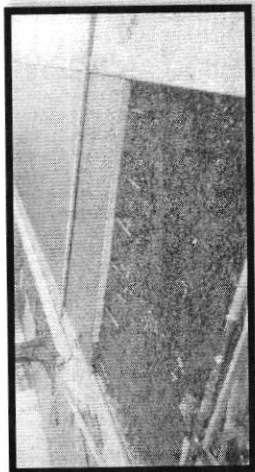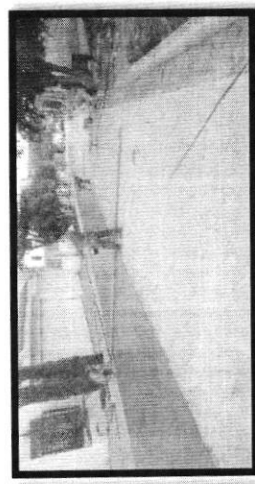

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta24/12/2025 4:51:19 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario	
Descripción: EST 02 NORM LP 008	Importe de la operación: 1,749,109.28 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836	Cuenta de depósito: 030743900036659975
Divisa de la cuenta: MXP	Divisa de la cuenta: MXP
Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	Titular de la cuenta: SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV
Nombre banco destino: BAJIO	
Fecha de creación: 24/12/2025	Fecha de aplicación: 24/12/2025
Concepto de pago: EST 02 NORM LP 008	Referencia numérica:
Instrumento de seguridad: ASD 6551749382	Hora de captura en el canal: 16:51:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000716668	Clave de rastreo: 002601002512240000716668
Folio de firma: 0050525274	Folio único: I401202512241651040050525280

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	24/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/12/2025
