



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/799/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACIÓN 03 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 20 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 03 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$116,490.44 (CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA
- No. DE FACTURA: #157A, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
BADIRAGUATO, SINALOA

ATENTAMENTE



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**

TESORERÍA

13:00hrs
20 DIC 2025

Martha Rastel

RECIBIDO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SCD230519156
NORTE 2 No. 2167 No. Int S/N,
Los Mochis C.P. 81271 Ahome,
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 162

FECHA: 20/12/2025 11:43:57

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 01 - Construcciones.		
CIUDAD:	Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 03 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA, CONTRATO No. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 160,898.40 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 56,314.44 TOTAL: \$ 104,583.96 (+) MAS 16% IVA: \$ 16,733.43 TOTAL: \$ 121,317.39 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 4,826.95 SALDO LIQUIDO: \$ 116,490.44	104,583.96 002 - IVA - 16,733.43	104,583.96

CANTIDAD CON LETRA: (CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
DIECISIETE PESOS 39/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$104,583.96
IVA 16%	\$16,733.43
TOTAL	\$121,317.39

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL

446CC9A5-A63C-4B0E-B765-99425BD3157A

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 20 2025 - 12:43:59

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ARtFfgejaGwGcMp4QZtpkWlnuQCwDmJLgALwHR4MEGYIO8XQG58llkGegHzsOXqlboJDGFEGslh0Gr7S2PLjsBORYj9suyWp8L
ogB4ReU7s1hIIZ4NmXXiUOCx4S1YP2ZzDtiQI1vVq4nuD8Phpzfbllkjp8q7SqC05C8Exm3X73Dk42PaUbjmDtvYxkEr9/QIZIN
7wa3INTdRixrK0O5/Xa2TC.FPLwF98y34GiSndYwdasEcMn6GIOfC1H3xeeGK/OE/9u6j8j6pbodMfhfEp3kBg9LURga8OV7k
25rhAO3e9+1LtpgRHL516kCCW86DAsp3Ecqz7enxvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|446CC9A5-A63C-4B0E-B765-99425BD3157A|2025-12-20T12:43:59|MAS0810247C0|ARtFfgejaGwGcMp4QZtpkWI
nuQCwDmJLgALwHR4MEGYIO8XQG58llkGegHzsOXqlboJDGFEGslh0Gr7S2PLjsBORYj9suyWp8LLogB4ReU7s1hIIZ4NmXXiUOCx
4S1YP2ZzDtiQI1vVq4nuD8Phpzfbllkjp8q7SqC05C8Exm3X73Dk42PaUbjmDtvYxkEr9/QIZIN7wa3INTdRixrK0O5/Xa2TC.F
PLwF98y34GiSndYwdasEcMn6GIOfC1H3xeeGK/OE/9u6j8j6pbodMfhfEp3kBg9LURga8OV7k25rhAO3e9+1LtpgRHL516kCC
W86DAsp3Ecqz7enxvg==|00001000000709182898||

SELLO DEL SAT

P/XyrnZ+e5+VUErC7zh+UOF9DYKZV2PbDHCSGwy4A0q6CnFYA6OSHlu6W9QJLeIDoQgDIQ0a2rECP1TUorE4kl+rG2+NZrsD
t1TROyvxQW6rDbG8B8WYDQKPr3Z0WnUXotR09U0EUpwnB8Hjxe3gzSnnvCHFWt9cavE9+p1dCBhWPAkaOYAjgzXEpC10Vt
UDV0V+k6PPowALfioZBwLLMdqtNz1s+JEJLnDpaHblyeC05bmCvFknglvxAs090m/J4o0r1cMnhaUg72fA9noSNZK0Vg5m2vF6R
Z/dONbg4YKhTruKgs1peykOp4TAPxPM2moa/uIQWg==

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000709182898

SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000701105484



Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA, En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 39/100 M.N. (121,317.39 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5 % mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="162" Fecha="2025-12-
20T11:43:57"
Sello="ARTffqejaGwLgCmp4QZtpkWiInuQCiwDmjLgALwHR4MEGY108XQG581lkGeqHZsOXq1boJDGFQsIh0Gr7S2PLlsBORYj9suyWp8LogB4ReU7s1hI1Z4NmXXiUOCx4S1YP22zDtiQ11vVqi4nuC
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDEwMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwWYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVkIDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="104583.96" Moneda="MXN" Total="121317.39" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 03 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO
NETO: $ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 160,898.40 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 56,314.44 TOTAL: $ 104,583.96 (+) MAS 16% IVA: $ 16,733.43
TOTAL: $ 121,317.39 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 4,826.95 SALDO LIQUIDO: $ 116,490.44" ValorUnitario="104583.96" Importe="104583.96" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="104583.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16733.43"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16733.43">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16733.43" Base="104583.96"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="446CC9A5-A63C-4B0E-B765-99425BD3157A"
FechaTimbrado="2025-12-20T12:43:59" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="ARTffqejaGwLgCmp4QZtpkWiInuQCiwDmjLgALwHR4MEGY108XQG581lkGeqHZsOXq1boJDGFQsIh0Gr7S2PLlsBORYj9suyWp8LogB4ReU7s1hI1Z4NmXXiUOCx4S1YP22zDtiQ11v
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="P/XyrxZ+e5+VUErC7zh+UOF9DYXZV2PbDHCSGwy4A0q16C/eIYA60ShIu6W90JLefDoQgDIQ0o2jrECP1UorE4tkI+rG2+NZrsDt1TR0ytxQw6rDbGbS8WXYDQKPk3Z0WnUXohRd9U
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 30-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACIÓN No: 03 (NORMAL)

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

TELÉFONO: 0 CEL: 6681861376

R.F.C. SCO-230519-155

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 02-nov-25

AL 30-nov-25

FECHA DE CONTRATO:

29-sep-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. BADIRAGUATO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

INICIO: 02-oct-25

TERMINACIÓN: 30-nov-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$3,572,318.11

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$4,143,889.01

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$4,143,889.01

BUENO POR:

\$ 116,490.44

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

\$ 116,490.44 (SON CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 03 (NORMAL)

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%

\$ 56,314.44

MAS I.V.A.:

\$ 9,010.31

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 65,324.75

3 % SVIFYC:

\$ 4,826.95

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 70,151.70

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 160,898.40

MAS I.V.A 16 %

\$ 25,743.74

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 186,642.14

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 70,151.70

SALDO A PAGAR:

\$ 116,490.44

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimacion: 03 (NORMAL)	
Fecha: 30 de noviembre de 2025		Localidad: BADIRAGUATO		No. De contrato: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Periodo de la estimacion: 02/11/2025 al 30/11/2025	Periodo de Ejecución: 02/10/2025 al 30/11/2025			
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 4,143,889.01	\$ 3,572,318.11	\$ 1,450,361.15	\$ 1,250,311.34	5%
				% Avance Total
				98%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 160,898.40	ESTA ESTIMACION
\$ 65,324.75	16 % I.V.A (+) \$ 25,743.74	\$ 186,642.14
	Sub- Total A (=) \$ 186,642.14	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$ 56,314.44	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,361,157.29	16 % I.V.A (+) \$ 9,010.31	\$ 3,889,020.83
	Total (=) \$ 65,324.75	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$ 104,583.96	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,426,482.04	16 % I.V.A (+) \$ 16,733.43	\$ 4,075,662.97
	Total (=) \$ 121,317.39	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$ 4,826.95	CONTRATADO
\$ 1,450,361.15	Total Deducciones (=) \$ 70,151.70	\$ 4,143,889.01
	Importe T O T A L \$ 116,490.44	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR \$ 116,490.44	SALDO
\$23,879.11	Son: (SON CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N.)	\$ 68,226.04

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME R.F.C. SCO-230519-155				DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			
--	--	--	--	---	--	--	--

ESTADO DE CUENTA

				LOCALIDAD:	BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.								
FECHA INICIO CONTRATO:	02-oct-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	30-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025		FECHA CONTRATO:	29-sep-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$3,572,318.11		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,450,361.15		PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO		\$4,143,889.01		IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$4,143,889.01	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR	
01 (NORMAL)	02-oct-25	02-nov-25	\$ 1,086,580.55	\$ 936,707.37	\$ 28,101.22	\$ 380,303.19	\$ 408,404.41	\$ 678,176.14	
02 (NORMAL)	02-nov-25	30-nov-25	\$ 2,802,440.28	\$ 2,415,896.79	\$ 72,476.90	\$ 980,854.10	\$ 1,053,331.00	\$ 1,749,109.28	
03 (NORMAL)	02-nov-25	30-nov-25	\$ 186,642.14	\$ 160,898.40	\$ 4,826.95	\$ 65,324.75	\$ 70,151.70	\$ 116,490.44	
TOTALES:			\$ 4,075,662.97	\$ 3,513,502.56	\$ 105,405.07	\$ 1,426,482.04	\$ 1,531,887.11	\$ 2,543,775.86	
SALDO DEL CONTRATO:			\$68,226.04	SALDO POR AMORTIZAR:		\$23,879.11			

ELABORO
C. ANA MARCELA L. VILLALBA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ
ING. JOSÉ B. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA

30/11/2025

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

R.F.C.

SCO-230519-155

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$3,572,318.11

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$4,143,889.01

OBRA

IMPORTE

1	PRELIMINARES	\$	80,535.88
2	ESTRUCTURA	\$	77,753.84
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$	1,614.92
4	TRABAJOS FINALES	\$	993.76

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 160,898.40

SUB TOTAL= \$ 160,898.40

I.V.A AL 16 % \$ 25,743.74

TOTAL = \$ 186,642.14

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 1 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,276.24	\$ 22.19	\$ 50,509.77	2,240.19	2,119.00	0.00	121.19	\$ 2,689.21
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,251.93	\$ 118.82	\$ 148,754.32	1,251.93	1,165.45	271.40	86.48	\$ 10,275.55
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	2,276.24	\$ 36.90	\$ 83,993.26	2,240.19	2,119.00	0.00	121.19	\$ 4,471.91
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	2,276.24	\$ 168.66	\$ 383,910.64	2,240.19	2,119.00	* 0.00	121.19	\$ 20,439.91
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	2,276.24	\$ 193.09	\$ 439,519.18	2,240.19	2,119.00	0.00	121.19	\$ 23,400.58
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,276.24	\$ 51.22	\$ 116,589.01	2,495.00	2,119.00	0.00	376.00	\$ 19,258.72
TOTAL DE PRELIMINARES:									\$	80,535.88
2	ESTRUCTURA									
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	351.57	\$ 741.54	\$ 260,703.22	316.32	350.00	0.00	-33.68	-\$ 24,975.07

ELABORO

C. ANA MARCELA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 2 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	204.31	\$ 606.87	\$ 123,989.61	204.31	204.00	22.99	0.31	\$ 188.13
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,957.25	\$ 848.28	\$ 1,660,296.03	1,921.30	1,807.00	0.00	114.30	\$ 96,958.40
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	981.65	\$ 20.51	\$ 20,133.64	643.47	604.65	0.00	38.82	\$ 796.20
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	797.22	\$ 25.21	\$ 20,097.92	797.22	797.22	484.53	0.00	\$ -
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	265.74	\$ 77.28	\$ 20,536.39	265.74	180.70	0.00	85.04	\$ 6,571.89
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	351.57	\$ 53.02	\$ 18,640.24	316.32	350.00	0.00	-33.68	\$ 1,785.71
TOTAL DE ESTRUCTURA:										\$ 77,753.84
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	198.68	\$ 63.35	\$ 12,586.38	198.68	198.00	0.00	0.68	\$ 43.08
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	219.68	\$ 86.46	\$ 18,993.53	219.68	201.50	0.00	18.18	\$ 1,571.84

ELABORO

C. ANA MARCELA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ B. GONZÁLEZ LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 3 de 3

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	03 (NORMAL)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$ 1,272.65	\$ 8,908.55	7.00	7.00	1.00	0.00	\$ -
TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:										\$ 1,614.92
4	TRABAJOS FINALES									
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,276.24	\$ 8.20	\$ 18,665.17	2,240.19	2,119.00	0.00	121.19	\$ 993.76
TOTAL DE TRABAJOS FINALES:										\$ 993.76

TOTAL ESTIMACION	\$ 160,898.40
I.V.A.	\$ 25,743.74
TOTAL	\$ 186,642.14

ELABORO

C. ANA MARCELA VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 1 de 8

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	265.74	8.43			2,240.19		
							TOTAL	2,240.19	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	1,743.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	376.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	121.19	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	265.74	8.43	0.68		1,523.33		
							TOTAL	1,523.33	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	958.65	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	206.80	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	86.48	
							ADICIONAL	271.40	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	265.74	8.43			2,240.19		

ELABORO


REVISO

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 2 de 8

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
							TOTAL	2,240.19	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		376.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		121.19	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	265.74	8.43			2,240.19		
							TOTAL	2,240.19	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		376.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		121.19	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	265.74	8.43			2,240.19		

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 3 de 8

GENERADORES ESTIMACION: 03 (NORMAL)									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	TOTAL	2,240.19	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		376.00	
								121.19	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	265.74	8.43			2,240.19		
							TOTAL	2,240.19	
						EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)		1,743.00	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		376.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		121.19	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	316.32			1.00	316.32		
							TOTAL	316.32	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		350.00	

ELABORO
ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO
ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 4 de 8

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		-33.68	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	227.30			1.00	227.30		
						TOTAL	227.30		
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	204.00		
						EN ESTA ESTIMACIÓN	0.31		
						ADICIONAL	22.99		
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 GMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	265.74	7.23			1,921.30		
						TOTAL	1,921.30		
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	1,807.00		
						EN ESTA ESTIMACIÓN	114.30		
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	LONG TRAMO	@	LONG JUNTA	NO. PIEZAS	SUBTOTAL ML		
			265.74	3.00	7.23	89.00	643.47		

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS VALENZUELA MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 5 de 8

GENERADORES ESTIMACION: 03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	TOTAL	643.47	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		604.65	
								38.82	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	265.74			1.00	265.74		LADO DERECHO
			265.74			1.00	265.74		LADO IZQUIERDO
			8.43			89.00	750.27		TRANSVERSALES
							TOTAL	1,281.75	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		797.22	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		0.00	
						ADICIONAL		484.53	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	265.74				265.74		
							TOTAL	265.74	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		180.70	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		85.04	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 6 de 8

GENERADORES ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	316.32			1.00	316.32		LADO DERECHO
							TOTAL	316.32	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	350.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	-33.68	
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	25.00				25.00		L1-L2
			33.00				33.00		L2-L3
			30.00				30.00		L3-L4
			28.00				28.00		L4-L5
			45.00				45.00		L5-L6
			37.68				37.68		L6-L7
							TOTAL	198.68	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	198.00	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	0.68	

ELABORO


ING. JESUS JOVANY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 7 de 8

GENERADORES ESTIMACION: 03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	25.00				25.00		L1-L2
			33.00				33.00		L2-L3
			30.00				30.00		L3-L4
			28.00				28.00		L4-L5
			45.00				45.00		L5-L6
			37.68				37.68		L6-L7
			0.50			7.00	3.50		
			17.50				17.50		
							TOTAL	219.68	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	201.50	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	18.18	
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				8.00	8.00		
							TOTAL	8.00	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	7.00	

ELABORO


REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 8 de 8

GENERADORES ESTIMACION: 03 (NORMAL)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		0.00	
						ADICIONAL		1.00	
4	TRABAJOS FINALES								
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	265.74	8.43			2,240.19		
							TOTAL	2,240.19	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		2,119.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		121.19	

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE. COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:


CONTRATISTA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

PRELIMINARES

1

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.

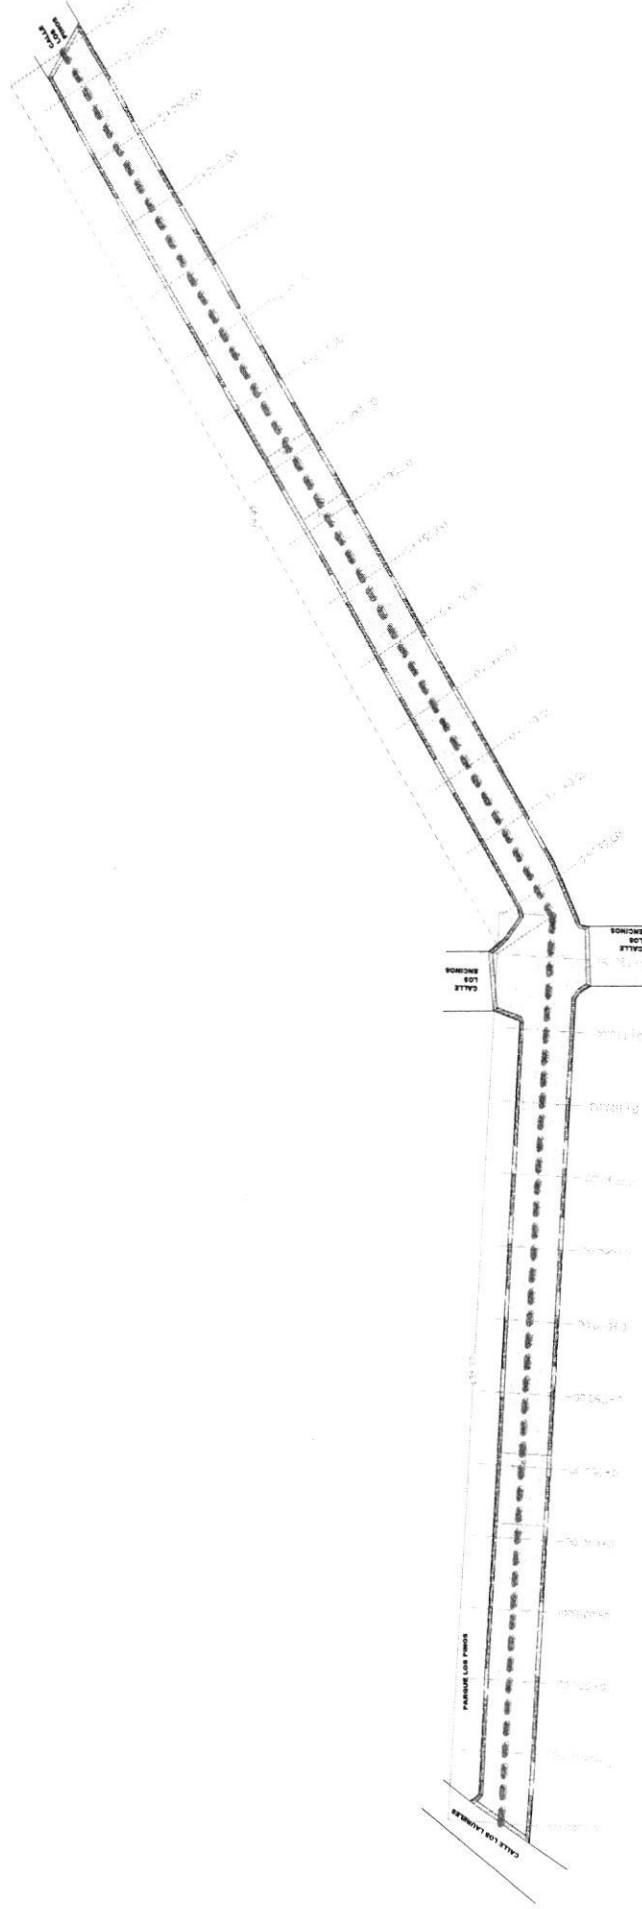

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

GP255


SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.

GP25

MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP06

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

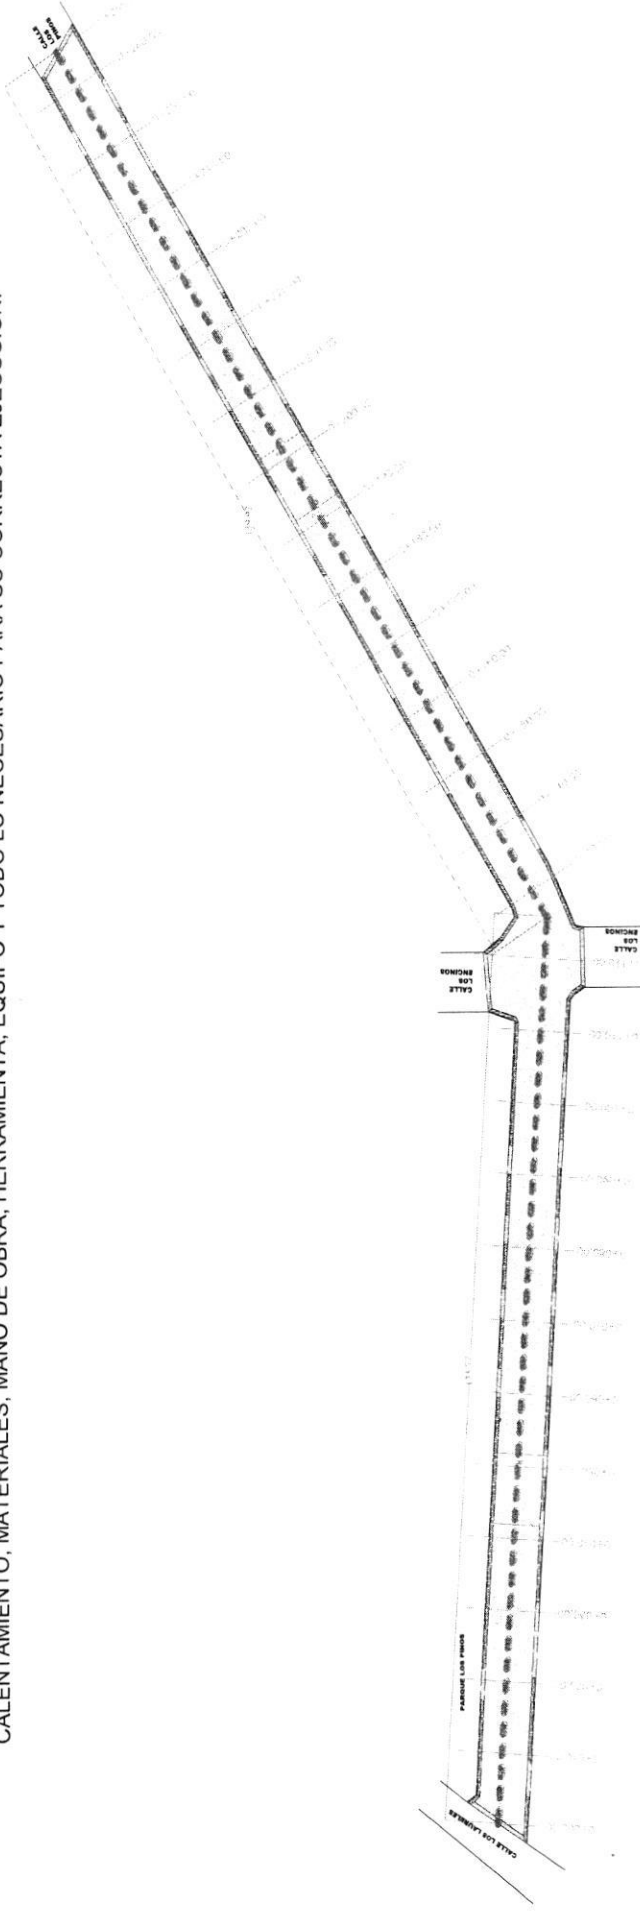

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

3 de 6


CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA**
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP109 LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP133 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.



ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

4 de 6


SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

- GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
- GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP11 PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

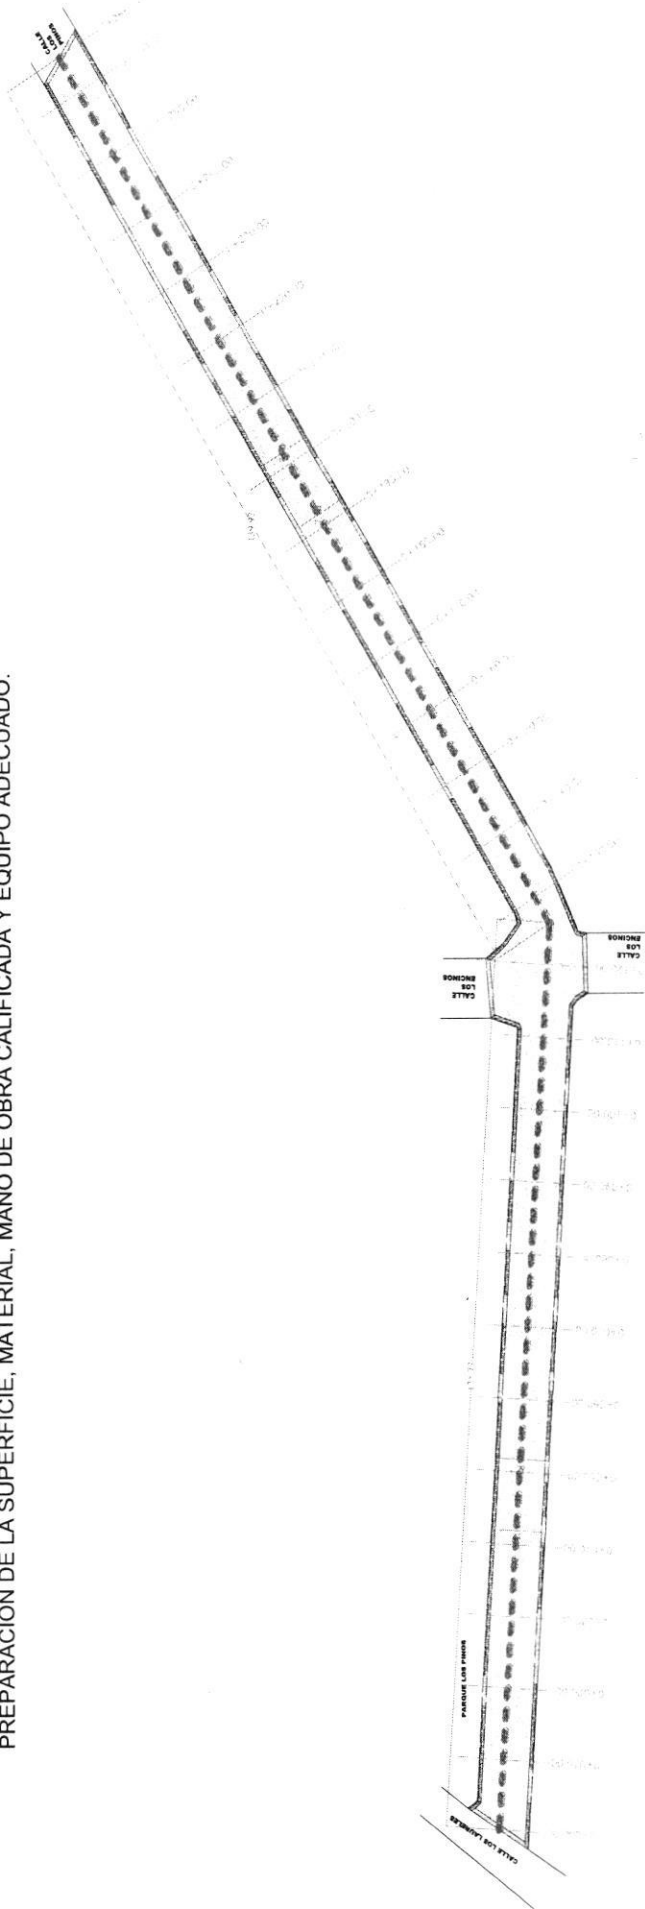

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

5 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

3 INSTALACIONES ESPECIALES

GP20 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

GP21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

GP24 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE: COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

6 de 6

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE: COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.


ESTIMACION: 03 (NORMAL)

TRABAJOS FINALES

GP101 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

4

GP101

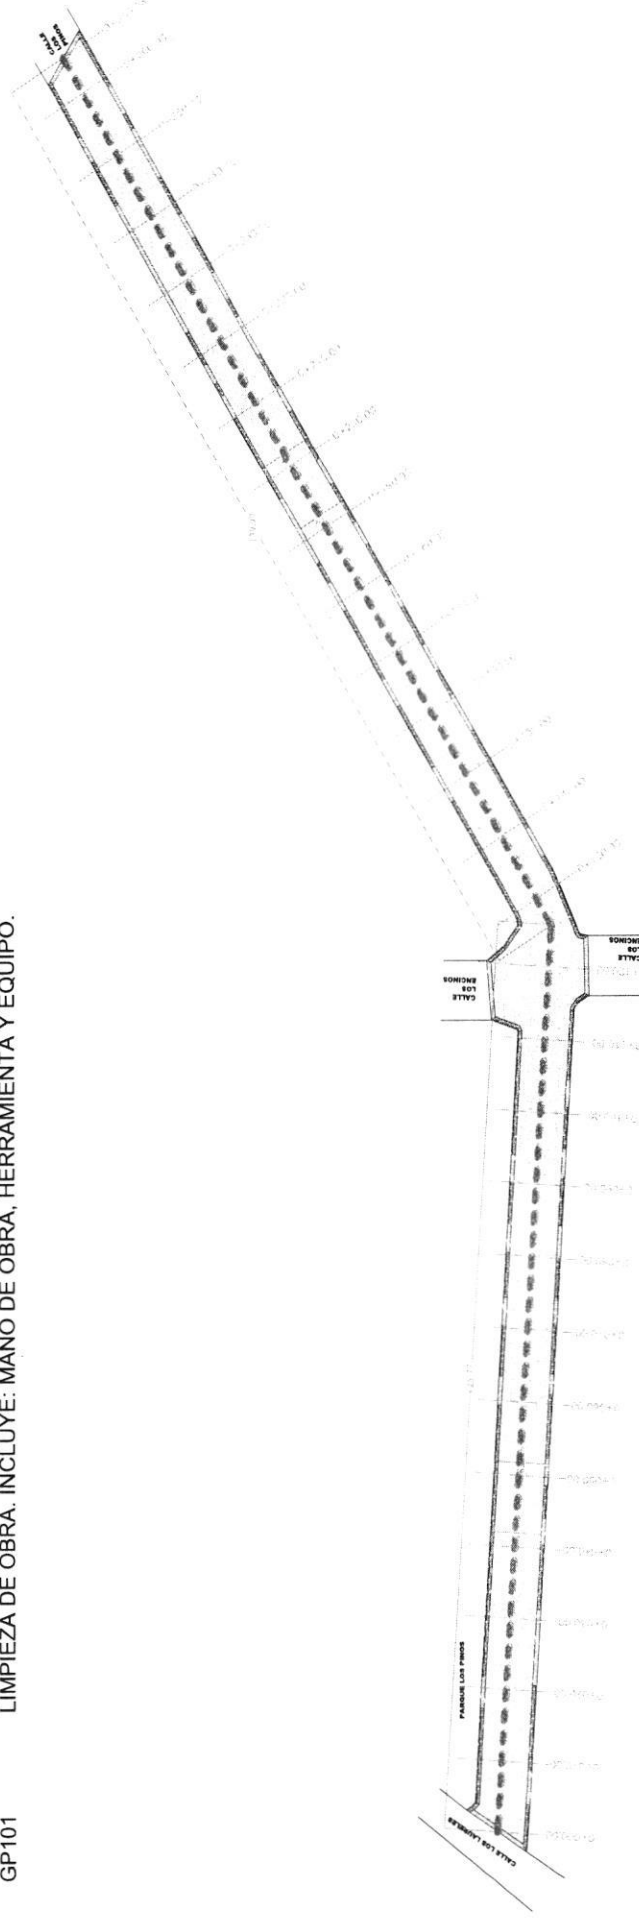

ELABORO

ING. JESUS MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: **SEIS-ONCE CONSTRUCTORA**
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 2

ESTIMACIÓN: 03 (NORMAL)

1 PRELIMINARES

- GP01 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP02 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.
- GP05 COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.
- GP255 SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
- GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP06 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LTM2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

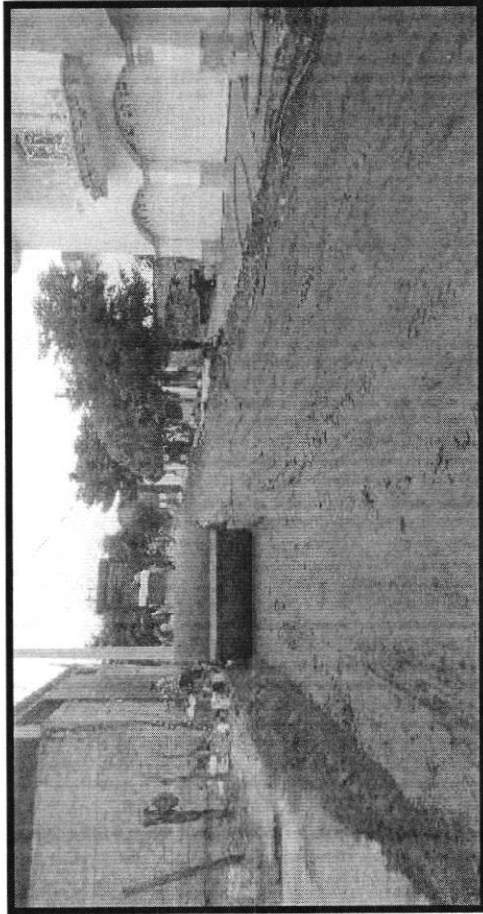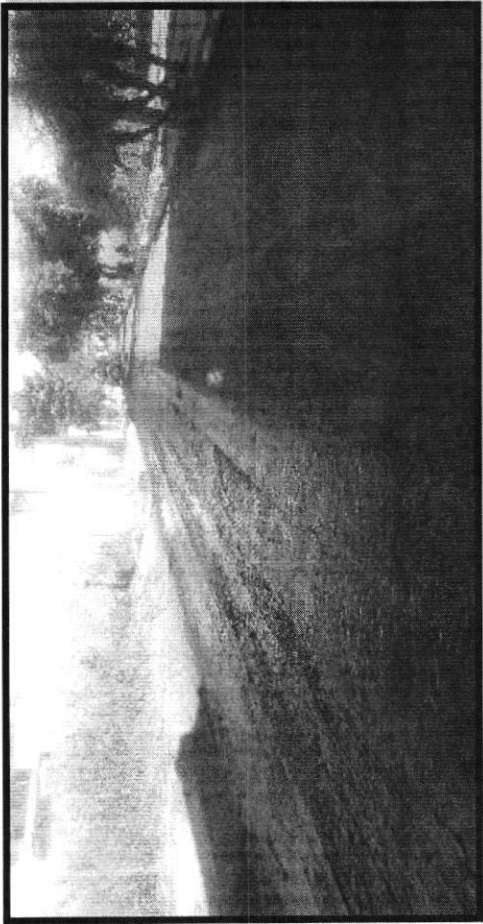

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

REPORTE FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 2





SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

CONTRATISTA:

ESTIMACION: 03 (NORMAL)

2 ESTRUCTURA

- GP08 GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.
- GP109 LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
- GP133 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.
- GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
- GP15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- GP11 PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.

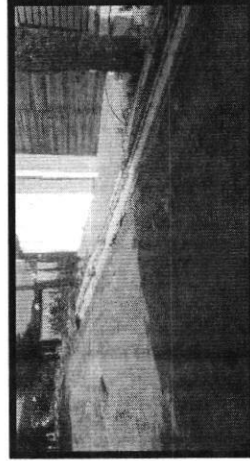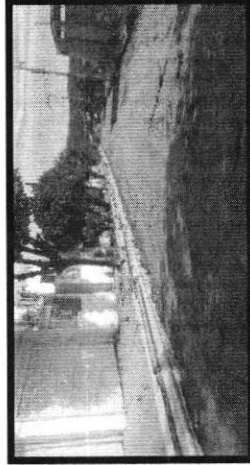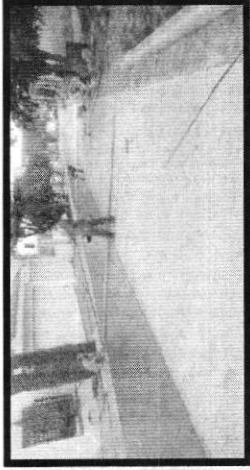

ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 03 NORM LP 008

Importe de la operación: 116,490.44 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 030743900036659975

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta: SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación: 26/12/2025

Fecha de aplicación: 26/12/2025

Concepto de pago: EST 03 NORM LP 008

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 13:17:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000929542

Clave de rastreo: 002601002512260000929542

Folio de firma: 0020707026

Folio único: I401202512261317530020707032

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
