



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/800/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 20 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$42,582.46 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
- R.F.C. SCO230519155
- DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS MOCHIS, SINALOA
- No. DE FACTURA: #1821, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C.C.P. ARCHIVO.

13:00 hrs
20 DIC 2025
Martha Castañeda
RECIBIDO

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SC0230519155
NORTE 2 No. 2167 No. Int S/N,
Los Mochis C.P. 81271 Ahome
Sinaloa México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 163

FECHA: 20/12/2025 11:47:25

CLIENTE:	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	R.F.C.:	MBA850101214
DOMICILIO:	Gabriel Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: I01 - Construcciones.		
CIUDAD:	, Badiraguato, Sinaloa, México C.P. 80500		
REGIMEN FISCAL:	803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CANTIDAD	Unidad Clave SAT	Clave sat Descripción	Valor Unitario Impuesto	Importe
1.00	SERVICIO E48	81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01 (ADICIONAL) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: \$ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$ 58,815.55 (-) MENOS AMORTIZACION: \$ 20,585.44 TOTAL: \$ 38,230.11 (+) MAS 16% IVA: \$6,116.82 TOTAL: \$ 44,346.93 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: \$ 1,764.47 SALDO LIQUIDO: \$ 42,582.46	38,230.11 002 - IVA - 6,116.82	38,230.11

CANTIDAD CON LETRA: (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.)

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	\$38,230.11
IVA 16%	\$6,116.82
TOTAL	\$44,346.93

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Lugar de Expedición: 81271 Moneda: MXN - Poso Mexicano

FOLIO FISCAL

BEE17EA8-4D27-4782-9786-3D7554D81B21

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Diciembre 20 2025 - 12:47:27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pLKvW+IFB73eN5dQRB4sH2V0apYUHT29w7ENuTgb1fLA+86xkjVczDrPGho1qDgl2IG85kr4Vca5VJxbFCH0B3ZJCk0eDOok+nNHuVYAKTW41vdXSkS3z4Z0NEiur6pe7AZVbU31ePfuwxwFstAO+uHbkj3GRYITUsqP3EQIWSa7OTBIXb7RSNkdWLMcOlyLfDRWjlvqAv8vqHSY/H7III10leNDQ6FMjvcEakz4KCKaOEI2s+4LVGdzEka1LS9tx+vDuqVjJDKeqRJHtQlVol2sFJ+0TaNeFDXA+qydzRsDg3qq4+s4Du4RyorSiFa+TFmmYUNBZN3Jxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEE17EA8-4D27-4782-9786-3D7554D81B21|2025-12-20T12:47:27|MAS0810247C0|pLKvW+IFB73eN5dQRB4sH2V0apYUHT29w7ENuTgb1fLA+86xkjVczDrPGho1qDgl2IG85kr4Vca5VJxbFCH0B3ZJCk0eDOok+nNHuVYAKTW41vdXSkS3z4Z0NEiur6pe7AZVbU31ePfuwxwFstAO+uHbkj3GRYITUsqP3EQIWSa7OTBIXb7RSNkdWLMcOlyLfDRWjlvqAv8vqHSY/H7III10leNDQ6FMjvcEakz4KCKaOEI2s+4LVGdzEka1LS9tx+vDuqVjJDKeqRJHtQlVol2sFJ+0TaNeFDXA+qydzRsDg3qq4+s4Du4RyorSiFa+TFmmYUNBZN3Jxg==|00001000000709182898||

SELLO DEL SAT

AEzUBOYhRzyfemPIGHGwDIZ9KIMMm/TbN93rJyb73HVyUbKAvjx+eJck4aMwmCORqddpA/QecQ1hHX2sZsH6z9nX0EeNheJkXD3h6ivECwANCWUGSWYd9N8GWpKmwNEmpI2EV2hszyVUhd8bwHLICqnYvsz7cuVTWYqcUGGQdAJgq+zZIZgevm8Jy7ON4DiVBf+mAv/wmjTrgUvA8NGPj9bC-8EB2rqTx8UOE8s8cG5hvwH08TdhcbPqo+o9kwcuBDDsy8rp1a1Df5Cf0p2knLCPYEGLCqAqKUYy/MXZdNhrT4oyByLIG9AlskueUbEbK991toG1UuMlnw==

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000709182898

SERIE DEL CERTIFICADO

00001000000701105484



Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de SEIS-ONCE CONSTRUCTORA. En esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, la cantidad CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. (44,346.93 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="163" Fecha="2025-12-
20T11:47:25"
Sello="pLKvW+IFB73eN5dQR84sHZV0apYUHT29w7ENuTgb1fLA+86xkjVczDrPGho1qDgI2IG85Ikr4Vca5VJxbrFCH0183ZJCKJ0eD0oK+nNHuVYAkTWI41vdXSks3z14ZoNEiur6pe7AZVbU31ePf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIGJzCCBA+gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDExMDU0ODQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSvk1DSU8gREUGQURNSUSU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
SubTotal="38230.11" Moneda="MXN" Total="44346.93" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 01 (ADICIONAL) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 MONTO DEL
CONTRATO NETO: $ 4,143,889.01 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 58,815.55 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 20,585.44 TOTAL: $ 38,230.11 (+) MAS 16% IVA:
$6,116.82 TOTAL: $ 44,346.93 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 1,764.47 SALDO LIQUIDO: $ 42,582.46" ValorUnitario="38230.11" Importe="38230.11"
ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="38230.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6116.82"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6116.82">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6116.82" Base="38230.11"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="BEE17EA8-4D27-4782-9786-3D7554D81821"
FechaTimbrado="2025-12-20T12:47:27" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="pLKvW+IFB73eN5dQR84sHZV0apYUHT29w7ENuTgb1fLA+86xkjVczDrPGho1qDgI2IG85Ikr4Vca5VJxbrFCH0183ZJCKJ0eD0oK+nNHuVYAkTWI41vdXSks3z14ZoNEiur6pe7AZV
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="AEzUB0YhRzyfemPtGHGWDI29KtMMm/TbN93rJyb73HVYUbKAvjix+eJck4aMwmCORqc1dpA/QecQ1hHX2sZsH6z9nX0EeNheJKXD3h6IvECwANCWUGSWYd9jN8GwPKmWwEmpi2EV2h
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Fecha: 30-nov-25

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.		PERIODO DE ESTIMACION:	
TÉLEFONO: 0	CEL: 6681861376	DEL	02-nov-25
R.F.C. SCO-230519-155		AL	30-nov-25
		FECHA DE CONTRATO: 29-sep-25	
DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO	LOCALIDAD: MUNICIPIO: BADIRAGUATO	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		INICIO:	02-oct-25
		TERMINACIÓN:	30-nov-25
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
CONTRATO No: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025			
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$3,572,318.11	\$4,143,889.01	\$1,450,361.15	\$4,143,889.01
			BUENO POR: \$ 42,582.46
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO: \$ 42,582.46 (SON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO			
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 20,585.44	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 58,815.55
MAS I.V.A.:	\$ 3,293.67	MAS I.V.A 16 %	\$ 9,410.49
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 23,879.11	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 68,226.04
3 % SVIFYC:	\$ 1,764.47	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 25,643.58
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 25,643.58		
		SALDO A PAGAR:	\$ 42,582.46

ELABORO

C. ANA MONTEALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		MUNICIPIO DE BADIRAGUATO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	Estimacion: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO	
Fecha: 30 de noviembre de 2025		Localidad: BADIRAGUATO		No. De contrato: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Periodo de la estimacion: 02/11/2025 al 30/11/2025	Periodo de Ejecución: 02/10/2025 al 30/11/2025			
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 4,143,889.01	\$ 3,572,318.11	\$ 1,450,361.15	\$ 1,250,311.34	2%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$	58,815.55	ESTA ESTIMACION
\$ 23,879.11	16 % I.V.A (+) \$	9,410.49	\$ 68,226.04
	Sub- Total A (=) \$	68,226.04	
AMORTIZACION ANTERIOR	Amortizacion Anticipo 35% \$	20,585.44	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 1,426,482.04	16 % I.V.A (+) \$	3,293.67	\$ 4,075,662.97
	Total (=) \$	23,879.11	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL \$	38,230.11	TOTAL ACUMULADO.
\$ 1,450,361.15	16 % I.V.A (+) \$	6,116.82	\$ 4,143,889.01
	Total (=) \$	44,346.93	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC: \$	1,764.47	CONTRATADO
\$ 1,450,361.15	Total Deducciones (=) \$	25,643.58	\$ 4,143,889.01
	Importe T O T A L \$	42,582.46	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 42,582.46	SALDO
\$0.00	Son:		\$ -
	(SON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)		

ELABORO

C. ANA MARCELA ALMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME
R.F.C. SIN.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.

ESTADO DE CUENTA

			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	02-oct-25	FECHA TERMINACION CONTRATO:	30-nov-25	CONTRATO:	MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025	FECHA CONTRATO:	29-sep-25	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$3,572,318.11	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$1,450,361.15	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:		AL			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$4,143,889.01	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:		IMPORTE TOTAL CONTRATADO:		\$4,143,889.01	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE C/IVA ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3 % SVIFYC:	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (NORMAL)	02-oct-25	02-nov-25	\$ 1,086,580.55	\$ 936,707.37	\$ 28,101.22	\$ 380,303.19	\$ 408,404.41	\$ 678,176.14
02 (NORMAL)	02-nov-25	30-nov-25	\$ 2,802,440.28	\$ 2,415,896.79	\$ 72,476.90	\$ 980,854.10	\$ 1,053,331.00	\$ 1,749,109.28
03 (NORMAL)	02-nov-25	30-nov-25	\$ 186,642.14	\$ 160,898.40	\$ 4,826.95	\$ 65,324.75	\$ 70,151.70	\$ 116,490.44
01 (ADICIONAL) FINIQUITO	02-nov-25	30-nov-25	\$ 68,226.04	\$ 58,815.55	\$ 1,764.47	\$ 23,879.11	\$ 25,643.58	\$ 42,582.46
TOTALES:			\$ 4,143,889.01	\$ 3,572,318.11	\$ 107,169.54	\$ 1,450,361.15	\$ 1,557,530.69	\$ 2,586,358.32
SALDO DEL CONTRATO:			\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00		

ELABORO

C. ANA MARCELA BARRERA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA

30/11/2025

CONTRATISTA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO:C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.**R.F.C.**

SCO-230519-155

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA.**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

		LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$3,572,318.11

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$4,143,889.01

OBRA**IMPORTE**

1	PRELIMINARES	\$	32,247.75
2	ESTRUCTURA	\$	25,295.15
3	INSTALACIONES ESPECIALES	\$	1,272.65

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 58,815.55**SUB TOTAL=** \$ 58,815.55**I.V.A AL 16 %** \$ 9,410.49**TOTAL =** \$ 68,226.04

ELABORO

C. ANA MARCELA MADA E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA 30/11/2025
HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,
AHOME SIN.
R.F.C.
SCO-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN:	LOCALIDAD	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 (ADICIONAL) FINIQUITO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$4,143,889.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.	TOTAL					
1	PRELIMINARES									
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	1,251.93	\$ 118.82	\$ 148,754.32	1,523.33	1,251.93	0.00	271.40	\$ 32,247.75
										TOTAL DE PRELIMINARES: \$ 32,247.75
2	ESTRUCTURA									
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	204.31	\$ 606.87	\$ 123,989.61	227.30	204.31	0.00	22.99	\$ 13,951.94
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	797.22	\$ 25.21	\$ 20,097.92	1,247.17	797.22	0.00	449.949	\$ 11,343.21
										TOTAL DE ESTRUCTURA: \$ 25,295.15
3	INSTALACIONES ESPECIALES									
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x 1 1/4"x1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$ 1,272.65	\$ 8,908.55	8.00	7.00	0.00	1.00	\$ 1,272.65
										TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES: \$ 1,272.65

TOTAL ESTIMACION	\$ 58,815.55
I.V.A.	\$ 9,410.49
TOTAL	\$ 68,226.04

ELABORO


C. ANA MARGARITA MUÑOZ E.
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSÉ R. CONTRERAS LÓPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 1 de 2

GENERADORES ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
1	PRELIMINARES								
	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	265.74	8.43	0.68		1,523.33		
							TOTAL	1,523.33	
							EN ESTIMACIÓN 01 (NORMAL)	958.65	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	206.80	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	86.48	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	271.40	
2	ESTRUCTURA								
	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	227.30			1.00	227.30		
							TOTAL	227.30	
							EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)	204.00	
							EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)	0.31	
							EN ESTA ESTIMACIÓN	22.99	

ELABORO

ING. JESUS JOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



NUMEROS GENERADORES DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. 2 de 2

GENERADORES ESTIMACION:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZA	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	265.74			1.00	265.74		LADO DERECHO
			265.74			1.00	265.74		LADO IZQUIERDO
			8.43			89.00	750.27		TRANSVERSALES
							TOTAL	1,281.75	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		797.22	
						EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)		0.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		449.949	
						SIN COBRAR		34.58	
3	INSTALACIONES ESPECIALES								
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA				8.00	8.00		
							TOTAL	8.00	
						EN ESTIMACIÓN 02 (NORMAL)		7.00	
						EN ESTIMACIÓN 03 (NORMAL)		0.00	
						EN ESTA ESTIMACIÓN		1.00	

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

ING. JESUS YOVANNY MONTE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA



DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

1 de 2

**SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA:

CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

PRELIMINARES

GP02

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.



ELABORO

ING. JESUS YOVANNY MONJE HEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



FECHA: 30/11/2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DEPENDENCIA:

CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

2 de 2

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
S. DE R.L. DE C.V.

OBRA:


ESTIMACION: 01 (ADICIONAL) FINIQUITO
2 ESTRUCTURA

GP088

PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.

GP13

CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

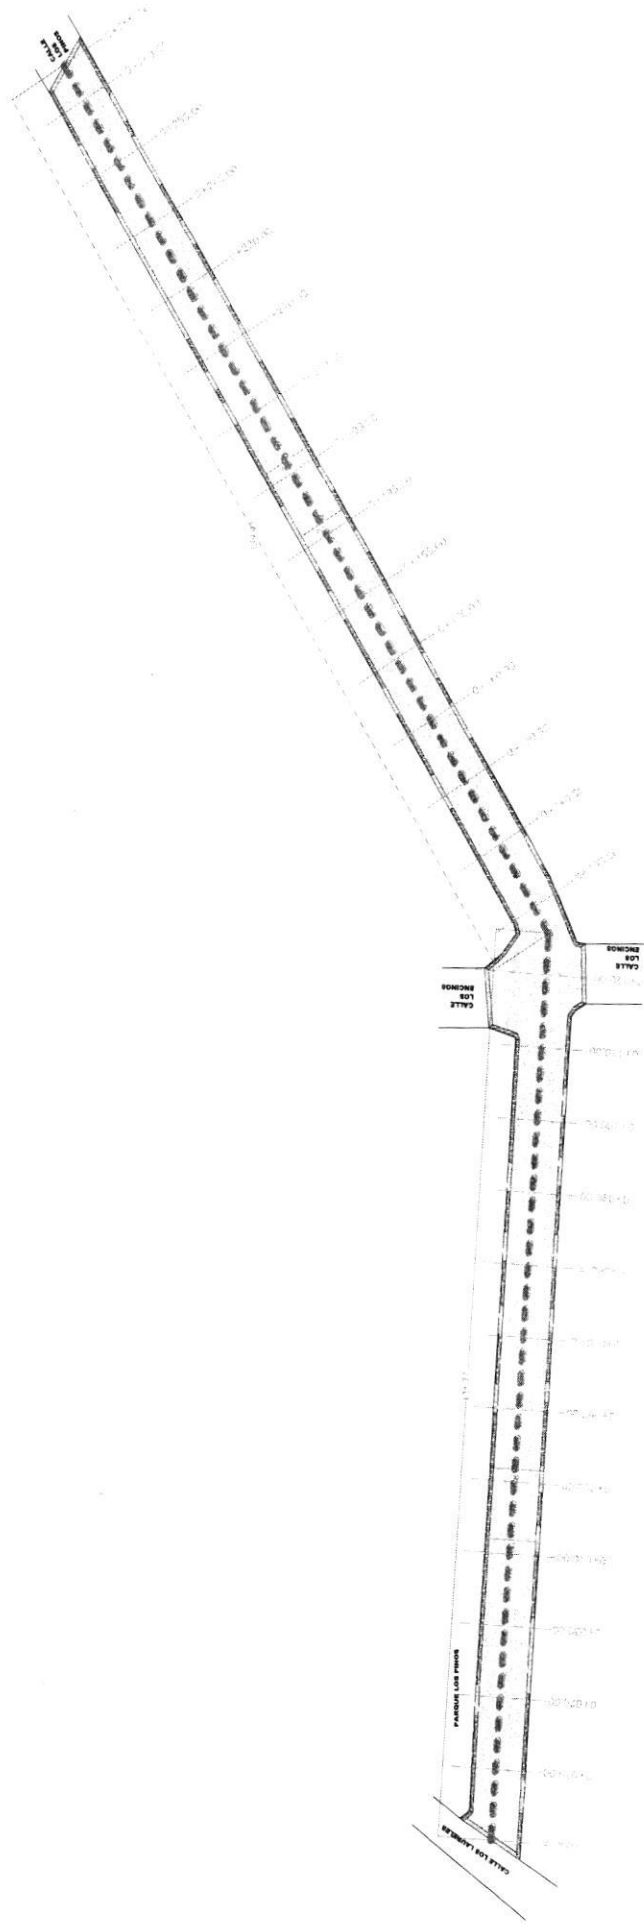

ELABORO

ING. JESUS YONNY MONTEHEREDIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO

ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.



Fecha y hora de consulta26/12/2025 1:22:04 PM

Contrato00798320

Nombre del ClienteMUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.



Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción:EST 01 AD FINQ LP008

Importe de la operación:42,582.46 MXP

Cuenta de retiro:0124174836

Cuenta de depósito:030743900036659975

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Titular de la cuenta:SEIS ONCE CONSTRUCTORA S DE RL DE CV

Nombre banco destino: BAJIO

Fecha de creación:26/12/2025

Fecha de aplicación:26/12/2025

Concepto de pago:EST 01 AD FINQ LP008

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad:ASD 6551749382

Hora de captura en el canal:13:22:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario:0000932102

Clave de rastreo:002601002512260000932102

Folio de firma:0020707043

Folio único:I401202512261322020020707049

Estado operación

Porcentaje Firmado:100%

Estado:Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/12/2025
