

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

Cerca-Pueblo

HOJA

1

ESTIMACION 1 (UNO)

IMPORTE.-

\$ 56,612.66

IVA 16%.-

\$ 9,058.03

IMPORTE CON IVA.

\$65,670.69

LUGAR:

COL. PROFESIONISTAS

CONTRATISTA:

JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

OBRA:

REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO No.:

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025

MONTO C/IVA:

\$236,520.49

ESTADO CONTABLE

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA			ANTICIPO-AMORTIZACION		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SIIVA	\$ 203,896.97	\$ 203,896.97	MONTO ANTICIPO SIIVA		
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 203,896.97		ESTIMACION 1 NORMAL		
			IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$ 203,896.97	
			MENOS AMORTIZACION	\$ -	
			SUMA	\$ 203,896.97	
			MAS 16% IVA	\$ 32,623.52	
			SUBTOTAL	\$ 236,520.49	
			DEDUCCIONES INSP. Y VIG. 3 %	\$6,116.91	
			SALDO LIQUIDO	\$230,403.58	

ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

CONTRATISTA

ING. OSCAR DAUTT LEYVA

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

GERENTE GENERAL JAPASA

		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO						CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES		HOJA		1					
ESTIMACION 1 (UNO)										IMPORTE.-		\$ 203,896.97		DE		1	
										IMPORTE CON IVA.-				IVA 16%.-		\$ 32,623.52	
														\$236,520.49			
LUGAR:		COL. PROFESIONISTAS		CONTRATISTA:		JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO											
OBRA:		REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025											
				MONTO C/IVA:		\$236,520.49											

RESUMEN DE ESTIMACION		
PARTIDAS		
A12 EXCAVACIONES	\$44,014.83	
A13 TUBERIA PVC	\$63,493.02	
A15 POZOS DE VISITA	\$27,196.38	
B CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$69,192.74	
TOTAL ESTIMACION \$203,896.97		
 ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO CONTRATISTA	 ING. OSCAR DAUTT LEYVA SUPERVISOR	 LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO GERENTE GENERAL JAPASA

ESTIMACION 1 (UNO)		IMPORTE.-	\$203,896.97	IVA 16%.-	\$32,623.52
		17/11/2025 A 07/12/2025			
LUGAR:	COL. PROFESIONISTAS	CONTRATISTA:	JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO		
OBRA:	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR	CONTRATO No.:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025		
		MONTO C/IVA:	\$236,520.49		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					PRECIO UNIT.		IMPORTE	
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	\$		\$	
A12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO								\$ 203,896.97	
AGP1	EXCAVACIONES								\$ 44,014.83	
	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	ML	99.92	105.10	5.18	105.10	\$13.29		\$ 1,396.78	

AGP2	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	159.36	64.50		64.50	\$106.54		\$ 6,871.83	
------	---	----	--------	-------	--	-------	----------	--	-------------	--

AGP4	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA	M3	7.10	8.41	1.31	8.41	\$513.15		\$ 4,315.59	
------	--	----	------	------	------	------	----------	--	-------------	--

AGP5	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO	M3	36.03	43.02	6.99	43.02	\$554.52		\$ 23,855.45	
------	---	----	-------	-------	------	-------	----------	--	--------------	--


CONTRATISTA:
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO


SUPERVISOR:
ING. OSCAR DAUTT LEYWA


AUTORIZO:
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
GERENTE GENERAL
1 DE 3



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



ESTIMACIONES DE OBRA

Cerca del Pueblo

FECHA

09-dic-25

ESTIMACION 1 (UNO)

17/11/2025 A 07/12/2025

IVA 16%.-

\$203,896.97

IMPORTE.-

\$32,623.52

IMPORTE CON IVA.-

\$236,520.49

LUGAR:	COL. PROFESIONISTAS	CONTRATISTA:	JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO
OBRA:	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, CINALOA	CONTRATO No.:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025
		MONTO C/IVA:	\$236,520.49

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				PRECIO UNIT.		IMPORTE	
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.			

*TEMP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION", LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	ML	94.64	105.10	10.46	105.10	\$8.76	\$	920.68
---------	---	----	-------	--------	-------	--------	--------	----	--------

CONXP12	CONEXION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 12" SERIE 20 A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE POZO, DEMOLICION Y ADECUACION DE MEDIA CAÑA, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, REPARACION INTERIOR DEL POZO DE VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EQUIPO.	PZA	2.00	2.00		2.00	\$3,327.25	\$	6,654.50
---------	---	-----	------	------	--	------	------------	----	----------

A13 TBO12	TUBERIA PVC SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE DIAMETRO	ML	96.32	105.10	8.78	105.10	\$537.57	\$	63,493.02
--------------	--	----	-------	--------	------	--------	----------	----	-----------

ITBO12	INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	96.32	105.10	8.78	105.10	\$66.55	\$	6,994.41
--------	---	----	-------	--------	------	--------	---------	----	----------

A15 *TEMP22	POZOS DE VISITA CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA, DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4", ARMADOS CON 3 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO, CADA 15 CMS Y TAPA CON VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$2,621.31	\$	27,196.38
----------------	--	-----	------	------	------	------	------------	----	-----------

CONTRATISTA: 
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

SUPERVISOR: 
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

AUTORIZO: 
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
GERENTE GENERAL
2 DE 3

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

FECHA

09-dic-25

ESTIMACIONES DE OBRA

ESTIMACION 1 (UNO)

17/11/2025 A 07/12/2025

LUGAR:

COL. PROFESIONISTAS

OBRA:

REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR

CONTRATISTA:

CONTRATO No.:

MONTO C/IVA:

IMPORTE:-

IVA 16%:-

IMPORTE CON IVA:-

IMPORTE

IVA 16%

IMPORTE CON IVA

JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025

\$236,520.49

UNIDAD

PRESUPUESTO

ACUM. TOTAL

EXCEDENTE

ACUM. ANT.

PRECIO UNIT.

IMPORTE

TEMP0 03

POZO DE VISITA TIPO COMUN 2.00 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM. INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.

41.173590

2.00

41.173590

1.00

\$21,953.76

\$ 21,953.76

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

EXCAVACION EN MATERIAL C (ROCA FIJA) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 MTS, INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIAL, MAQUINARIA, Y EQUIPO.

41.173590

41.173590

\$ 69,192.74

\$ 38,935.805

EXT-02

POZO DE VISITA TIPO COMUN 1.60 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM. INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2

41.173590

1.00

\$17,568.55

\$ 17,568.55

EXT-03

RELLENO A VOLTEO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA

41.173590

109.32

\$19.14

\$ 2,092.38

EXT-04

DESMONTE Y DESHERBE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

41.173590

600.00

\$17.66

\$ 10,596.00

CONTRATISTA:

ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

AUTORIZO:

LIC. MARIA ISAUARA BEJARANO LUGO

GERENTE GENERAL

3 DE 3

OBRA:	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		PERIODO:	17/11/2025 A 07/12/2025
LUGAR:	COL. PROFESIONISTAS			
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025			
	ESTIMACION 1 (UNO)			

COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION		TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO							PARCIAL	TOTAL	
A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO											
A12	EXCAVACIONES										105.10	
AGP1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO					8.60						
	ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA					88.10						
						8.40						
AGP2	EXCAVACION CON MÁQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FLUA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA	0+000.00	0+008.70		M3	8.60	0.80	1.78		12.25	64.50	
		0+008.70	0+018.70			10.00	0.80	1.77		14.16		
		0+018.70	0+028.70			10.00	0.80	1.44		9.68		
		0+028.70	0+038.70			10.00	0.80	1.07		8.56		
		0+038.70	0+048.70			10.00	0.80	0.62		4.96		
		0+048.70	0+058.70			10.00	0.80	0.42		3.36		
		0+058.70	0+068.70			10.00	0.80	0.35		2.80		
		0+068.70	0+078.70			10.00	0.80	0.31		2.48		
		0+078.70	0+088.70			10.00	0.80	0.32		2.56		
		0+088.70	0+098.80			8.10	0.80	0.29		1.88		
		0+098.80	0+105.10			8.40	0.80	0.27		1.81		
AGP4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO	0+000.00	0+008.70		M3	8.60	0.80	0.10		0.69	8.41	
		0+008.70	0+018.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+018.70	0+028.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+028.70	0+038.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+038.70	0+048.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+048.70	0+058.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+058.70	0+068.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+068.70	0+078.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+078.70	0+088.70			10.00	0.80	0.10		0.80		
		0+088.70	0+098.80			8.10	0.80	0.10		0.65		
		0+098.80	0+105.10			8.40	0.80	0.10		0.67		
AGP5	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCEVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	0+000.00	0+008.70		M3	8.60	0.80	0.60		4.13	43.02	
		0+008.70	0+018.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+018.70	0+028.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+028.70	0+038.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+038.70	0+048.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+048.70	0+058.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+058.70	0+068.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+068.70	0+078.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+078.70	0+088.70			10.00	0.80	0.60		4.80		
		0+088.70	0+098.80			8.10	0.80	0.60		3.89		
		0+098.80	0+105.10			8.40	0.80	0.60		4.03		
						(3.1416(0.30^2))/4=		0.0707		-7.43		
									105.10			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

NUMEROS GENERADORES

09/12/2025

COD.	CONCEPTO	EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
*TEMP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION". LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	0+000.00	0+008.70			ML	8.60					105.10	
		0+008.70	0+018.70				10.00						
		0+018.70	0+028.70				10.00						
		0+028.70	0+038.70				10.00						
		0+038.70	0+048.70				10.00						
		0+048.70	0+058.70				10.00						
		0+058.70	0+068.70				10.00						
		0+068.70	0+078.70				10.00						
		0+078.70	0+088.70				10.00						
		0+088.70	0+096.80				8.10						
		0+096.80	0+105.10				8.40						

CONXP12

CONEXION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 12" SERIE 20 A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE POZO, DEMOLICION Y ADECUACION DE MEDIA CAÑA, ENCOFRADO DE TUBERIA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, REPARACION INTERIOR DEL POZO DE VISITA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PZA

2.00

A13

TUBERIA PVC

TUBERIA PVC
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE
DIAMETRO
INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE
DIAMETRO. INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ML

05.10

105.10

ITBO12

DIAMETRO
INSTALACION

DIÁMETRO
INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 315 MM (12") DE
DIÁMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ML

05.10

105.10

A15

POZOS DE VISITA

POZOS DE VISITA
CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y
TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA. DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON TAMAÑO
MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4". ARMADOS CON 3
VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO Y ESTRIBOS DE
1/4" DE DIÁMETRO A CADA 15 CMS Y TAPA CON
VARILLA DE 3/8 DE DIÁMETRO A CADA 30 CM EN
AMBOS SENTIDOS.

PZA

2.00

2.00

CONTRATISTA:
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO







SUPERVISOR:
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL:
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
2 DE 3

CONTRATISTA:
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
REPORTE FOTOGRAFICO

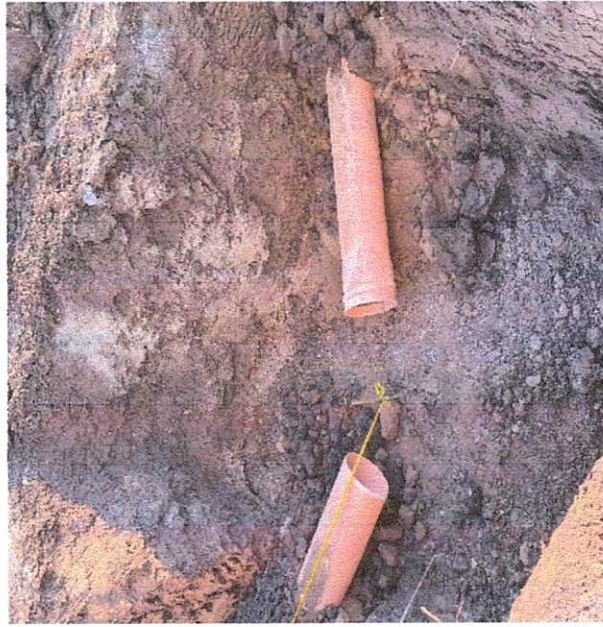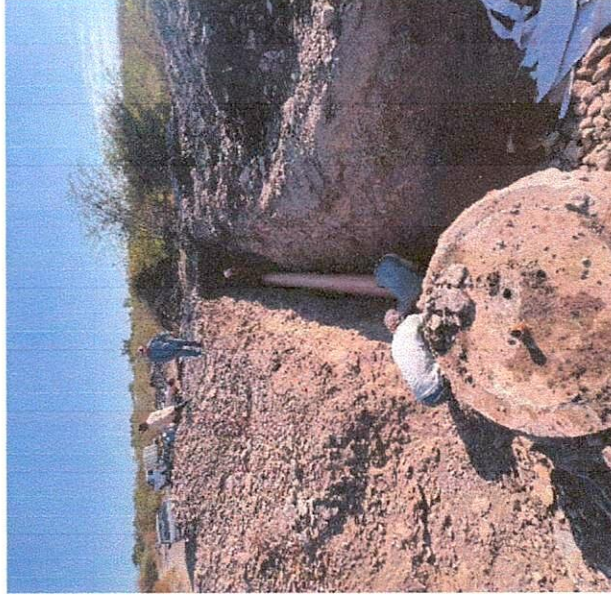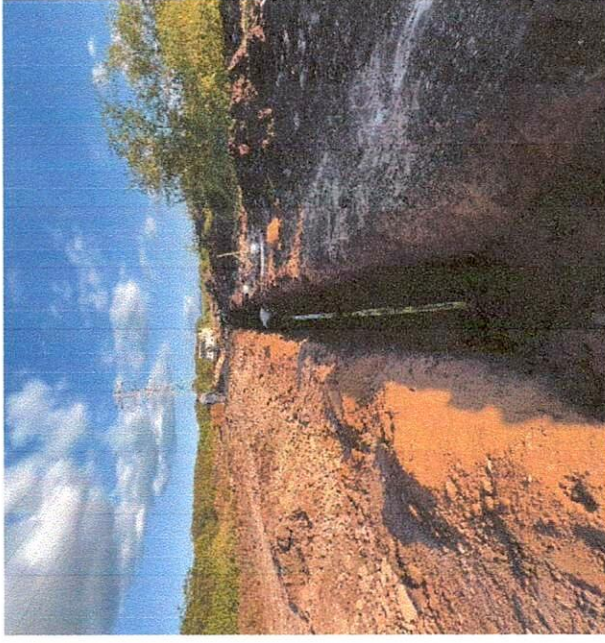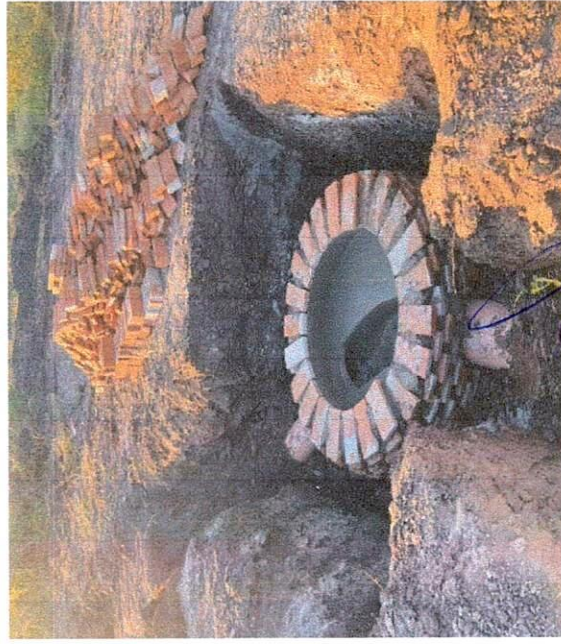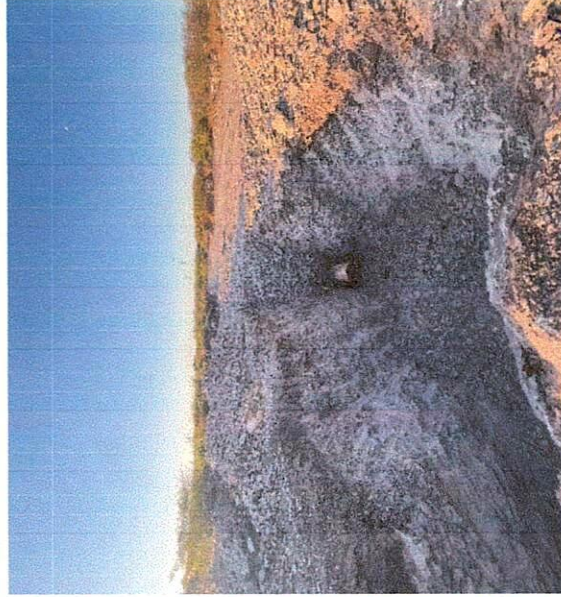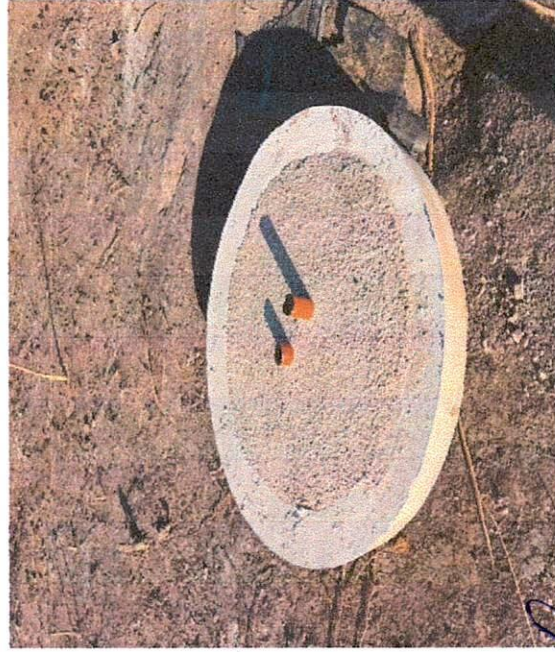

[Signature]






[Signature]

[Signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO


REPORTE FOTOGRAFICO

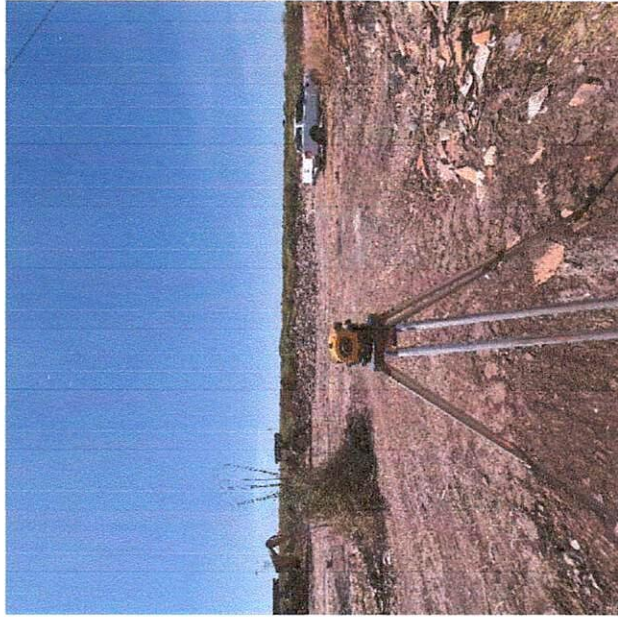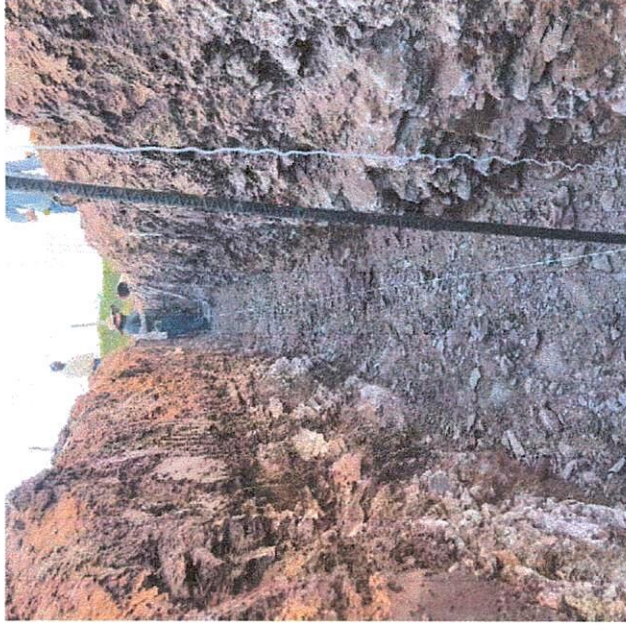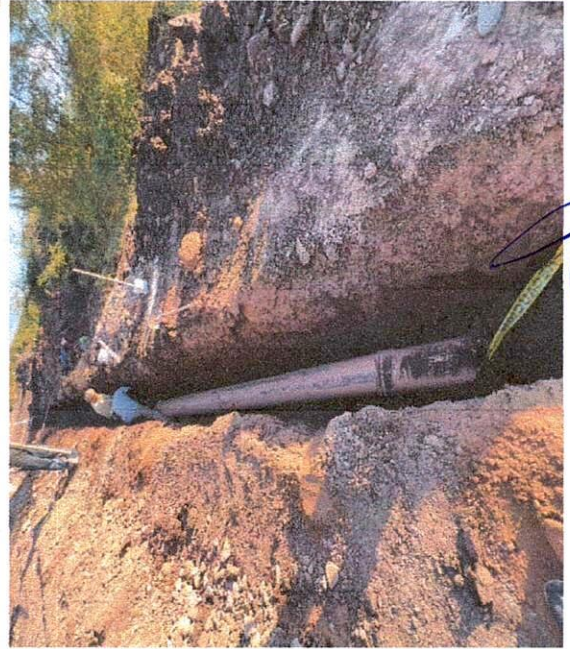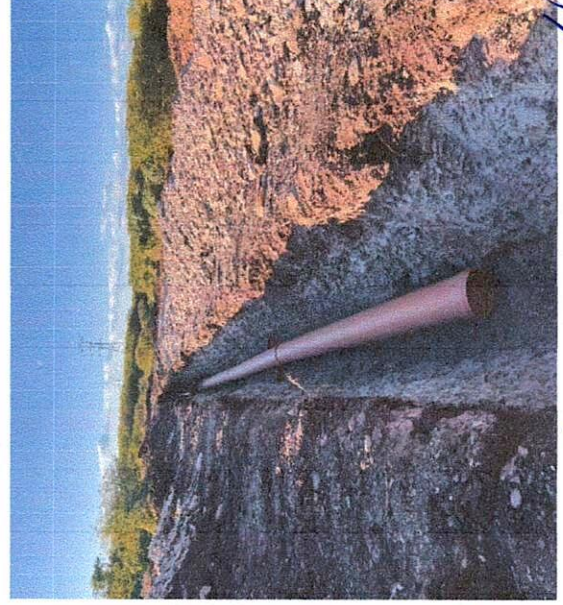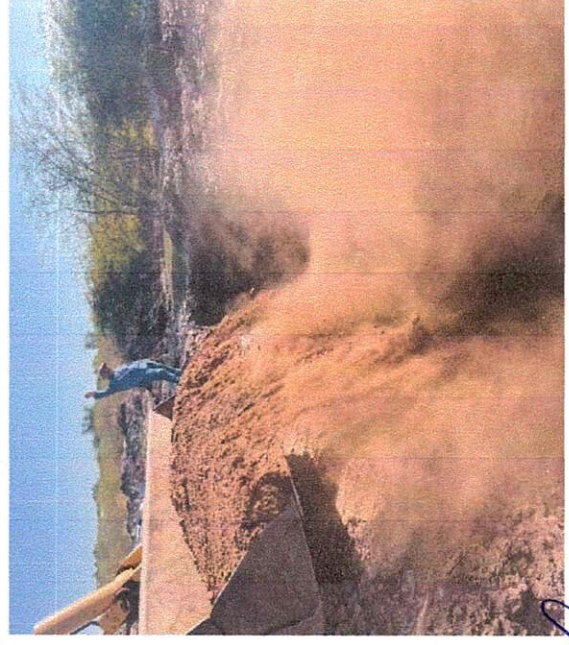

[Signature]

Don't forget to sign

[Signature]

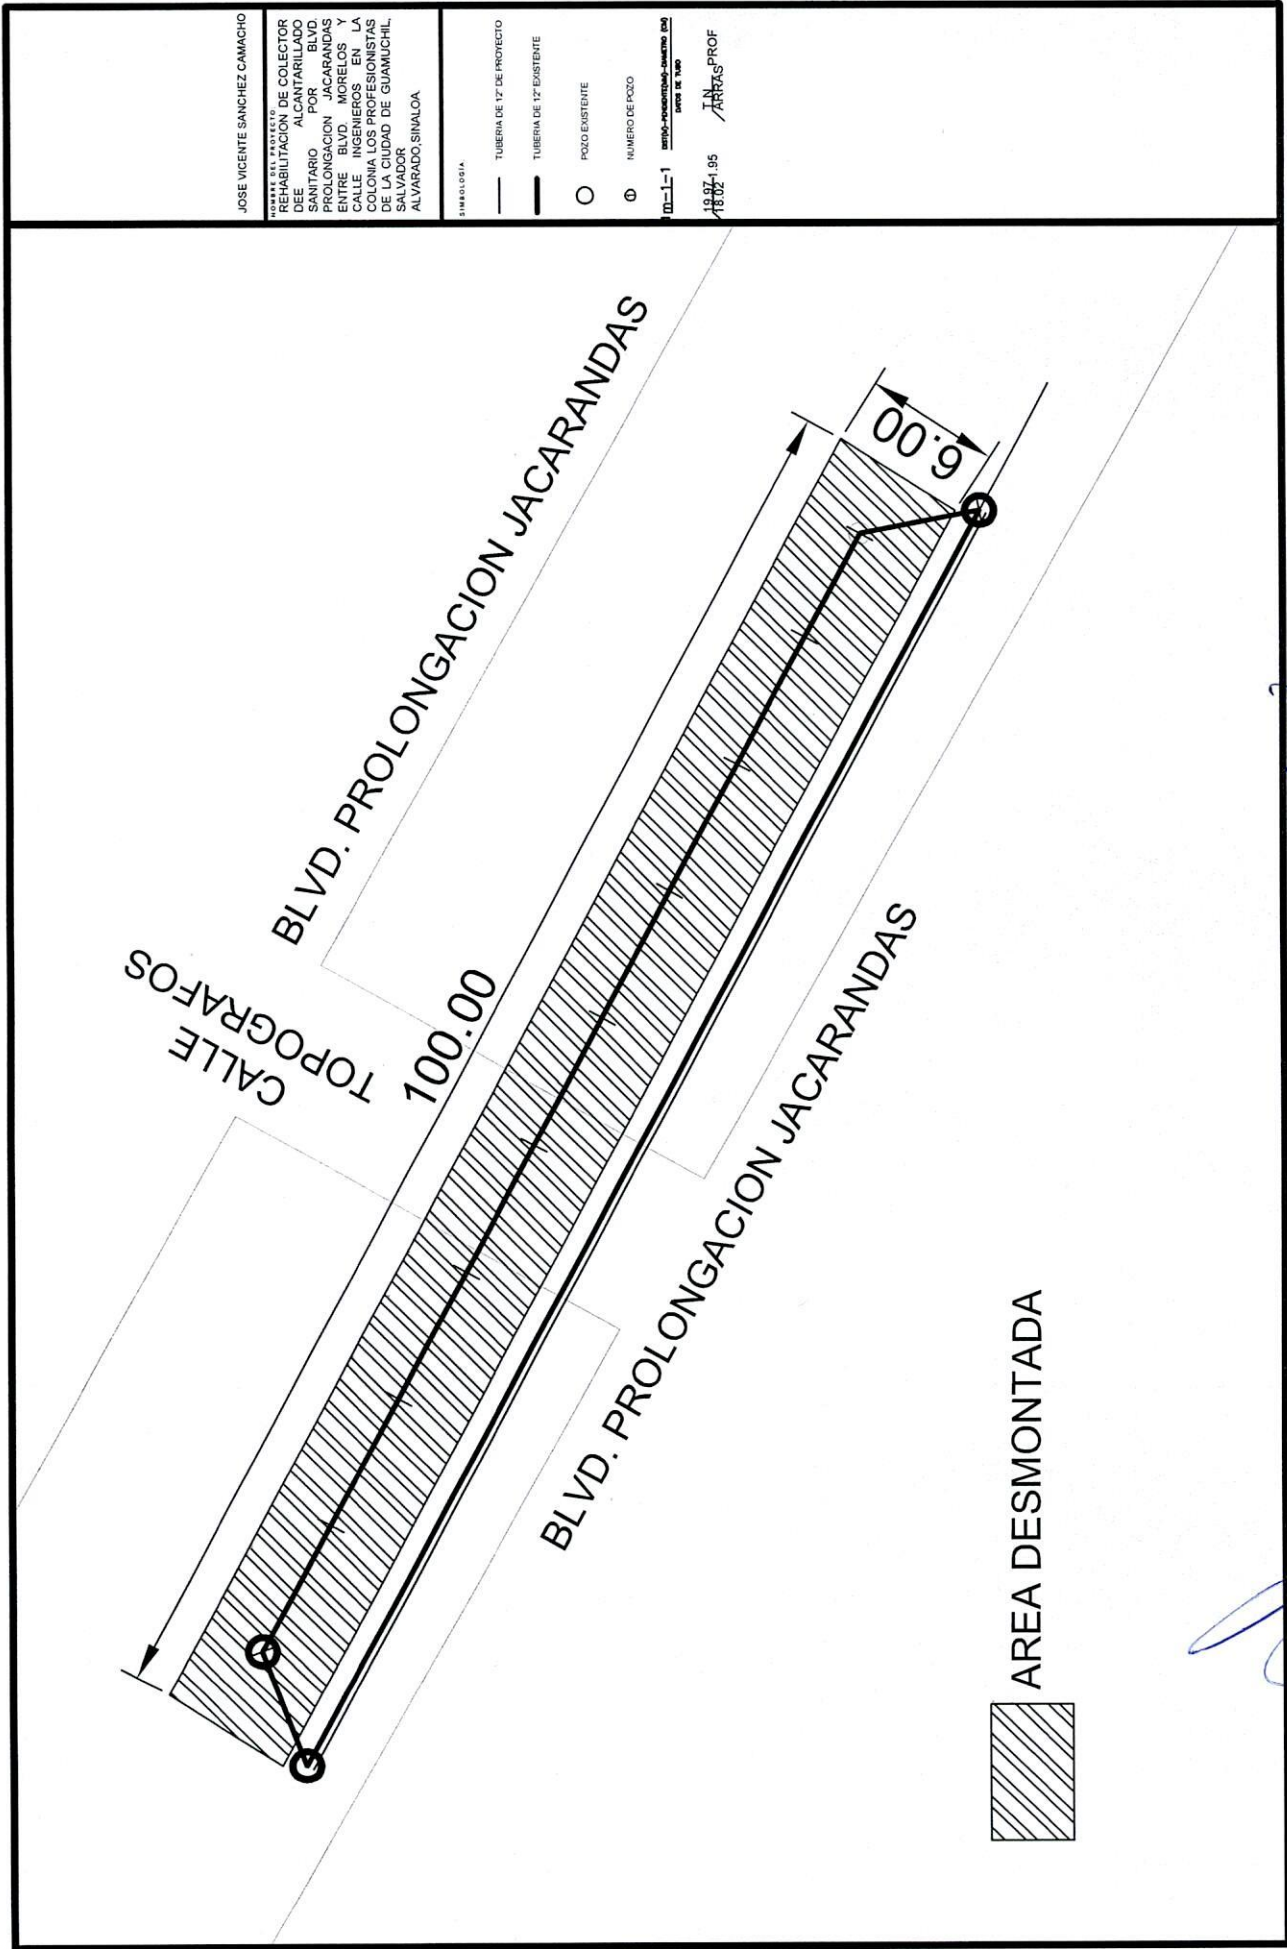

JESUS GENOVEVO
CAMACHO GERARDO

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE COLECTOR
SANITARIO POR BLVD.
PROLONGACION JACARANDAS
ENTRE BLVD. MORELOS Y
CALLE INGENIEROS EN LA
COLONIA LOS PROFESIONISTAS
DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
SALVADOR ALVARADO, SINALOA

SECCION 10-1

TUBERIA DE 12" DE PROYECTO

TUBERIA DE 12" EXISTENTE

POZO EXISTENTE

POZO DE POZO

NUMERO DE POZO

10-1-1



18.02

18.97


1.95

ARRAS

PROF

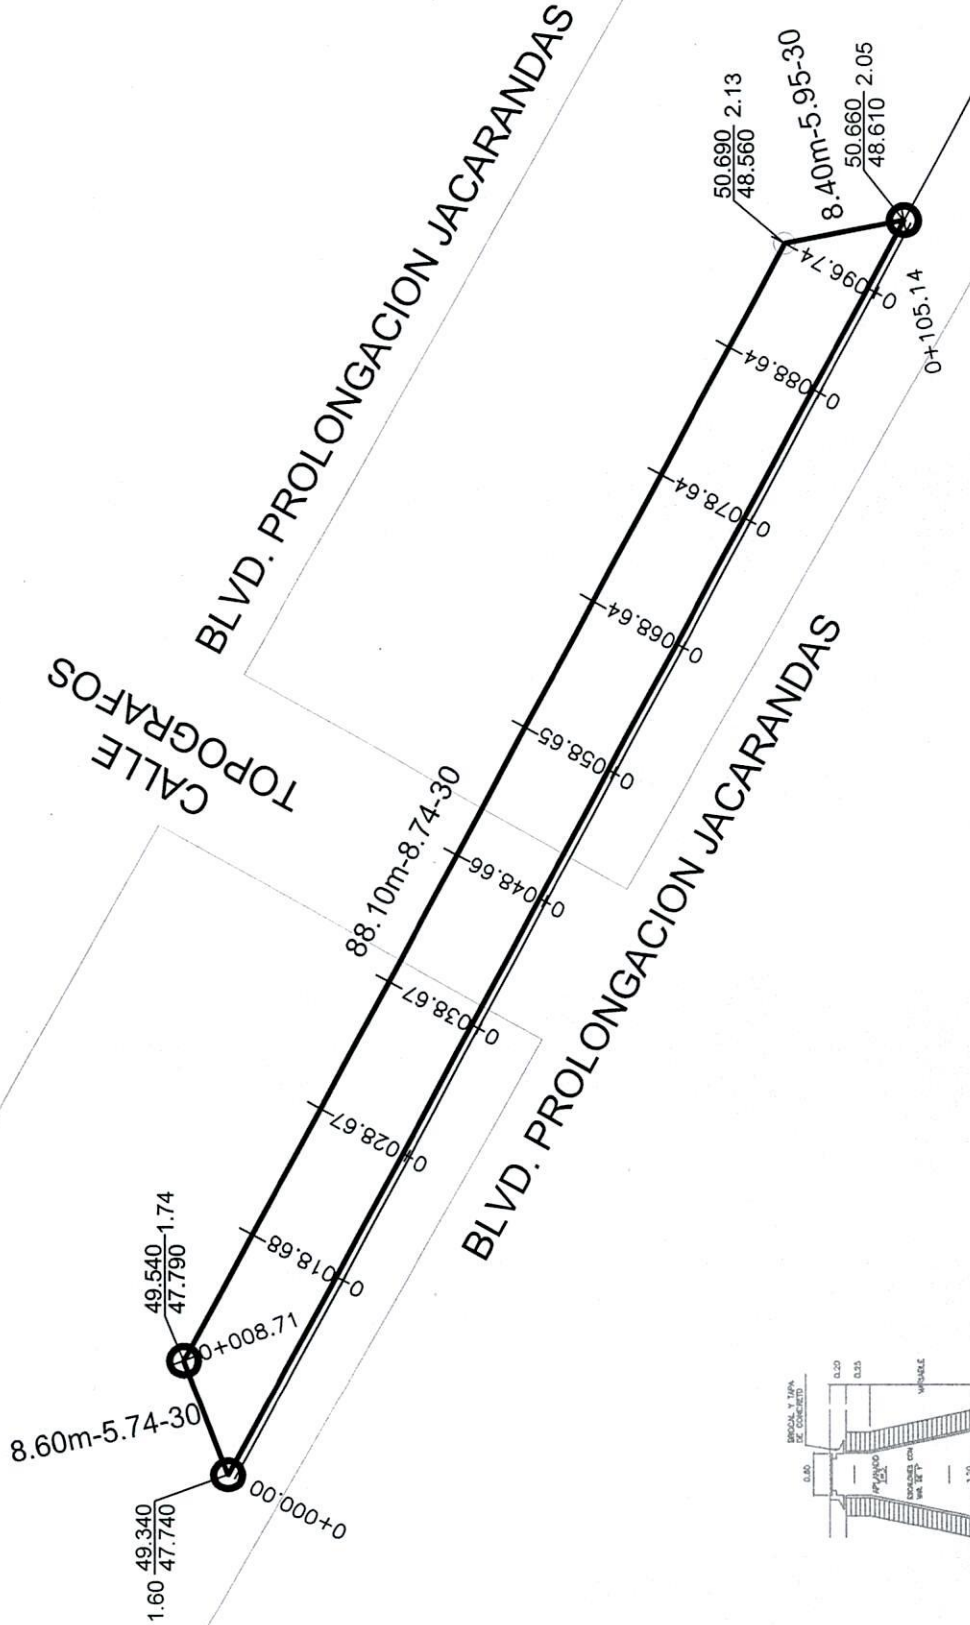

DETALLE DE TUBERIA
SIN ESCALA



POZO DE VISITA "COMUN"
SIN ESCALA

[Handwritten signatures and stamps]


JESUS GENOVEVO
CAMACHO GERARDO

PROYECTO DE REHABILITACION DE COLECTOR
DEE ALCANTARILLADO
SANTARIO POR BLVD
PROLONGACION JACARANDAS
ENTRE BLVD MORELOS Y
CALLE INGENIEROS EN LA
COLONIA LOS PROFESIONISTAS
DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
SALVADOR
ALVARADO, SINALOA

POZO DE VISITA

PERFIL DE
PROFUNDIDADES Y
ARRASTRES


PERFIL DE EXCAVACION

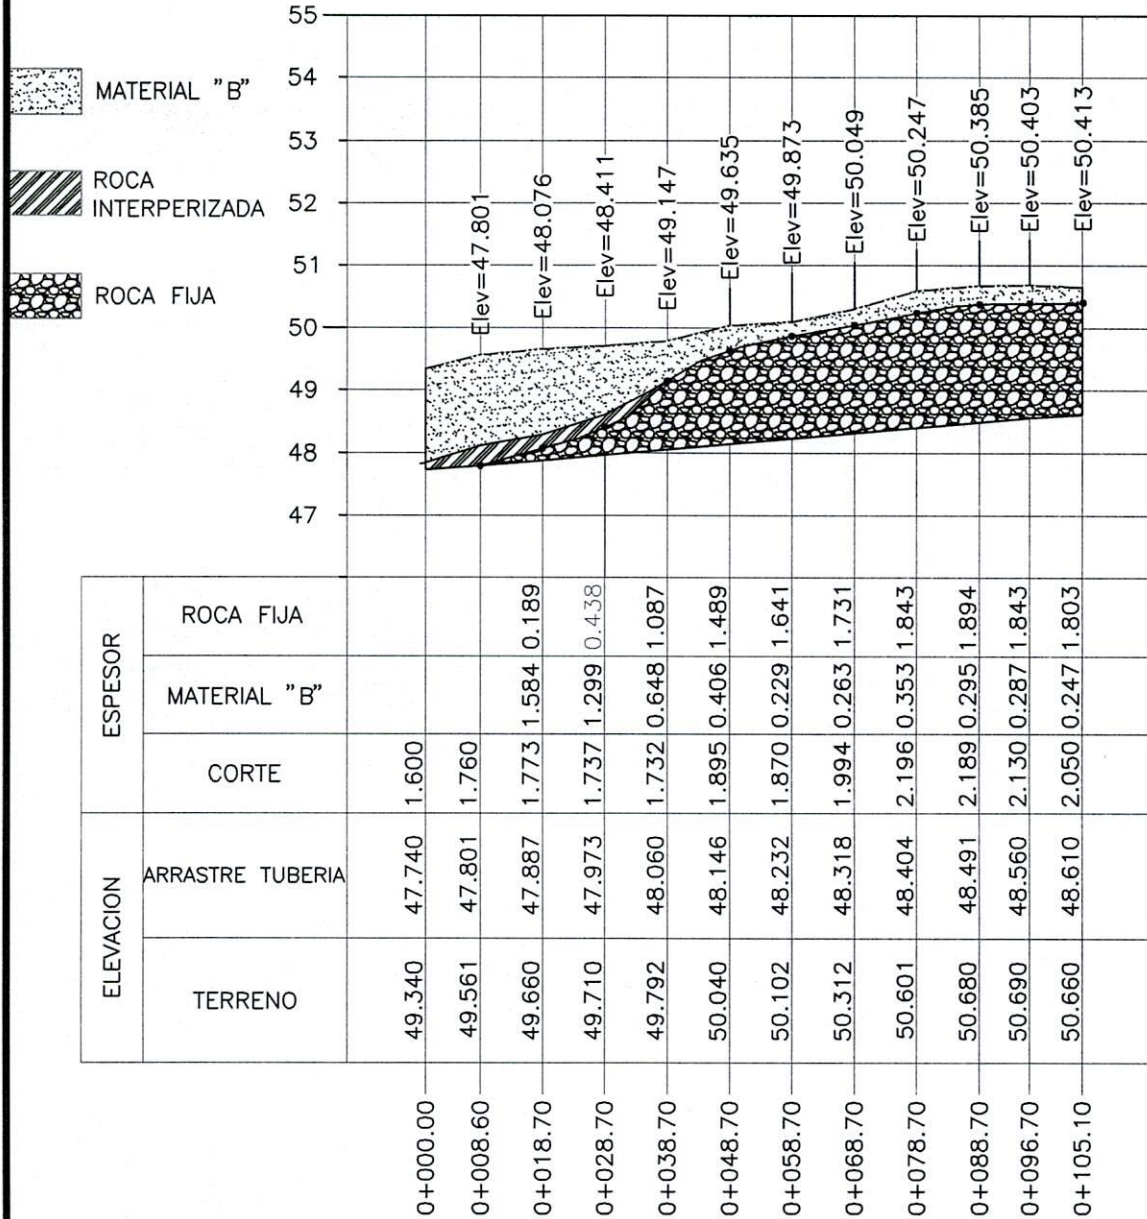

[Handwritten signatures]


JESUS GENOVEVO
CAMACHO GERARDO

REHABILITACION DE COLECTOR
DEE ALCANTARILLADO
SANTARIO POR BLVD.
PROLONGACION JACARANDAS
ENTRE BLVD. MORELOS Y
CALLE INGENIEROS EN LA
COLONIA LOS PROFESIONISTAS
DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO
SALVADOR, SINALOA



POZO DE VISITA

PERFIL DE
PROFUNDIDADES Y
ARRASTRES

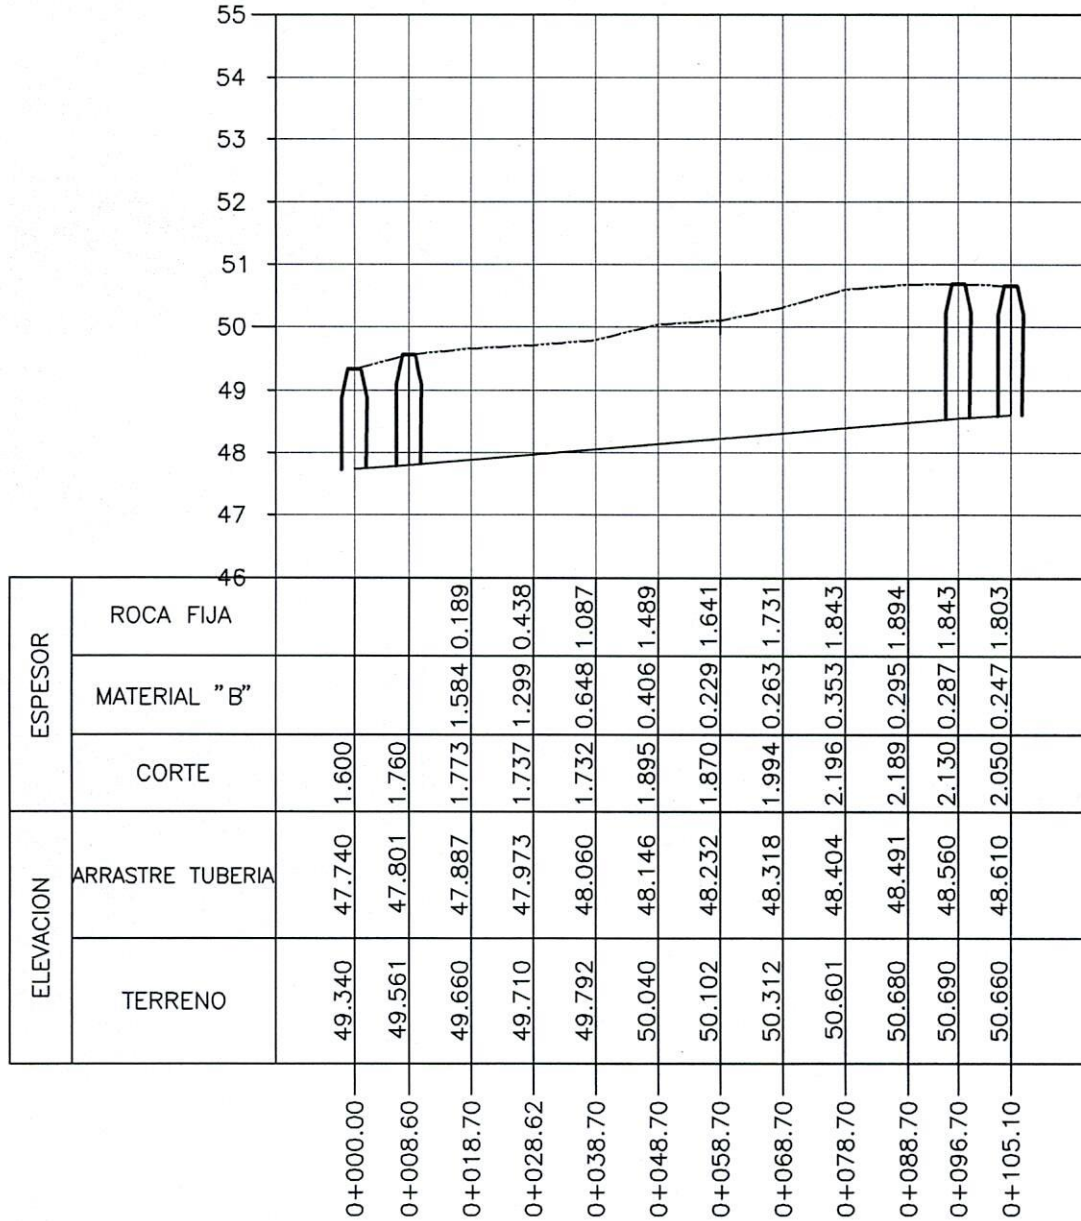

PERFIL

[Handwritten signatures and stamps]

						HOJA		1	
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO		CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES				DE		1	
ESTIMACION 2 FINIQUITO		IMPORTE.-		\$ 56,612.66		IVA 16%.-		\$ 9,058.03	
		IMPORTE CON IVA		\$65,670.69					
LUGAR:		COL. PROFESIONISTAS		CONTRATISTA:		JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO			
OBRA:		REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025			
				MONTO C/IVA:		\$236,520.49			
ESTADO CONTABLE									
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA				ANTIPO-AMORTIZACION					
ESTIMACIONES		IMPORTE		SALDO		RETENCIONES		IMPORTE	
MONTO CONTRATO SIIVA		\$ 203,896.97		203,896.97		MONTO ANTIPO SIIVA		\$ 56,612.66	
ESTIMACION 1 NORMAL		\$ 203,896.97		-		ESTIMACION 1 NORMAL		\$ -	
CONVENIO MOD. DE MONTO		\$ 260,509.63		56,612.66		CONVENIO MOD. DE MONTO		\$ 56,612.66	
ESTIMACION 2 FINIQUITO		\$ 56,612.66		-		ESTIMACION 2 FINIQUITO		\$ 9,058.03	
								\$ 65,670.69	
								\$1,698.38	
								\$63,972.31	
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO		CONTRATISTA		ING. OSCAR DAUTT LEYVA		SUPERVISOR DE OBRA		LIC. MARIA ISAURA BEJANO LUJO	
								GERENTE GENERAL JAPASA	

		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO						CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES		HOJA		1							
ESTIMACION 2 FINIQUITO												DE		1					
												IMPORTE.-		\$ 56,612.66		IVA 16%.-		\$ 9,058.03	
												IMPORTE CON IVA.-						\$236,520.49	
LUGAR:		COL. PROFESIONISTAS		CONTRATISTA:		JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO													
OBRA:		REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025													
				MONTO C/IVA:		\$236,520.49													

RESUMEN DE ESTIMACION			
PARTIDAS			
B	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$56,612.66	
TOTAL ESTIMACION		\$56,612.66	
 ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO CONTRATISTA		 ING. OSCAR DAUTT LEYVA SUPERVISOR	 LIC. MARIA ISAURA BELARANO LUGO GERENTE GENERAL JAPASA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

ESTIMACIONES DE OBRA



FECHA

09-dic-25

ESTIMACION 2 FINIQUITO

17/11/2025 A 07/12/2025

LUGAR:

COL. PROFESIONISTAS

OBRA:

REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, GUINALOA

CONTRATISTA:

JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

CONTRATO No.:

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025

MONTO C/IVA:

\$236,520.49

IMPORTE.-

\$56,612.66

IVA 16%.-

\$9,058.03

IMPORTE CON IVA.-

\$65,670.69

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA							
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A12	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO								\$
B	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS								\$
EXT-01	EXCAVACION EN MATERIAL C (ROCA FIJA) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 MTS. INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIAL, MAQUINARIA, Y EQUIPO.	M3		101.0400	41.17359		59.8664	\$945.65	\$ 56,612.66



CONTRATISTA:
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO



SUPERVISOR:
ING. OSCAR DAUTT LEYVA



AUTORIZO:
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
GERENTE GENERAL
1 DE 1



NUMEROS GENERADORES

OBRA:	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR BLVD. PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.				PERIODO:		17/11/2025 A 07/12/2025				
LUGAR:	COL. PROFESIONISTAS										
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-008-2025										
	ESTIMACION 2 FINIQUITO										
	FECHA: 09/12/2025										
COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD				PARCIAL	TOTAL	
A	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO										
A12	EXCAVACIONES										
B	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	EXCAVACION EN MATERIAL C (ROCA FIJA) HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 MTS. INCLUYE: EXTRACCION DE MATERIAL, MAQUINARIA, Y EQUIPO.	0+018.70	0+028.70		M3	10.00	0.80	0.31	2.48	101.04	PAGADO EN ESTIMACION 1 (UNO) 41.17359 M3.
		0+028.70	0+038.70			10.00	0.80	0.76	6.08		PENDIENTES POR COBRAR EN ESTA ESTIMACION 59.8664 M3
		0+038.70	0+048.70			10.00	0.80	1.28	10.24		
		0+048.70	0+058.70			10.00	0.80	1.56	12.48		
		0+058.70	0+068.70			10.00	0.80	1.68	13.44		
		0+068.70	0+078.70			10.00	0.80	1.88	15.04		
		0+078.70	0+088.70			10.00	0.80	1.96	15.68		
		0+088.70	0+096.80			8.10	0.80	1.96	12.70		
		0+096.70	0+105.10			8.40	0.80	1.92	12.90		

CONTRATISTA:
ING. JESUS GENOVEVO CAMACHO GERARDO

SUPERVISOR:
ING. OSCAR DAUTT LEYVA




GERENTE GENERAL:
LIC. MARIA ISABEL BEJARANO LUGO
1 DE 1



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
REPORTE FOTOGRAFICO



COMUNIDAD DE CERCO DE PUEBLO

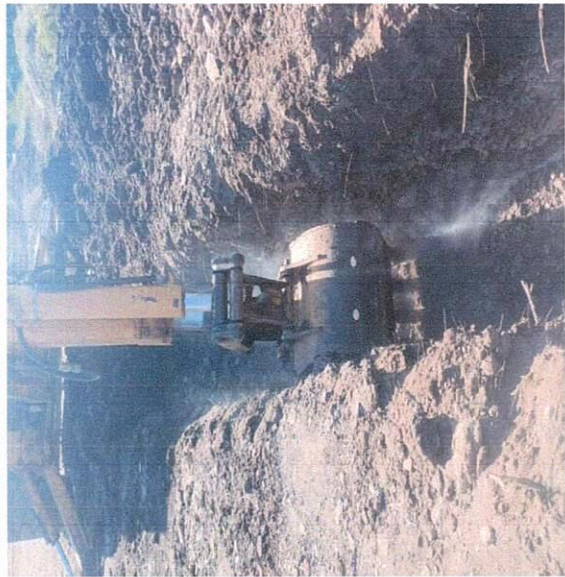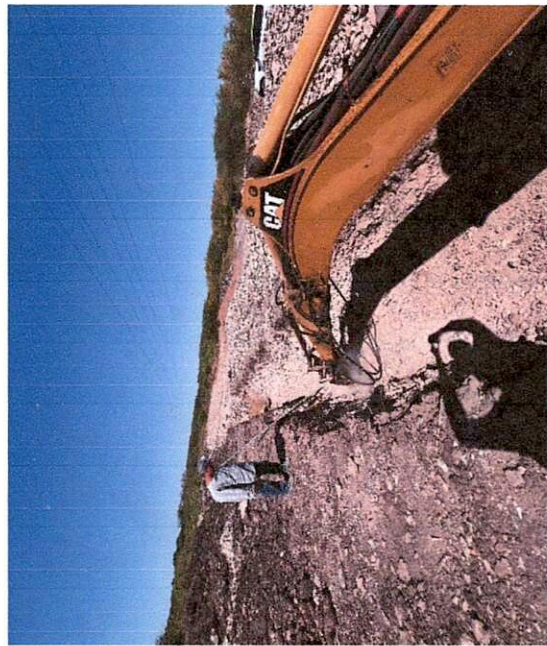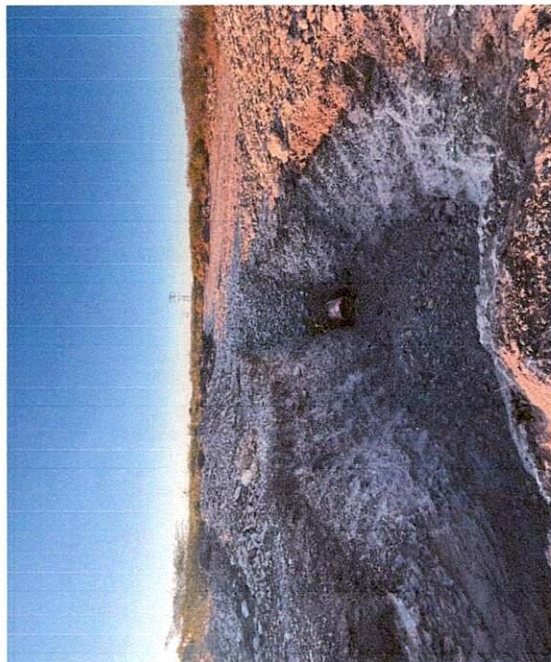


[Signature]

[Signature]

[Signature]

JESUS GENOVEVO
CAMACHO GERARDO


PROYECTO DE REHABILITACION DE COLECTOR
DEE ALCANTARILLADO
SANTARIO POR BLVD
PROLONGACION JACARANDAS
ENTRE BLVD MORELOS Y
CALLE INGENIEROS EN LA
COLONIA LOS PROFESIONISTAS
DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
SALVADOR ALVARADO, SINALOA



POZO DE VISITA

PERFIL DE
PROFUNDIDADES Y
ARRASTRES

PERFIL DE EXCAVACION

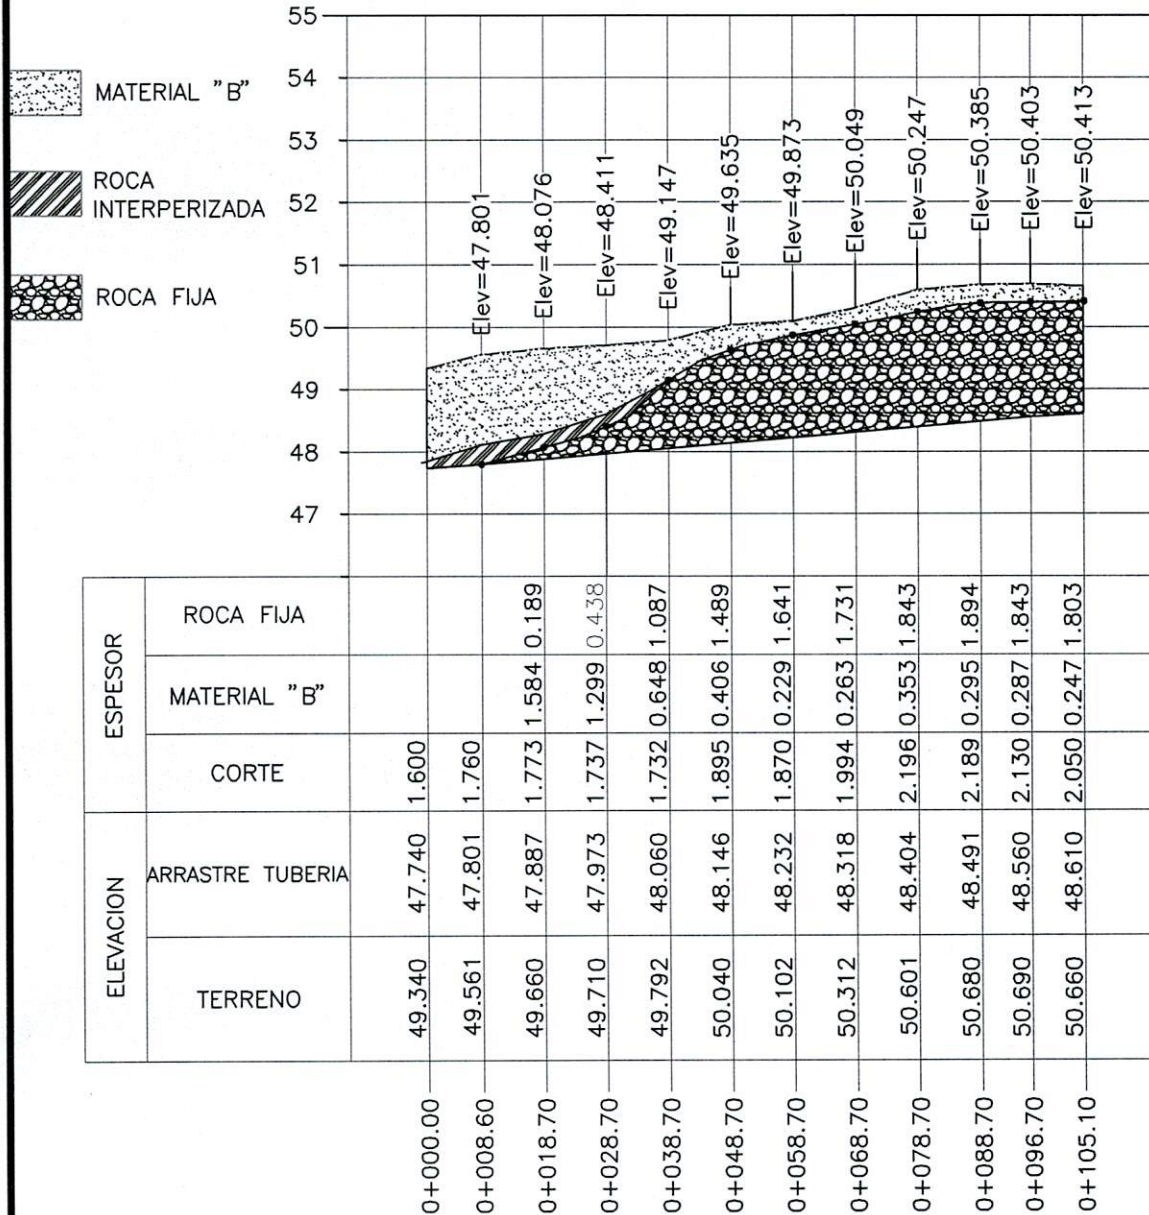

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

JESUS GENOVEVO
CAMACHO GERARDO

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES POR BLVD. SANITARIO PROLONGACION JACARANDAS ENTRE BLVD. MORELOS Y CALLE INGENIEROS EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR, SINALOA

LEGENDA



- TUBERIA DE 12" DE PROYECTO
- TUBERIA DE 12" EXISTENTE
- POZO EXISTENTE
- POZO DE PROYECTO
- NUMERO DE POZO

10-1-1


1984.95

1802

ARRAS PROF

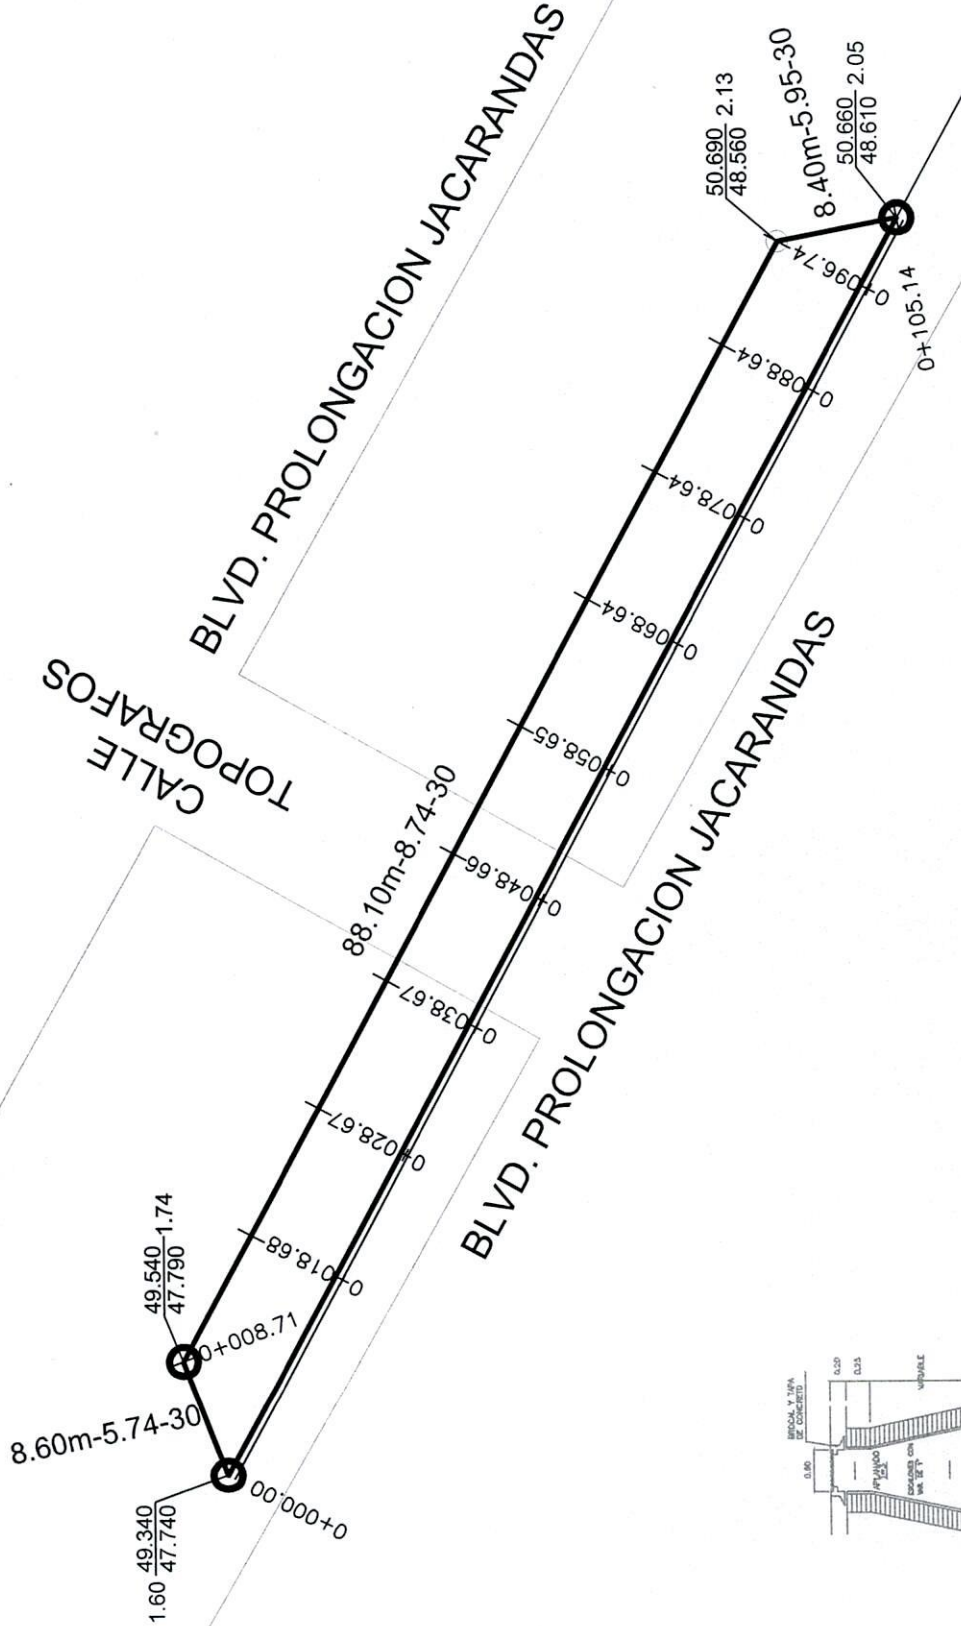

DETALLE DE TUBERIA
SIN ESCALA



POZO DE VISTA "COMUN"
SIN ESCALA

PLANO DE OBRA TERMINANDA

[Handwritten signatures]
