

ESTIMACION 2 FINIQUITO				20/10/2025 AL 28/11/2025		IMPORTE.-		\$	83,725.07	IVA 16%.-	\$	13,396.01
PERIODO DE EJECUCION						IMPORTE CON IVA.-		\$97,121.08				
LUGAR:	GUAMUCHIL		CONTRATISTA:		JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ							
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025							
			MONTO C/IVA:		\$571,279.68							

ESTADO CONTABLE							
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA				ANTICIPO-AMORTIZACION			
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO	IMPORTE
MONTO CONTRATO SIVA	\$492,482.48	\$492,482.48	MONTO ANTICIPO S/IVA	\$246,241.24	\$246,241.24	IMPORTE DE LA ESTIMACION	\$83,725.07
ESTIMACION 1 NORMAL	\$408,757.41	\$83,725.07	ESTIMACION 1 NORMAL	\$246,241.24	\$0.00		
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$83,725.07	\$0.00	ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ -	\$ -	MENOS AMORTIZACION SUMA MAS 16% IVA SUBTOTAL	\$0.00 \$83,725.07 \$13,396.01 \$97,121.08
						DEDUCCIONES: 3% INSP. Y VIG. (ASE)	\$2,511.75
						SALDO A PAGAR	\$94,609.33

CONTRATISTA JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	 SUPERVISOR DE OBRAS ING. OSCAR DAUTT LEYVA	 GERENTE GENERAL LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
---	---	--

		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES				1
ESTIMACION 2 FINIQUITO	PERIODO DE EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025	IMPORTE.-	\$ 83,725.07	IVA 16%.-	\$ 13,396.01
LUGAR: GUAMUCHIL	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		IMPORTE CON IVA.-	\$97,121.08	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	
OBRA:	CONTRATO No.:		CONTRATO No.:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025		
	MONTO CIIVA:		MONTO CIIVA:	\$571,279.68		

[illegible]



JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



[Signature]
SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

~~GERENTE GENERAL~~
~~LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO~~
~~PAGINA 1~~



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.										20/10/2025 AL 28/11/2025	
LUGAR: GUAMUCHIL											
CONTRATO: JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025											
ESTIMACION 2 FINIQUITO										FECHA: 04/12/2025	
OBRA:	AGPRC	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	M3	50.00	0.75	0.5	18.75	18.75
AGP7	AGP7	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	M3	50.00	0.75	0.60	22.50	29.25
*TEMP15		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION", LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	ML	50.00			50.00	50.00
AFINE	AFINE	AFINE Y CONFORMACION DE CALLES, A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LAS MISMAS DEJANDO BOMBEO Y CUNETAS, INCLUYE: EL EQUIPO MECANICO NECESARIO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	M2	110.00	8.00		880.00	880.00
A13	TB08	TUBERIA DE PVC SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 MM (8") DE DIAMETRO, CON JUNTA HERMETICA.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	ML	50.00			50.00	50.00
ITB08	ITB08	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 MM (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO	ML	50.00			50.00	50.00

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

[Signature]
GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 2



OBRA:		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.										PERIODO DE EJECUCION				20/10/2025 AL 28/11/2025			
LUGAR:		GUAMUCHIL																	
CONTRATO:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025																	
ESTIMACION 2 FINIQUITO																			
A14																			
DESCARGAS DOMICILIARIAS																			
AGP1		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA																	
AGP2		EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCETO ROCA FLUA EN ZONA "B". INCLUYE; AFLUJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA.																	
AGP4		PLANTILLA ARISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE; CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MODIDO COLOCADO																	
AGP5		RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCECIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO) TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.																	

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

**SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA**

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 3



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



Cercas de Pueblo

OBRA:		PERIODO DE EJECUCION										FECHA:	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		20/10/2025 AL 28/11/2025										04/12/2025	
LUGAR:		GUAMUCHIL											
CONTRATO:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025											
ESTIMACION 2 FINIQUITO													
AGPRC	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE; TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L IZQUIERDO	M3	4.85	0.75	0.60	2.00	4.37	10.72		
		COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L DERECHO		4.70	0.75	0.60	3.00	6.35			
AGP7	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE; CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L IZQUIERDO	M3	4.85	0.75	0.55	2.00	4.00	10.24		
		COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L DERECHO		4.70	0.75	0.55	2.00	3.88			
				ABUNDAMIENTO 30%									
02322401	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L IZQUIERDO	ML	4.85			2.00	9.70	23.80		
		COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L DERECHO		4.70			3.00	14.10			
02322025	SUMINISTRO INSTALACION DE YEE 8" X 6" DE PVC, INCLUYE; CODO DE 45 X 6" DE PVC.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L IZQUIERDO	PZA				2.00	2.00	5.00		
		COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L DERECHO					3.00	3.00			
RAN001	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 M, DE CLARO LIBRE DE 1.2 M, DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 T.M A 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM, VARILLA DE 3/8" @ 15 CM, INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L IZQUIERDO	PZA				2.00	2.00	3.00		
		COSTITUCION	DEL OBRERO	PATRIOTIS MO L DERECHO					1.00	1.00			

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

ING. OSCAR DAUTT LEYVA



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



Cerca al Pueblo

OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.										PERIODO DE EJECUCION		20/10/2025 AL 28/11/2025						
LUGAR:	GUAMUCHIL																		
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025																		
ESTIMACION 2 FINIQUITO																			
B	EXTRAORDINARIOS																		
DESMONTE	DESMONTE CON EQUIPO MECANICO Y LIMPIEZA DEL AREA										CALLE PATRIOTIS MO	M2	15.00	8.00				120.00	120.00
EXT002	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO CON MALLALACC DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										CASA PORTON CAFE	M2	1.00	1.30				1.30	3.25
											CASA AZUL		1.50	1.30			1.95		
EXT011	BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE; CIMBRADO, ARMADO, COLADO, ACABADO SEGUN EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										CASA PORTON CAFE	M2	1.00	1.30			1.30	2.30	
											CASA # 0		1.00	1.00			1.00		
EXT006	CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA MEDIANTE REDUCCION PVC. DE 6" A 4" Y COPLER DE 6" SANITARIO. INCLUYE; MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										L DERECHO	PZA				6.00	6.00	7.00	
											L IZQUIERDO					1.00	1.00		



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN

FECHA 04-dic-25



Cerca al Pueblo

ESTIMACIONES DE OBRA

ESTIMACION 2 FINIQUITO

PERIODO DE EJECUCION 20/10/2025 AL 28/11/2025

IMPORTE CON IVA.- \$97,121.08

IMPORTE.- \$83,725.07

IVA 16%.- \$13,396.01

LUGAR: GUAMUCHIL

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO No.: JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025

MONTO CIVA: \$571,279.68

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD DE OBRA				\$			
		UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO								\$83,725.07
A12	EXCAVACIONES								\$83,725.07
AGP1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	162.95	233.10	183.10	70.2	50.00	\$14.94	\$747.00
AGP2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCETO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA.	M3	183.05	274.80	233.55	91.75	41.25	\$95.55	\$3,941.44
AGP4	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MODULO COLOCADO	M3	10.02	17.16	13.41	7.14	3.75	\$552.63	\$2,072.36
AGP5	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO) TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	45.42	78.65	61.45	33.23	17.20	\$561.19	\$9,652.47

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

[Signature]
GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 1



ESTIMACIONES DE OBRA



PERIODO DE EJECUCION

20/10/2025 AL 28/11/2025

CONTRATISTA:

MAYO DE LA CIUDAD DE

MONTO C/IVA:

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

--	--

U C C C C	2
-----------------------	---

MIL

--	--

--	--

100

M3	131.84
----	--------

--	--

--	--

M3	8.53
----	------

--	--

--	--

M3	36.2
----	------

M3	84.71
----	-------

100

--	--

✓

[Signature]

Signature

SUPERVISOR
ING OSCAR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO




Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			Cerca del Pueblo		FECHA		04-dic-25																			
BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN			ESTIMACIONES DE OBRA																										
ESTIMACION 2 FINIQUITO			PERIODO DE EJECUCION			20/10/2025 AL 28/11/2025			IMPORTE.-		\$83,725.07		IVA 16%.-		\$13,396.01														
LUGAR:			GUAMUCHIL			CONTRATISTA:			CONTRATO No.:			IMPORTE CON IVA.-			\$97,121.08														
OBRA:			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.			MONTO C/IVA:						\$571,279.68			JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ														
AGP7			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.			M3			62.26			58.51			48.27			0.00			10.24			\$118.47			\$1,213.13		
02322401			SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA.			ML			131.25			113.80			90.00			0.00			23.80			\$198.36			\$4,720.97		
02322025			SUMINISTRO INSTALACION DE YEE 8" X 6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45 X 6" DE PVC.			PZA			25.00			23.00			18.00			0.00			5.00			\$1,008.60			\$5,043.00		
RAN001			REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 M, DE CLARO LIBRE DE 1.2 M, DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR, MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM, VARILLA DE 3/8" @ 15 CM, INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA			25.00			16.00			13.00			0.00			3.00			\$5,266.66			\$15,799.98		
B			EXTRAORDINARIOS																								\$7,532.48		
DESMONTE			DESMONTE CON EQUIPO MECANICO Y LIMPIEZA DEL AREA			M2			0.00			120.00			0.00			0.00			120.00			24.58			2949.60		
EXT002			DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO CON MALLALACC DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2			0.00			3.25			0.00			0.00			3.25			194.68			632.71		
EXT011			BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, ACABADO SEGUN EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			M2			0.00			2.30			0.00			0.00			2.30			804.42			1850.17		
EXT006			CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA MEDIANTE REDUCCION PVC, DE 6" A 4" Y COPLÉ DE 6" SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			PZA			0.00			7.00			0.00			0.00			7.00			300.00			2100.00		

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

Ing. Oscar Dautt Leyva
SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

Lic. Maria Isaura Bejarano Lugo
GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
PAGINA 4


		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN		 	
CONTRATISTA		JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ		CONTRATO	
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025		PLAZO EJECUCION		20/10/2025 AL 28/11/2025	
REPORTE FOTOGRAFICO					

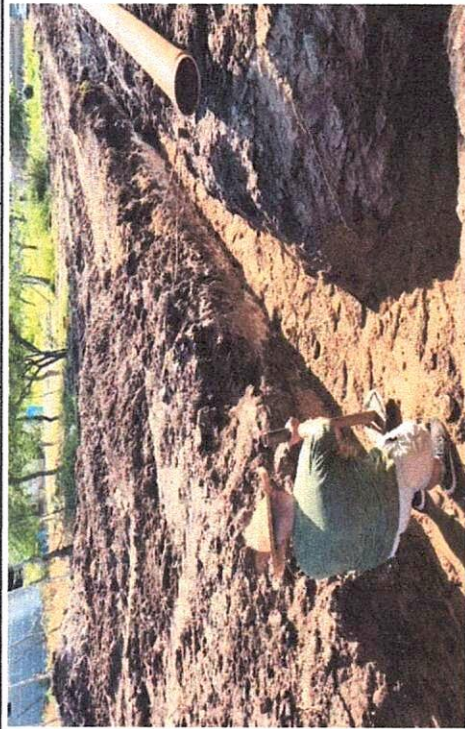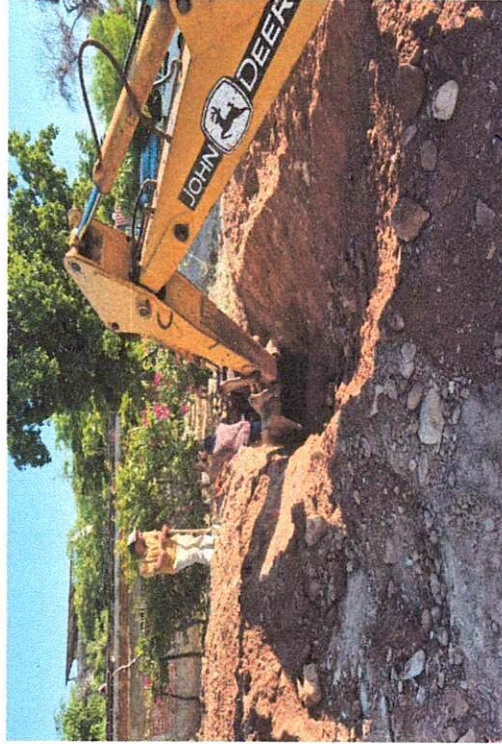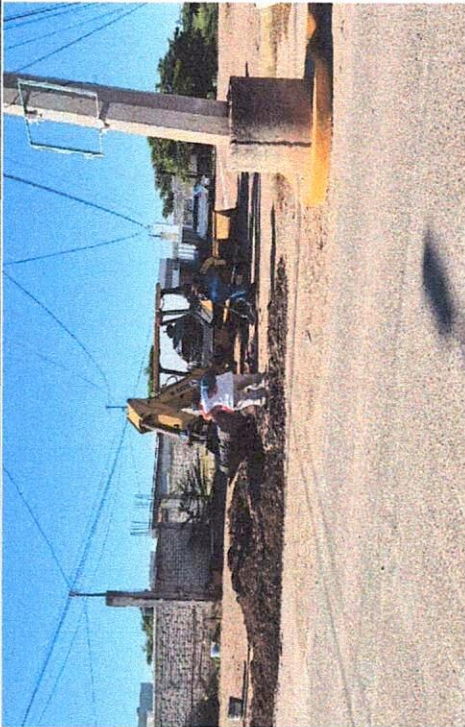

[Signature]

CB

	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN			 
REPORTES FOTOGRAFICOS				
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	CONTRATO	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025	PLAZO EJECUCION 20/10/2025 AL 28/11/2025

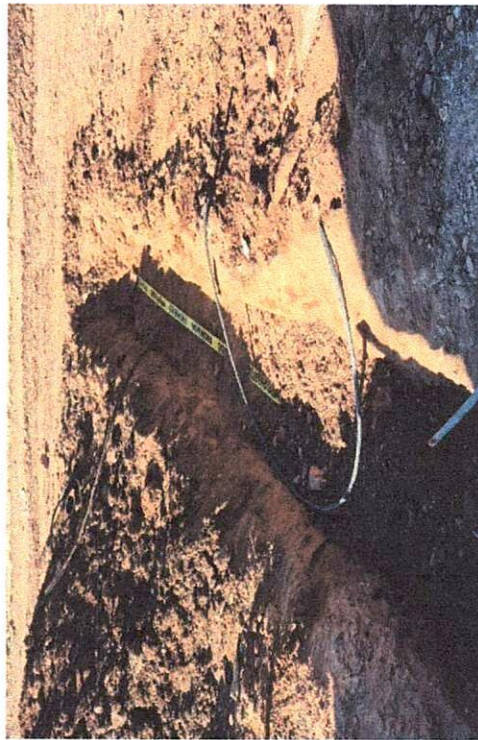


Antony...

Página 2

...

CA

	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN			 Cerceda - Pueblo
REPORTE FOTOGRAFICO				
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	CONTRATO	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025	PLAZO EJECUCION 20/10/2025 AL 28/11/2025

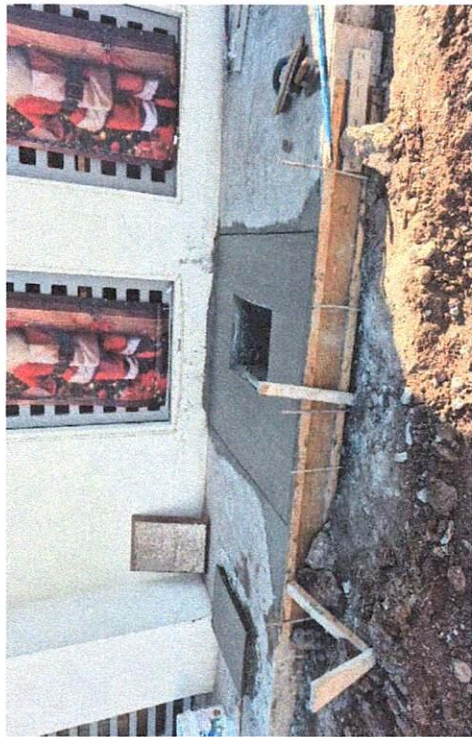

CH



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES





HOJA 1

DE 1

ESTIMACION 1 NORMAL		IMPORTE:-		\$ 408,757.41		IVA 16%.-		\$ 65,401.19	
PERIODO DE EJECUCION		20/10/2025 AL 28/11/2025		IMPORTE CON IVA.-		\$474,158.60			
LUGAR:	GUAMUCHIL	CONTRATISTA:	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ						
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	CONTRATO No.:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025						
		MONTO C/IVA:	\$571,279.68						

ESTADO CONTABLE				
CONCEPTO ESTADO DE CUENTA				
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO	RETENCIONES	IMPORTE
MONTO CONTRATO S/IVA	\$492,482.48	\$492,482.48	MONTO ANTICIPO S/IVA	\$246,241.24
ESTIMACION 1 NORMAL	\$408,757.41	\$83,725.07	ESTIMACION 1 NORMAL	\$246,241.24
				\$0.00
				\$246,241.24
				\$408,757.41
				\$246,241.24
				\$162,516.17
				\$26,002.59
				\$188,518.76
				\$12,262.72
				\$176,256.04

CONTRATISTA JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ 	 SUPERVISOR DE OBRAS ING. OSCAR DAUTT LEYVA	 GERENTE GENERAL LIC. MARIA ISAURA BENAVENTE LUGO
--	---	--

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION 1 NORMAL

PERIODO DE EJECUCION

20/10/2025 AL 28/11/2025

LUGAR:

GUAMUCHIL

OBRA:

REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

IMPORTE:-

\$ 408,757.41

IVA 16%.-

\$ 65,401.19

IMPORTE CON IVA.-

\$474,158.60

CONTRATISTA:

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

CONTRATO No.:

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025

MONTO C/IVA:

\$571,279.68

HOJA

1

DE

1

RESUMEN DE ESTIMACION	
PARTIDAS	
A12 EXCAVACIONES	\$117,324.55
A13 TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO	\$49,870.19
A14 DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$151,983.42
A15 POZOS DE VISITA	\$89,579.25
TOTAL ESTIMACION	
\$408,757.41	
CONTRATISTA	
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ING. OSCAR DAUTT LEYVA	
GERENTE GENERAL	
LIC. MARIA ISABELA BEJARANO LUGO	



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025
LUGAR:	GUAMUCHIL			
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025			
ESTIMACION 1 NORMAL			FECHA:	15/11/2025


COD.	CONCEPTO	LOCALIZACION			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	TIPO						PARCIAL	TOTAL	
A	ALCANTARILLADO SANITARIO											
A12	EXCAVACIONES											
AGP1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	ML	1.00				1.00	183.10	
		POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		27.80				27.80		
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO		74.90				74.90		
		POZO 3	POZO 4	CALLE PATRIOTIS MO		15.90				15.90		
		POZO 4	POZO 5	CALLE PATRIOTIS MO		63.50				63.50		
AGP2	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACITORIA DE TUBERIA MEDIDO EN ZANJA	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	M3	1.00	0.75	1.00		0.75	233.55	
			POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO		2.00	2.00	1.55		6.20		
		POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		26.90	0.75	1.50		30.26		
			POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		2.00	2.00	1.55		6.20		
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO		74.00	0.75	1.50		83.25		

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISAUARA BEJARANO LUGO

PAGINA 1



NUMEROS GENERADORES



GERENTE GENERAL
IRA BEJARANO LUGO
PAGINA 2

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 2



OBRA:		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.										PERIODO DE EJECUCION		20/10/2025 AL 28/11/2025			
LUGAR:		GUAMUCHIL															
CONTRATO:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025												FECHA:		15/11/2025	
ESTIMACION 1 NORMAL																	
AGP5	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO	M3	1.00	0.75	0.50			0.38	61.45	MENOS VOL. TUBO			
												10.09					
												27.75					
												5.63					
												23.14					
AGPRC	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, CON MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO	M3	1.00	0.75	0.40			0.30	120.19				
												18.16					
												49.95					
												10.13					
												41.65					

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 3



OBRA:		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.				PERIODO DE EJECUCION				20/10/2025 AL 28/11/2025						
LUGAR:		GUAMUCHIL														
CONTRATO:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025														
ESTIMACION 1 NORMAL						FECHA:		15/11/2025								
AGP7	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, INCLUDE, CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.					CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	M3	1.00	0.75	0.60		0.45	128.95	MENOS VOL DE POZO1 3.246 M3
							POZO 1			2.00	2.00	1.55		3.246		
						POZO 1		CALLE PATRIOTIS MO		26.90	0.75	0.60		12.11		
							POZO 2			2.00	2.00	1.55		3.246		MENOS VOL DE POZO2 3.246 M3
						POZO 2		CALLE PATRIOTIS MO		74.00	0.75	0.60		33.30		
							POZO 3			2.00	2.00	1.55		3.246		MENOS VOL DE POZO3 3.246 M3
						POZO 3		CALLE PATRIOTIS MO		15.00	0.75	0.60		6.75		
							POZO4			2.00	2.00	1.55		3.246		MENOS VOL DE POZO4 3.246 M3
						POZO 4		CALLE PATRIOTIS MO		61.70	0.75	0.60		27.77		
							POZO5		ABUNDAMIENTO 30%		2.00	2.00	2.05	4.29		VOL DE POZO5 4.29M3
*TEMP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION". LA CUAL SE COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA A LA ALTURA DEL RELLENO COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.					CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	ML	1.00				1.00	178.60	
						POZO 1		CALLE PATRIOTIS MO		26.90				26.90		
						POZO 2		CALLE PATRIOTIS MO		74.00				74.00		
						POZO 3		CALLE PATRIOTIS MO		15.00				15.00		
						POZO 4		CALLE PATRIOTIS MO		61.70				61.70		

SUPERVISOR DE OBRAS
ING OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

GERENTE GENERAL
L/C. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 4



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES




OBRA:		PERIODO DE EJECUCION										FECHA:	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA. <td colspan="10">20/10/2025 AL 28/11/2025</td> <td colspan="2">15/11/2025</td>		20/10/2025 AL 28/11/2025										15/11/2025	
LUGAR:		GUAMUCHIL											
CONTRATO:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025											
ESTIMACION 1 NORMAL													
AFINE	AFINE Y CONFORMACION DE CALLES, A TODO LO LARGO Y ANCHO DE LAS MISMAS DEJANDO BOMBEO Y CUNETAS, INCLUYE: EL EQUIPO MECANICO NECESARIO.	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	M2	1.00	7.00			7.00	1,513.9000		
		POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		27.80	8.50			236.30			
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO		74.90	7.00			524.30			
		POZO 3	POZO4	CALLE PATRIOTIS MO		15.90	7.00			111.30			
		POZO 4	POZO5	CALLE PATRIOTIS MO		63.50	10.00			635.00			
A13	TUBERIA DE PVC												
TB08	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 MM (8") DE DIAMETRO, CON JUNTA HERMETICA.	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	ML	1.30				1.30	181.30		
		POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		27.50				27.50			
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO		74.60				74.60			
		POZO 3	POZO4	CALLE PATRIOTIS MO		15.60				15.60			
		POZO 4	POZO5	CALLE PATRIOTIS MO		62.30				62.30			
ITB08	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 MM (8") DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBA DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	CALLE DEL OBRERO	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	ML	1.30				1.30	181.30		
		POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO		27.50				27.50			
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO		74.60				74.60			
		POZO 3	POZO4	CALLE PATRIOTIS MO		15.60				15.60			
		POZO 4	POZO5	CALLE PATRIOTIS MO		62.30				62.30			

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISAUARA BEJARANO LUGO
PAGINA 5




JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



ENTE GENERAL
EJARAN LUGO
(PAGINA 6

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ



JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES




Cerca del Pueblo

[illegible]

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 7



2010/2025 AL 28/11/2025

GUAMUCHIL

JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025

ORMAL

FECHA:

15/11/2025

ABUNDAMIENTO 30%

姓

Thick black

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISAURA BEJARANO LUGO
PAGINA 8

PAGINA 8



Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025
LUGAR:	GUAMUCHIL			
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025			
ESTIMACION 1 NORMAL			FECHA:	15/11/2025

		POZO 1	POZO 2	POZO 3	POZO 4	CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO	ML	5.00			3.00	15.00	90.00	
02322025	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA, INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA	POZO 2	POZO 3			CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO		5.00			6.00	30.00		
						CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO		5.00			7.00	35.00		
		POZO 3	POZO 4			CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO		5.00			1.00	5.00		
						CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO		5.00			1.00	5.00		
						CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO								
02322401	SUMINISTRO INSTALACION DE YEE 8" X 6" DE PVC. INCLUYE: CODO DE 45 X 6" DE PVC.	POZO 1	POZO 2			CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO	PZA				3.00	3.00	18.00	
			POZO 3			CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO					6.00	6.00		
						CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO					7.00	7.00		
		POZO 3	POZO 4			CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO					1.00	1.00		
						CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERO					1.00	1.00		

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO



JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCION		20/10/2025 AL 28/11/2025	
OBRA:		GUAMUCHIL		FECHA:		15/11/2025	
LUGAR:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025					
CONTRATO:		ESTIMACION 1 NORMAL					
RAN001	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40 X 0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.2 M. DE PROFUNDIDAD FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOGIDO 7X14X28 CM. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE 8 CM DE ESPESOR. MARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4". CONTRAMARCO DE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4". TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CM. VARILLA DE 3/8" @ 15 CM. INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO -ARENA PROPORCION 1:3. EXCAVACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	POZO 1	POZO 2	CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERDO	PZA		
		POZO 2	POZO 3	CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERDO			
				CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERDO			
		POZO 3	POZO 4	CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERDO			
				CALLE PATRIOTISMO O LIZQUIERDO			
A15	POZOS DE VISITA						
TEMP22	CONSTRUCCION Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VICITA. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 3/4". ARMADOS CON 3 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" DE DIAMETRO A CADA 15CMS Y TAPA DE VARILLA DE 3/8 DE DIAMETRO A CADA 30CM EN AMBOS SENTIDOS.			CALLE PATRIOTISMO	PZA	5.00	5.00

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

LIC. MARIA ISAURO BEJARANO LUGO
GERENTE GENERAL
PAGINA 10



JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
NUMEROS GENERADORES



OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		PERIODO DE EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025
LUGAR:	GUAMUCHIL			
CONTRATO:	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025			
ESTIMACION 1 NORMAL				
			FECHA:	15/11/2025

3400258	POZO DE VISITA TIPO COMUN 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM. APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMARENA 1:3. ACABADO PULIDO. ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM. INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	POZO 1	CALLE PATRIOTIS MO	PZA					1.00	1.00	4.00	
		POZO 2	CALLE PATRIOTIS MO						1.00	1.00		
		POZO 3	CALLE PATRIOTIS MO						1.00	1.00		
		POZO 4	CALLE PATRIOTIS MO						1.00	1.00		
PZO200	POZO DE VISITA TIPO COMUN 2.00 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM. DE APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO PULIDO. ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM. INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2.	POZO 5	CALLE PATRIOTIS MO	PZA					1.00	1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

CONTRATISTA
JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 11

ESTIMACION 1 NORMAL				20/10/2025 AL 28/11/2025		IMPORTE.-	\$408,757.41	IVA 16%.-	\$65,401.19
PERIODO DE EJECUCION						IMPORTE CON IVA.- \$474,158.60			
LUGAR:	GUAMUCHIL			CONTRATISTA:		JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ			
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.			CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025			
				MONTO CIIVA:		\$571,279.68			
CLAVE		CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	\$
									IMPORTE
A		ALCANTARILLADO SANITARIO							\$408,757.41
A12		EXCAVACIONES							\$408,757.41
AGP1		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	162.95	183.10	0.00	20.2	183.10	\$14.94
									\$2,735.51
AGP2		EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCETO ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE; AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALCOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE TUBERIA. MEDIDO EN ZANJA.	M3	183.05	233.55	0.00	50.50	233.55	\$95.55
									\$22,315.70
AGP4		PLANTILLA APIONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE; CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MODICO COLOCADO	M3	10.02	13.41	0.00	3.39	13.41	\$552.63
									\$7,410.77
AGP5		RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO) TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.	M3	45.42	61.45	0.00	16.03	61.45	\$561.19
									\$34,485.13

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ


SUPERVISOR DE OBRAS

ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL

LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO

PAGINA 1



BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN
ESTIMACIONES DE OBRA

Cerca del Pueblo



15-nov-25


 DIRECTOR GENERAL
 ARANO LUGO
 PAGINA 3

ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA

GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 3

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				FECHA		15-nov-25	
		BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN							
		ESTIMACIONES DE OBRA							
ESTIMACION 1 NORMAL				20/10/2025 AL 28/11/2025		IMPORTE.-		\$408,757.41	
		PERIODO DE EJECUCION				IMPORTE CON IVA.-		\$474,158.60	
LUGAR:	GUAMUCHIL	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PATRIOTISMO		CONTRATISTA:		JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ			
OBRA:		ENTRE AV. DEL OBRERO Y ARROYO EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE		CONTRATO No.:		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025			
		GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.		MONTO C/IVA:		\$571,279.68			
3400258		POZO DE VISITA TIPO COMUN 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM, APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMARENA 1:3, ACABADO PULIDO, ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM, INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO FC=100 KG/CM2	PZA	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	\$13,604.62
									\$54,418.48
PZO200		POZO DE VISITA TIPO COMUN 2.00 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE DE 28 CM, DE APLANADO INTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, ESCALONES DE VARILLA CORRUGADA DE 1" DE DIAMETRO A CADA 40 CM, INCLUYE: MEDIA CAÑA DE PEDACERIA DE TABIQUE Y BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y PLANTILLA DE DESPLANTE DE 5 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO FC=100 KG/CM2.	PZA	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$20,676.57
									\$20,676.57

CONTRATISTA
ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ
CA

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. OSCAR DAUTT LEYVA
Oscar Dautt Leyva




[Signature]
GERENTE GENERAL
LIC. MARIA ISaura BEJARANO LUGO
PAGINA 5

LABORATORIO DE CONCRETOS, SUELOS Y ASFALTOS
CONTROL DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCION EN PAVIMENTACION Y OBRAS CIVILES

TELEFONO: 687-87-1-10-51

	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN	 
CONTRATISTA	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	CONTRATO
JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025	PLAZO EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025

REPORTE FOTOGRAFICO

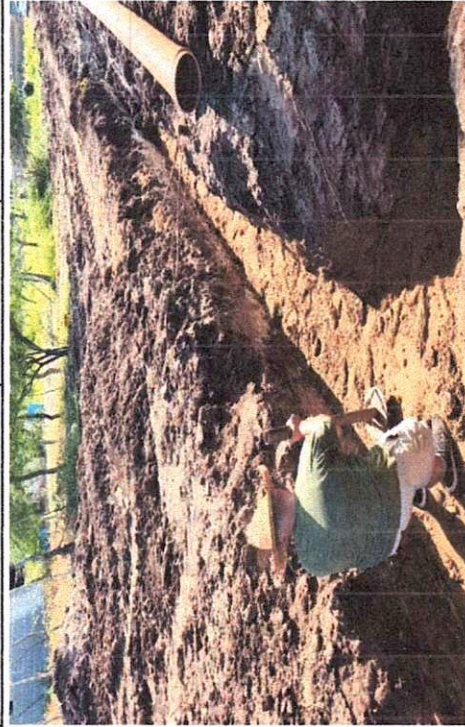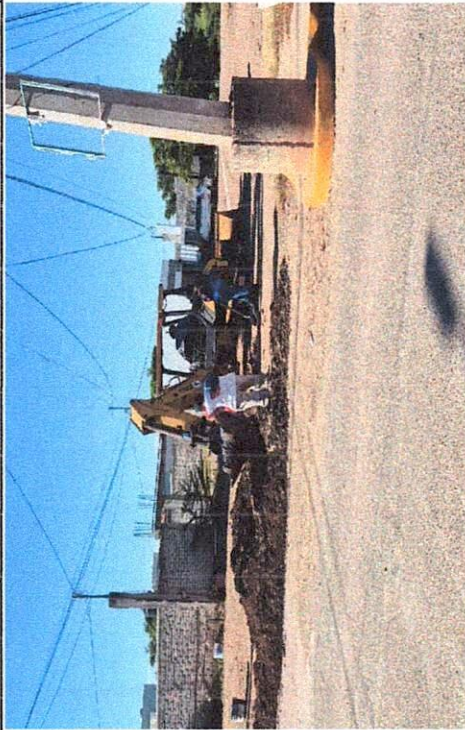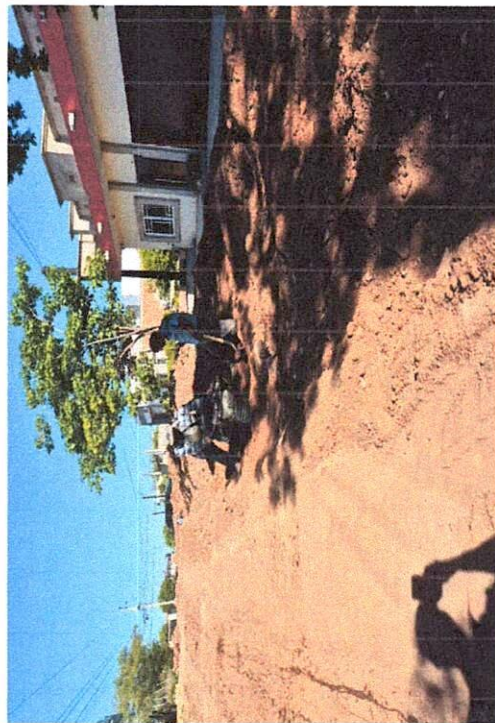

CAE






Junta Municipal
de Agua Potable
y Alcantarillado de
Salvador Alvarado

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN
REPORTE FOTOGRAFICO




Cerca-Pueblo

CONTRATISTA	JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ	CONTRATO	JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025	PLAZO EJECUCION	20/10/2025 AL 28/11/2025
-------------	--------------------------	----------	--------------------------------	-----------------	--------------------------

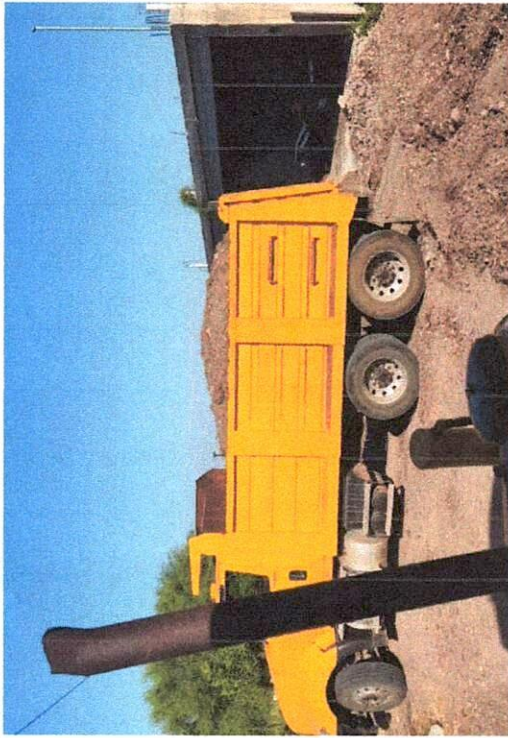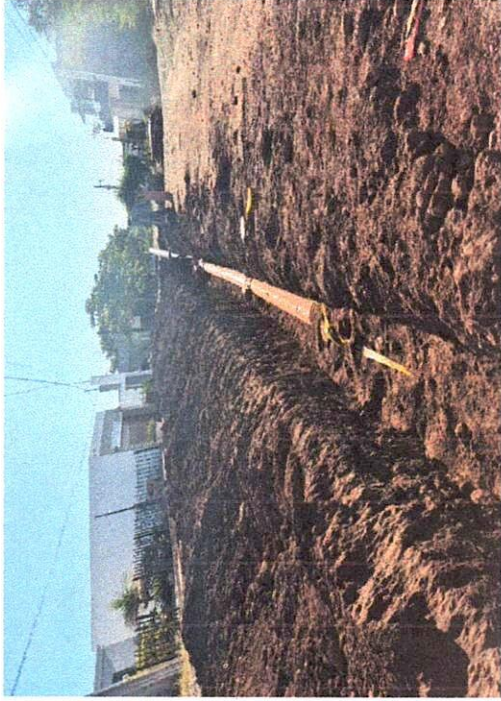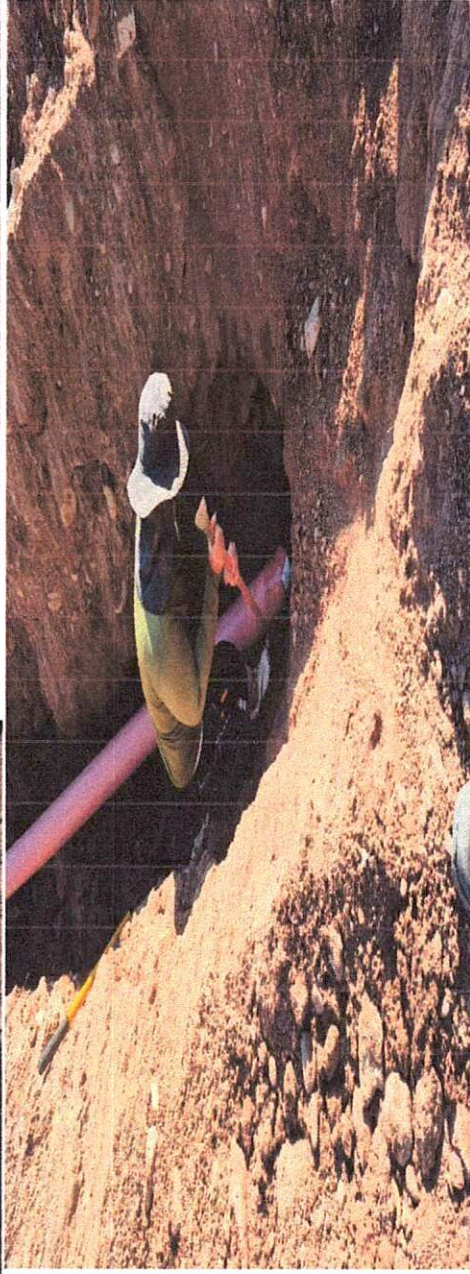

		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BLVD. ANTONIO ROSALES Y FCO. VILLA SIN COL. CENTRO, GUAMUCHIL, SIN		 	
REPORTE FOTOGRAFICO		JAPASA-MUNICIPIO-FISM-007-2025		PLAZO EJECUCION	
CONTRATISTA		JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ		20/10/2025 AL 28/11/2025	

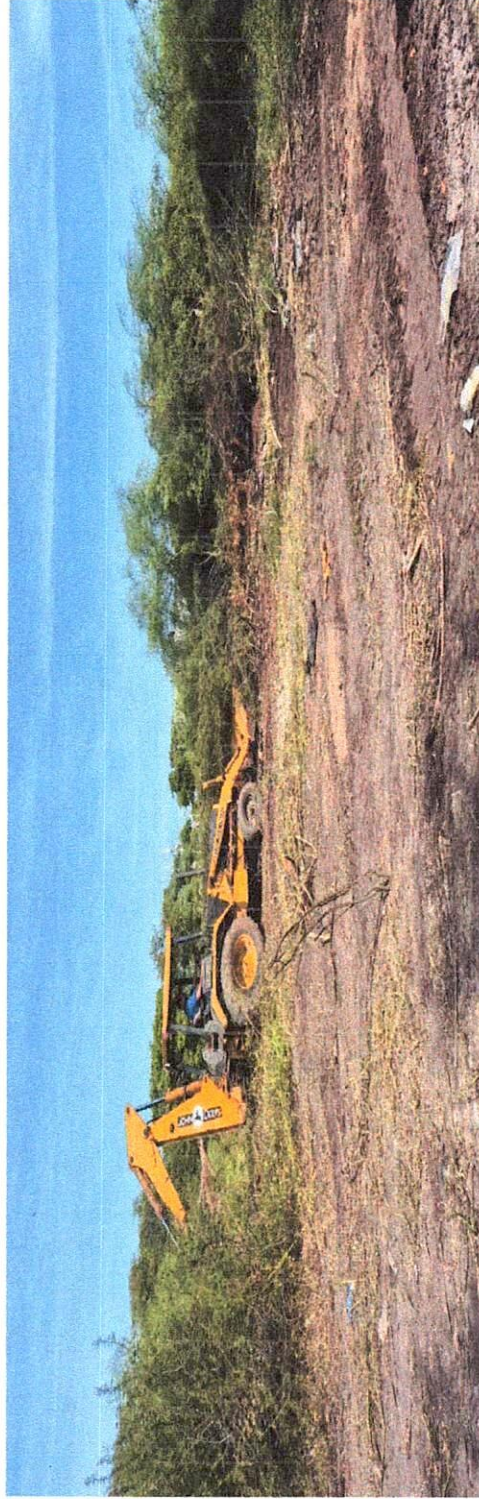

CB

Página 3
[Signature]

CROQUIS DE OBRA TERMINADA

H. AYUNTAMIENTO DE
SALVADOR ALVARADO
2024 - 2027



Logo of the Ayuntamiento de Salvador Alvarado

LIC. GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA ISABELA BEJARANO L.
GERENTE GENERAL APASA

NOMBRE DEL PROYECTO
CROQUIS DE OBRA TERMINADA

LOCALIZACIÓN

COL. 10 DE MAYO, SALVADOR
ALVARADO, SINALOA

LEGENDA

TUBERIA DE 8" DE
PROYECTO

POZO EXISTENTE

POZO DE
P PROYECTO

TUBERIA DE 8"
EXISTENTE

NUMERO DE POZO

PROYECTO
MUNICIPIO DE
SALVADOR ALVARADO

LEV. TOPOGRAFICO



FECHA

NOMBRE DEL PLANO
DRENAJE PATRIOTISMO


ESCALA
1 : 1,300

FECHA
DICIEMBRE D.E. 2025

PROYECTO
H. AYUNTAMIENTO DE
SALVADOR ALVARADO

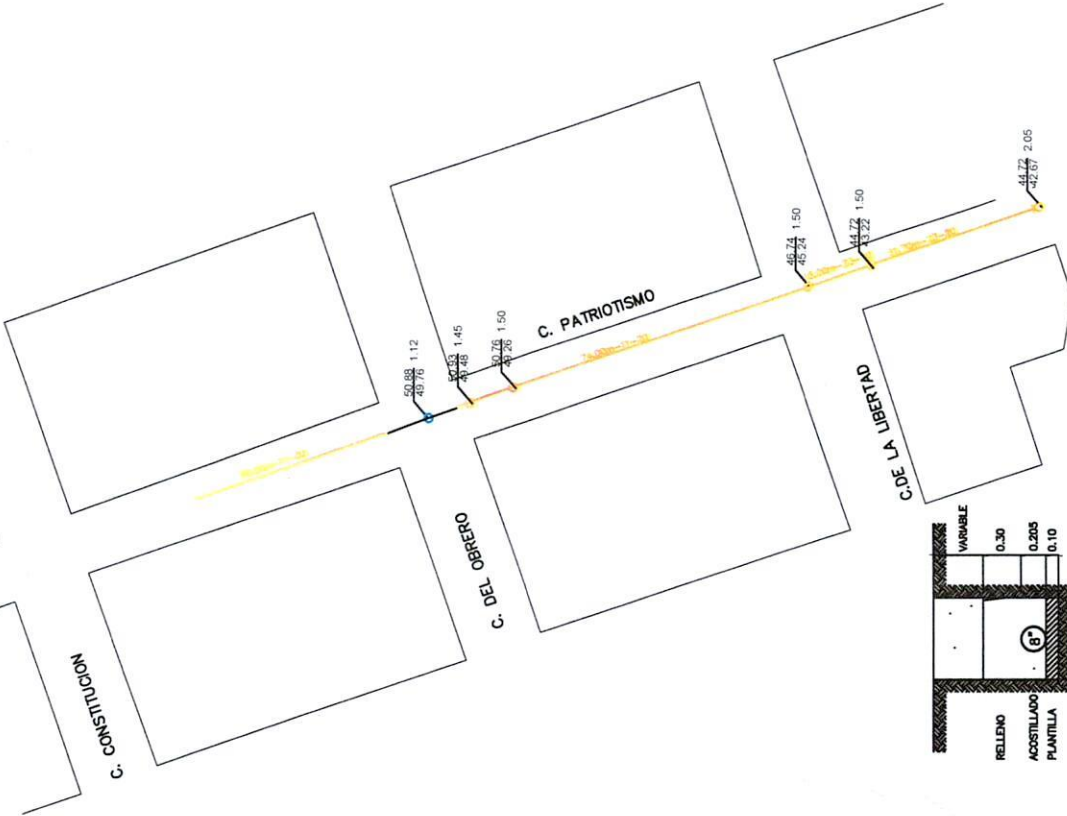

DETALLE DE TUBERIA
SIN ESCALA



POZO DE VISTA "COMUN"
SIN ESCALA

CANTIDAD DE TUBERIA
TUBERIA DE 8" DE PVC PARA
ALCANTARILLADO SERIE 20 228.30 ML.

ARROYO

Handwritten signature

CROQUIS DE OBRA TERMINADA

H. AYUNTAMIENTO DE
SALVADOR ALVARADO
2024 - 2027



JIC. GUADALUPE LÓPEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA ISAURA BEJARANO L.
GERENTE GENERAL JAPASA

PROYECTO
CROQUIS DE OBRA TERMINADA

LOCALIZACIÓN

COL. 10 DE MAYO, SALVADOR
ALVARADO, SINALOA

LEGENDA

TUBERIA DE 8" DE
PROYECTO

POZO EXISTENTE

POZO DE
PROYECTO

TUBERIA DE 8"
EXISTENTE

NÚMERO DE POZO

PROYECTO
MUNICIPIO DE
SALVADOR ALVARADO

LEV. TOPOGRAFICO

CLAVE


PROYECTO DEL PAIS

DRENAJE PATRIOTISMO


ESCALA

DICIEMBRE D.E. 2025

H. AYUNTAMIENTO DE
SALVADOR ALVARADO

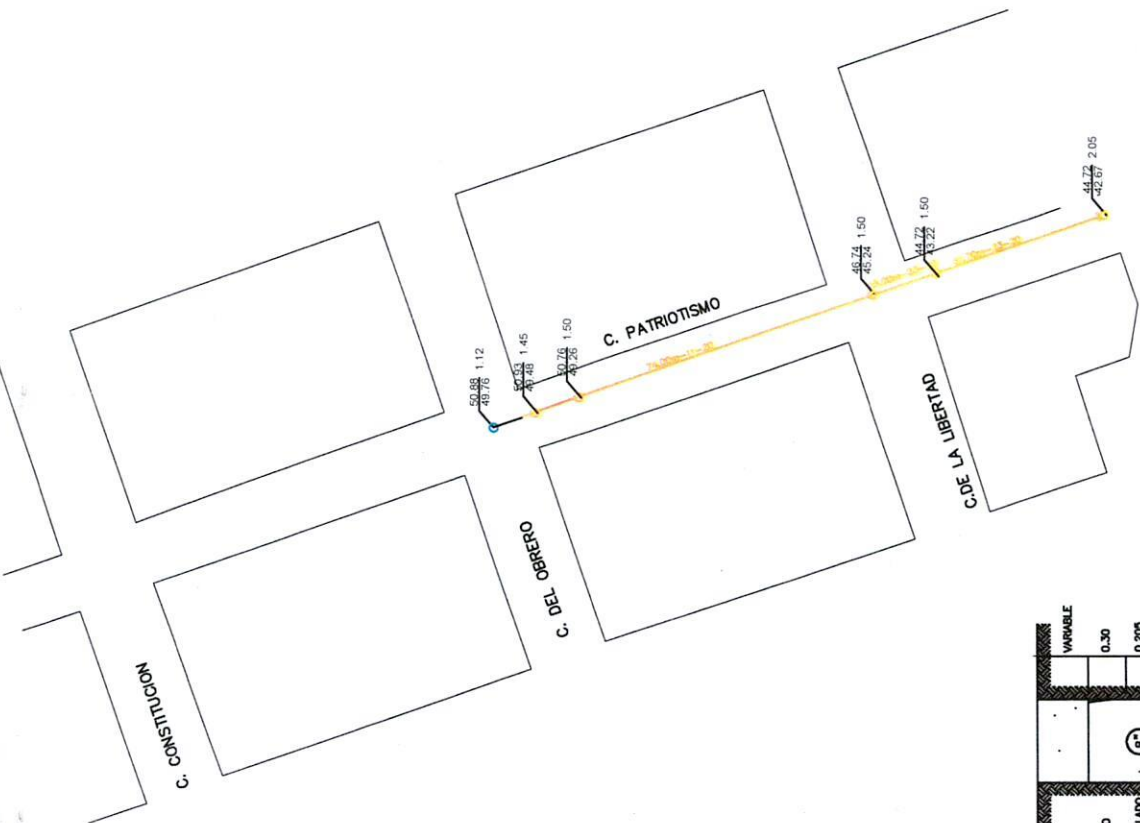

CANTIDAD DE TUBERIA	
TUBERIA DE 8" DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 20	228.30 ML.



POZO DE VISTA PARA PROFUNDIDAD
DE 1.50 A 2.60 MTS.

POZO DE VISTA "COMUN"

DETALLE DE TUBERIA

SIN ESCALA

ARROJO

Handwritten signature

Handwritten initials
