



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/819/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO

Badiraguato, Sin., a 26 de diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO** DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **DAVID GARCIA CARRANZA**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO, A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$1,259,448.54 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL FINIQUITO
- **IMPORTE A PAGAR:** \$551,754.50 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** DAVID GARCÍA CARRANZA
- **R.F.C.** GACD8102079HA
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE CONSTITUYENTE J. NATIVIDAD MACIAS SUR, No. 2624, ENTRE AV. ENRIQUE RECIO Y CALLE INDEPENDENCIA, COL AQUILES SERDAN, C.P.80190
- **No. DE FACTURA:** #9A22, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
BADIRAGUATO, SINALOA
C.c.p. El Archivo.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

26 DIC 2025

06:21 PM

RECIBIDO



DAVID GARCÍA CARRANZA

Emisor **CONSTRUCCIONES**

DAVID GARCIA CARRANZA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 2089

Fecha: 26/Dic/2025 16:59:19

Lugar de expedición (C.P.): 80190

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RFC: GACD8102079HA

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: CALLE CONSTITUYENTE J NATIVIDAD MACIAS 2624 Aquiles Serdán
Culiacán Sinaloa México 80190

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Gabriel Leyva Solano S/N Col. Centro Badiraguato, Sinaloa México 80500

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unidad S AT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITO</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,259,448.54</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 762,091.85 MAS I.V.A 16 % \$ 121,934.70 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 884,026.55</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 266,732.15 MAS I.V.A.: \$ 42,677.14 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 309,409.29</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 495,359.70 MAS I.V.A \$ 79,257.56 MONTO NETO A FACTURAR \$ 574,617.26</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 22,862.76 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 332,272.05</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 551,754.50</p>	\$495,359.70	IVA, - Importe: 79257.56	\$495,359.70

Total con letra:
quinientos setenta y cuatro mil seiscientos diecisiete Pesos 26/100 M.N.

Subtotal: \$495,359.70
I.E.P.S. \$0.00
IVA 16 %: \$79,257.56

Total: \$574,617.26



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000708061461
Folio Fiscal: CE8525FB-E394-4017-B7F4-59865DFA9A22
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-12-26T17:59:25

Sello del SAT

hs+VhXRgoWdbBoDI6dC/ohy1YF+BvBGonfX9OWVZVR4TLsOSIQ6saylj6yAT2wZzTRDqMcmHkq8XQKR7FtEJZqS/5matNMynTqCbsbJAIS5BS8ZL9J90vUNqws0Y8tuTw2q507sN0wpqv/O
falhEhxpJZin4EFfb8+Q5ly40aW0xSyEbH+clsYHD45r+HhIZE+J0V+Y6x0zJpPYCqfLZZKZv5lao/aNQIG4kRJS3746wJRvh5T9W432EPd+nycEM49VsS//2kLSChXby1WrlbAKA76U
p8YGfZdhxQz6FYTnCPtF0BtaRSC0wvIXJv7HIDHstidCnZqPa5qaOw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CE8525FB-E394-4017-B7F4-59865DFA9A22|2025-12-26T17:59:25|MAS0810247C0|W22amuVsVsJs86Wr7XruOxYURt3dYz/PbVmeZfQBd133w41O28evuXcoqCwMpNAXWd4
eHv9MS0uCh7H5vSjEwQcWkR0QhLZLRDNktPiOxWihz6HScWeZIGHyLjaI/GIAIMGiDVGd4323duaeRtZkuQeyJwHf0f5Cpaq+vS3BzgRcl3emFvnowr+QAac7VlmmnUmd6HbuhRYw2hJSBuZ
74c3XimnsIJ/VVcGIY3FyZC76/Ciigst1Vh5ZTA3F1pfWW9lr2P9LxnAa5R5sKm7/S4VlyvTG8q7VtEWroikyy6T3G7CVhc3sGhzHHEKa5CuCz5guwEtkd6Oze5zSNLmrBA==|00001000
000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIF+DCCA+CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA3MDgwNjE0NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQDDCxBQyBERUwUgU0VSVkLDSU8gREUGQRNSU5JU1RSQUNJT04gVFJ
Exportacion="01" Fecha="2025-12-26T16:59:19" Folio="2089" FormaPago="03" LugarExpedicion="80190" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000708061461"
Sello="W22amuVsVs3s86wr7XruOxYURt3dYz/PbVmeZfQbD133w41028evuXcoqCwMpNAXWd4eHV9MS0u7H5vSjEwQowkR0QhLZLrDNkltPiOxWihz6HScWeZlGHylJajGfAlMgIdtVGd4323d
SubTotal="495359.70" TipoDeComprobante="I" Total="574617.26" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="DAVID GARCIA CARRANZA" RegimenFiscal="612" Rfc="GACD8102079HA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL FINIQUITODE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHIA DE LA COMUNIDAD DE
LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-
015/2025MONTO DEL CONTRATO: $ 1,259,448.54IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 762,091.85MAS I.V.A 16 % $ 121,934.70TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA
CON IVA $ 884,026.55AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 266,732.15MAS I.V.A.: $ 42,677.14TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 309,409.29Importe TOTAL A
FACTURAR $ 495,359.70MAS I.V.A $ 79,257.56MONTO NETO A FACTURAR $ 574,617.26RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 22,862.76TOTAL DEDUCCIONES: $
332,272.05MONTO LIQUIDO A RECIBIR: $ 551,754.50" Importe="495359.70" NoIdentificacion="SER015" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO"
ValorUnitario="495359.7000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="495359.70" Importe="79257.56" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="79257.56">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="495359.70" Importe="79257.56" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="CE8525FB-E394-4017-B7F4-
59865DFA9A22" FechaTimbrado="2025-12-26T17:59:25" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="W22amuVsVs3s86wr7XruOxYURt3dYz/PbVmeZfQbD133w41028evuXcoqCwMpNAXWd4eHV9MS0u7H5vSjEwQowkR0QhLZLrDNkltPiOxWihz6HScWeZlGHylJajGfAlMgIdtV
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="hs+VhXRgoWdbBoDI6dC/ohy1Yf+BvBGcnfX9QWVZVR4TSL0S1Q6saylj6yAT2wZzTRDqMcmHkq8XQKR7FtEJzQ5/5matNMynTqCbsbJAIS5B58ZL9J90vUNqws0Y8tuTw2q507:
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GACD8102079HA	DAVID GARCIA CARRANZA	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CE8525FB-E394-4017-B7F4-59865DFA9A22	2025-12-26T16:59:19	2025-12-26T17:59:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$574,617.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Fecha: 20 de noviembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	DAVID GARCÍA CARRANZA	ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL FINIQUITO
DOMICILIO:	Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:	DEL	01-nov-25
6672-67-85-35	6672-67-85-35	AL	17-nov-25
R.F.C.		FECHA DE CONTRATO:	
GACD8102079HA			13-oct-25
DEPENDENCIA.-			

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
LA APOMA	BADIRAGUATO	INICIO: 14-oct-25
		TERMINACIÓN: 17-nov-25

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,085,731.50	\$1,259,448.54	\$440,806.99	\$1,259,448.54
		BUENO POR:	\$ 551,754.50

RECIBI:

\$ 551,754.50 (SON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL
FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 266,732.15	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 762,091.85
MAS I.V.A.:	\$ 42,677.14	MAS I.V.A 16 %	\$ 121,934.70
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 309,409.29	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 884,026.55
3 % SVIFYC:	\$ 22,862.76	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 332,272.05
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 332,272.05	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 574,617.26

SALDO A PAGAR: \$ 551,754.50

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING.JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZA

C. ING. RUBIEL RINCON RAMO
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y



DAVID GARCÍA CARRANZA

Dependencia :

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			Fecha:		Estimacion:		
			20 de noviembre de 2025		02 NORMAL FINIQUITO		
Periodo de la estimación:		01/11/2025	17/11/2025	Localidad:		No. De contrato:	
Periodo de Ejecución:		01/11/2025	17/11/2025	LA APOMA		MBGBR-AD-FAISMUN-015/2025	
Importe del contrato con I.V.A:		Imp. Contratado sin I.V.A		Anticipo		Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,259,448.54		\$ 1,085,731.50		\$ 440,806.99		\$ 380,006.03	70%
							% Avance Total
							100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion		Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$ 762,091.85	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+)	\$ 121,934.70	
\$ 309,409.29	Sub- Total A (=)	\$ 884,026.55	\$ 884,026.55
	Amortizacion Anticipo 35%	\$ 266,732.15	
	16 % I.V.A (+)	\$ 42,677.14	
AMORTIZACION ANTERIOR	Total (=)	\$ 309,409.29	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 131,397.70			\$ 375,421.99
	Importe TOTAL A FACTURAR	\$ 495,359.70	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+)	\$ 79,257.56	TOTAL ACUMULADO.
\$ 440,806.99	Total (=)	\$ 574,617.26	\$ 1,259,448.54
	3 % SVIFYC:	\$ 22,862.76	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$ 332,272.05	CONTRATADO
\$ 440,806.99			\$ 1,259,448.54
	Importe T O T A L	\$ 551,754.50	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	\$ 551,754.50	SALDO
\$0.00	Son:		\$ -
	(SON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)		

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

ELABORO:-

David Garcia Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR: ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO:-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
DAVID GARCÍA CARRANZA		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
DOMICILIO:	Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle		
R.F.C.	GACD8102079HA		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	LA APOMA	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL FINQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,085,731.50
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 440,806.99
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,259,448.54

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 623,721.69
3	INSTALACIONES BASICAS	\$ 127,755.78
4	OTROS	\$ 10,614.38
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 762,091.85

SUB TOTAL=	\$ 762,091.85
I.V.A AL 16 %	\$ 121,934.70
TOTAL =	\$ 884,026.55

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA:		DAVID GARCÍA CARRANZA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		jueves, 20 de noviembre de 2025			
DOMICILIO:		Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Reco y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190						R.F.C.		GACD8102079HA		1 de 3	
DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN													
		LOCALIDAD:		LA APOMA		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO					
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,085,731.50		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$440,806.99		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,259,448.54			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO P.U.	TOTAL	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
1	PRELIMINARES												
2	ESTRUCTURA				\$								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	81.42	\$ 831.01	\$ 67,660.83	81.42		0.00	81.42	\$ 67,660.83			
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	12.00	\$ 705.69	\$ 8,468.28	12.00		0.00	12.00	\$ 8,468.28			
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM². INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	M2	478.71	\$ 943.85	\$ 451,830.43	478.71		0.00	478.71	\$ 451,830.43			
GP133	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	202.86	\$ 32.67	\$ 6,627.44	202.86		0.00	202.86	\$ 6,627.44			
GP13	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	212.22	\$ 41.80	\$ 8,870.80	212.22		0.00	212.22	\$ 8,870.80			
GP15	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON BLANCO. CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	62.00	\$ 77.12	\$ 4,781.44	62.00		0.00	62.00	\$ 4,781.44			
GP11	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	81.42	\$ 98.26	\$ 8,000.33	81.42		0.00	81.42	\$ 8,000.33			
GP26	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE.	M3	22.52	\$ 160.09	\$ 3,605.23	22.52		0.00	22.52	\$ 3,605.23			
GP10	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	90.08	\$ 554.86	\$ 49,981.79	90.08		0.00	90.08	\$ 49,981.79			
GBR16	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,151.62	\$ 3,151.62	1.00		0.00	1.00	\$ 3,151.62			

ELABORÓ:

 C. DAVID GARCÍA CARRANZA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

 ING. JOSÉ RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS


AUTORIZO

 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DESGLOSE

<div>DAVID GARCÍA CARRANZA</div>		DAVID GARCÍA CARRANZA		DEPENDENCIA:		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO		FECHA		jueves, 20 de noviembre de 2025	
DOMICILIO:		Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190				R.F.C.		GACD8102079HA		2 de 3	
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN											
		LOCALIDAD:		LA APOMA		ESTIMACIÓN:		02 NORMAL FINIQUITO			
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,085,731.50		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$440,806.99		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,259,448.54			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
				P.U.	TOTAL						
GGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 6,768.67	\$ 6,768.67	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	6,768.67
GGR17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 3,974.83	\$ 3,974.83	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	3,974.83
3	INSTALACIONES BASICAS										
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	74.29	\$ 220.92	\$ 16,412.15	74.29	0.00	0.00	74.29	\$	16,412.15
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG. 600 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	75.79	\$ 272.38	\$ 20,643.68	75.79	0.00	0.00	75.79	\$	20,643.68
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 2,069.42	\$ 2,069.42	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	2,069.42
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3. FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM. PROTECCION IP66/IK08. CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 40W.	PZA	3.00	\$ 25,738.42	\$ 77,215.26	3.00	0.00	0.00	3.00	\$	77,215.26
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X18". CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X1 1/2"X18".	PZA	3.00	\$ 2,797.39	\$ 8,392.17	3.00	0.00	0.00	3.00	\$	8,392.17
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 3,023.10	\$ 3,023.10	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	3,023.10
4	OTROS										
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO. INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2.	PZA	1.00	\$ 4,910.40	\$ 4,910.40	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	4,910.40

ELABORÓ: 
 C.DAVID GARCÍA CARRANZA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ: 
 ING. JOSÉ RODOLFO CONTRERAS LÓPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO: 
 C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:			DEPENDENCIA:						
DAVID GARCÍA CARRANZA			AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO						
CONTRATISTA:		DAVID GARCÍA CARRANZA							
R.F.C.:		GACD8102079HA							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.							
ESTIMACION		02 NORMAL FINQUITO							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
2	ESTRUCTURA								
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS	ML							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO	28.25		28.25		
				LADO DERECHO	53.17		53.17		
							TOTAL EJECUTADO	81.42	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO	6.00		6.00		
				LADO DERECHO	6.00		6.00		
							TOTAL EJECUTADO	12.00	
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							VER CROQUIS
				478.71			478.71		
							0.00		
							TOTAL EJECUTADO	478.71	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN	ML							
				33.60	6.20	16.80	104.16		
				12.00	6.00	6.00	36.00		
				11.40	11.00	5.70	62.70		
							TOTAL EJECUTADO	202.86	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO	59.18		59.18		
				LADO DERECHO	59.18		59.18		
				PATIN	118.36	0.40	15.78		
				CENTRO	78.08		78.08		
							TOTAL EJECUTADO	212.22	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML							VER CROQUIS
					62.00		62.00		
							TOTAL EJECUTADO	62.00	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	ML							VER CROQUIS
				LADO IZQUIERDO	28.25		28.25		
				LADO DERECHO	53.17		53.17		
							TOTAL EJECUTADO	81.42	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA	M3							VER CROQUIS
					90.08	0.25	22.52		
							TOTAL EJECUTADO	22.52	

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		DEPENDENCIA:	
DAVID GARCIA CARRANZA		AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
CONTRATISTA:	DAVID GARCIA CARRANZA		
R.F.C.	GACD8102079HA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
ESTIMACION	02 NORMAL FINIQUITO		
GENERADORES DE ESTIMACION			
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE	M2	VER CROQUIS
		FRENTE A BARDA	25.00
		FRENTE A CANCHA	59.68
		FRENTE A BARDA ARQUITECTONICA	5.40
		TOTAL EJECUTADO	90.08
GBR16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 MATERIAL PUESTO EN OBRA MANO DE	PZA	VER CROQUIS
			1.00
		TOTAL EJECUTADO	1.00
GGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	VER CROQUIS
			1.00
		TOTAL EJECUTADO	1.00
GGR17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	VER CROQUIS
			1.00
		TOTAL EJECUTADO	1.00
3	INSTALACIONES BASICAS		
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA,	ML	VER CROQUIS
		DE ALIMENTACIÓN A POSTE 1	15.00
		DE POSTE 1 A POSTE 2	31.29
		DE POSTE 2 A POSTE 3	28.00
		TOTAL EJECUTADO	74.29
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL, 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	VER CROQUIS
		DE ALIMENTACION A POSTE 1	15.00
		DE POSTE 1 A POSTE 2	31.29
		DE POSTE 2 A POSTE 3	28.00
		REGISTROS	3.00
		0.50	1.50
		TOTAL EJECUTADO	75.79
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	PZA	VER CROQUIS
		1.00	1.00
		TOTAL EJECUTADO	1.00
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X306X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48	PZA	VER CROQUIS
		3.00	3.00
		TOTAL EJECUTADO	3.00
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8"	PZA	VER CROQUIS
		3.00	3.00
		TOTAL EJECUTADO	3.00
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	VER CROQUIS
		1.00	1.00
		TOTAL EJECUTADO	1.00

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: DAVID GARCIA CARRANZA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO	
CONTRATISTA:	DAVID GARCIA CARRANZA		
R.F.C.:	GACD8102079HA		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
ESTIMACION	02 NORMAL FINIQUITO		
GENERADORES DE ESTIMACION			
4	OTROS	M2	VER CROQUIS
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL	PZA	VER CROQUIS
		1.00	1.00
		TOTAL EJECUTADO 1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	VER CROQUIS
		62.00	10.00
		TOTAL EJECUTADO 609.40	

ELABORO.-

David García Carranza
D. DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA:
DAVID GARCÍA CARRANZA

DEPENDENCIA:
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO


DOMICILIO: Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190

R.F.C. GACD8102079HA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS,
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
GBR16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GGR17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

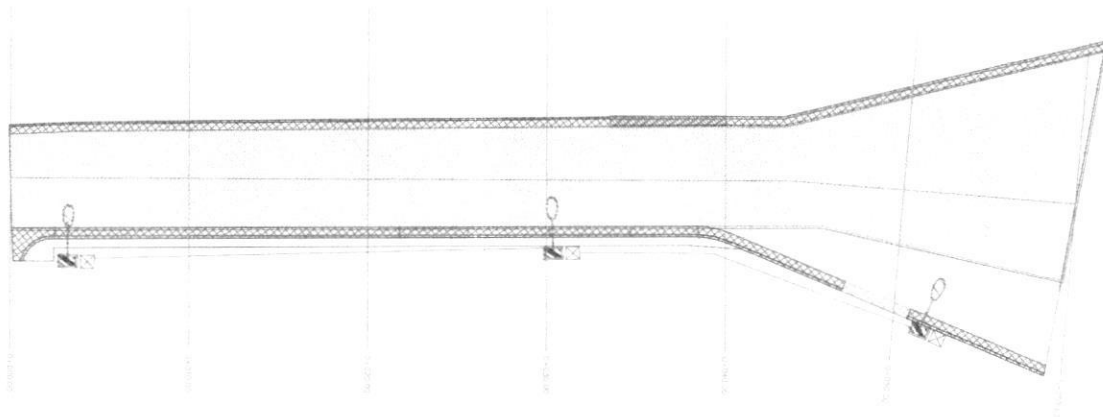

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCÍA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190	
R.F.C.	GACD8102079HA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

CROQUIS ESTIMACION:

3	INSTALACIONES BASICAS
GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO.
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
GP30	INTERCONEXIÓN A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

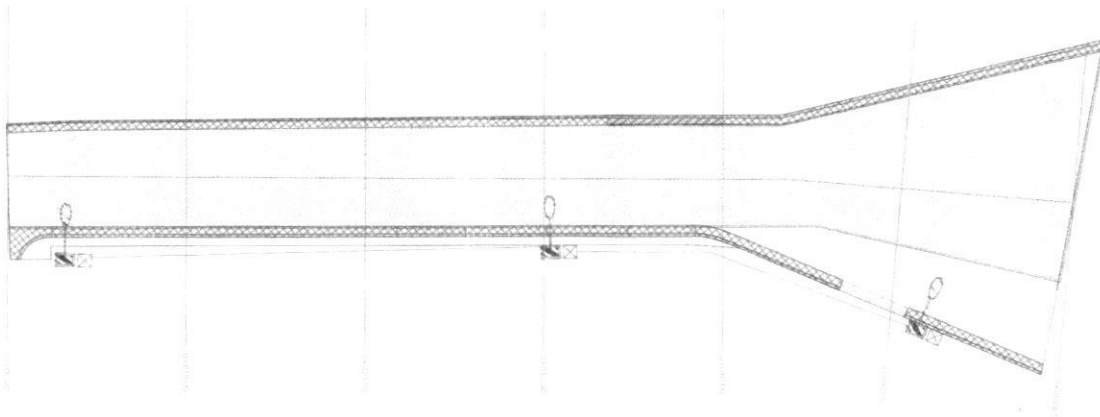

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-


[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA: DAVID GARCÍA CARRANZA		DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO:	Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle Independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190	
R.F.C.:	GACD8102079HA	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.	

CROQUIS ESTIMACION:

4	OTROS
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

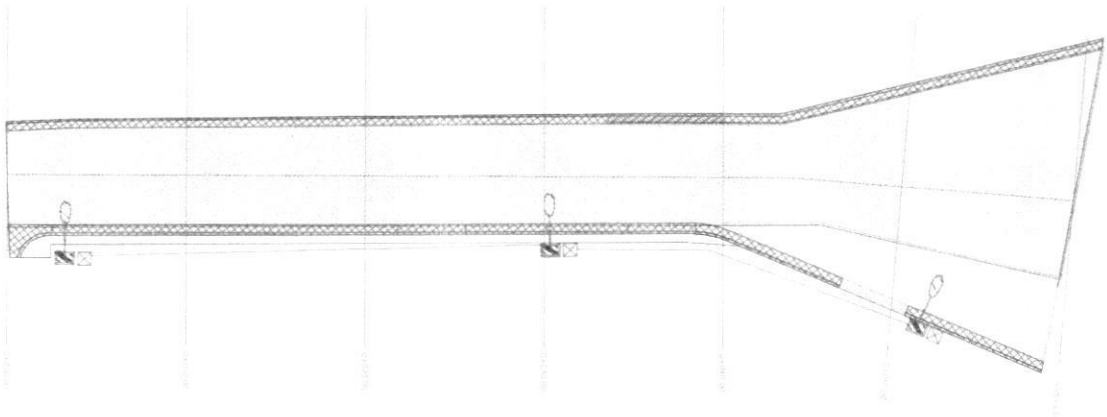

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA:

DAVID GARCÍA CARRANZA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190

R.F.C.:

GACD8102079HA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:


CVE

2

CONCEPTO

ESTRUCTURA


GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y
GBR16	RENIVELACION DE POZO DE VISITA INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3,
GGR18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FO. FO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GGR17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

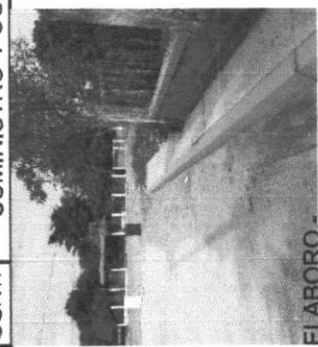

ELABORO.



REVISO.-

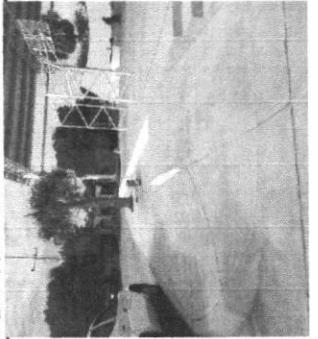

AUTORIZO.-

David García Carranza
C. DAVID GARCÍA CARRANZA
PERTENECIENTE LEGAL

Supervisor de obra
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DAVID GARCÍA CARRANZA

CONTRATISTA:

DAVID GARCÍA CARRANZA

DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO:

Calle: Constituyente J. Natividad Macías Sur No. 2624, entre Av. Enrique Recio y calle independencia, Col. Aquiles Serdán C.P. 80190

R.F.C.:

GACD8102079HA

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, AUN COSTADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE LA APOMA, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA HIGUERAS DE ÁLVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FOTOS DE ESTIMACION:


CVE

3

CONCEPTO

INSTALACIONES BÁSICAS

GP20	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL
GP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
GP22	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
GP23	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN
GP24	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE
GP30	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

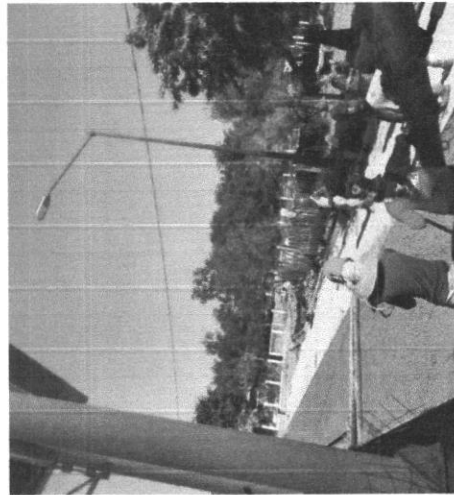

ELABORO.-

David García Carranza
C.DAVID GARCIA CARRANZA
RESPONSABLE TECNICO

REVISO.-

[Signature]
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

30/12/2025 5:25:46 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NOR FIN AD015

Importe de la operación: 551,754.50 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730010774761675

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: DAVID GARCIA CARRANZA

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 30/12/2025

Fecha de aplicación: 30/12/2025

Concepto de pago: EST 02 NOR FIN AD015

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 17:25:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000760025

Clave de rastreo: 002601002512300000760025

Folio de firma: 0016152130

Folio único: I401202512301725440016152136

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
