



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/424/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 21 de Julio de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: **CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL**, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: **SERGIO JOEL PADILLA SOTO**, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- **NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLES LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- **No. DE CONTRATO:** MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
- **IMPORTE DEL CONTRATO:** \$1,760,134.61 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N)
- **CONCEPTO DEL PAGO:** PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL
- **IMPORTE A PAGAR:** \$338,710.96 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N)
- **RECURSOS:** FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- **EMPRESA:** SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- **R.F.C.** PASS971118IRO
- **DOMICILIO FISCAL:** CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180
- **No. DE FACTURA:** # 43, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

C.C.P. ARCHIVO.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO**
TESORERÍA

21 JUL 2025
Adrian G
RECIBIDO
11:41 AM



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 43

Fecha: 18/Jul/2025 15:20:09

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México 80180

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Badiraguato Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,760,134.61 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 467,832.81 MAS I.V.A 16 % \$ 74,853.25 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 542,686.06 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 163,741.48 MAS I.V.A.: \$ 26,198.64 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 189,940.12 Importe TOTAL A FACTURAR \$ 304,091.33 MAS I.V.A \$ 48,654.61 MONTO NETO A FACTURAR \$ 352,745.94 RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 14,034.98 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 203,975.10 MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 338,710.96	\$304,091.33	IVA, - Importe: 48654.61	\$304,091.33

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco Pesos 94/100 M.N.

Subtotal: \$304,091.33

I.V.A.: \$48,654.61

Insp. Y Vig 3% \$0.00

Total: \$352,745.94



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711829771

Folio Fiscal: 04141A20-B36B-4270-BD45-AC6520EE37DA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-07-18T16:20:15

Sello digital del CFDI

IC2Kn83WPq/MWob/sY/EXc3WZ2sFtrzTLcB9vgZIF3F4TLrmUbGoSaMuJzJm0d6pDcB2PAVE8hij4NS4A1eKAjwiz/D/Q+9CmB+0fQ6v7Qgs5pt3+IqolQ0/ID2xBmH48cuTvkgT0NTQrGy5MIHqX6HS0uoXa62cfjvw6oGLQnps0v6vGsFagZu5r8UU10swO4Ruy9j/hDBQm4+/Pyg/hTMJzGyfiHHzWicNy3ed0l+C5JtzpPUM3sujmJB5+y2ohjpMeOgh61BOM4hW9ct8sPm3V5pPie++35Qqmlf7CmJaFDi442D42CxRS3X4PnZpOQYbmmJE1h/Wlj2kA==

Sello del SAT

NM43yBTy41TOMXeJ0BK5UbGj86mXGJsnHBu6PfdRqQxewVlt0RL7P1u6gp3DBtttU5O8TPYNCibXuT/d/eQ+UIRINI+/094j/VLBupje3dPDxKpyaUuGCX0/RBaCQqb5jHXPSMjnZ9aAJI3gOoZGL6IZCT+/sKKLKcRYngbfsA4E5K7pU8tREUcsQPSsNYDWN65bcMzsc5EywQW24r9VKGIxomw0WPxsx6Y7Bbq0qlufGNkq7ansVpQ7wQqoF9rQnKk/jnhuF4P8ISvmeS8UFGYK4IvICBNIVbddlp2HwnfYQUUfhfHzWselkHsz76lPfiAIBzeAOpuOMmg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1||04141A20-B36B-4270-BD45-AC6520EE37DA|2025-07-18T16:20:15|MAS0810247C0j|C2Kn83WPq/MWob/sY/EXc3WZ2sFtrzTLcB9vgZIF3F4TLrmUbGoSaMuJzJm0d6pDcB2PAVE8hij4NS4A1eKAjwiz/D/Q+9CmB+0fQ6v7Qgs5pt3+IqolQ0/ID2xBmH48cuTvkgT0NTQrGy5MIHqX6HS0uoXa62cfjvw6oGLQnps0v6vGsFagZu5r8UU10swO4Ruy9j/hDBQm4+/Pyg/hTMJzGyfiHHzWicNy3ed0l+C5JtzpPUM3sujmJB5+y2ohjpMeOgh61BOM4hW9ct8sPm3V5pPie++35Qqmlf7CmJaFDi442D42CxRS3X4PnZpOQYbmmJE1h/Wlj2kA==|00001000000709182898|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBDCCA+yyAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDQYDQDDCxBQyBERUwU0V5VklDSU8gREUGQURNUSU3U1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-07-18T15:20:09" Folio="43" FormaPag="03" LugarExpedicion="80180" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="iC2Kn83WPq/Mwob/sY/EXc3WZ2sFtfrzTLcB9vgZiF3F4TLrmUbGoSaMuJzJm0d6pDcB2PAVE8hiIi4NS4A1eKAjwiz/D/Q+9CmB+0fQ6v7Qgs5pt3+lqolQ0/ID2xBmH48cuTvkGT0TQrGy5
SubTotal="304091.33" TipoDeComprobante="I" Total="352745.94" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118IR0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL
CONTRATO: $ 1,760,134.61 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 467,832.81 MAS I.V.A 16 % $ 74,853.25 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 542,686.06
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 163,741.48 MAS I.V.A.: $ 26,198.64 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 189,940.12 Importe TOTAL A FACTURAR $ 304,091.33 MAS
I.V.A $ 48,654.61 MONTO NETO A FACTURAR $ 352,745.94 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 14,034.98 TOTAL DEDUCCIONES: $ 203,975.10 MONTO LIQUIDO A
RECIBIR: $ 338,710.96" Importe="304091.33" NoIdentificacion="SER03" ObjetoImp="02" ValorUnitario="304091.33">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="304091.33" Importe="48654.61" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48654.61">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="304091.33" Importe="48654.61" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="04141A20-B36B-4270-BD45-AC6520EE37DA"
FechaTimbrado="2025-07-18T16:20:15" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="iC2Kn83WPq/Mwob/sY/EXc3WZ2sFtfrzTLcB9vgZiF3F4TLrmUbGoSaMuJzJm0d6pDcB2PAVE8hiIi4NS4A1eKAjwiz/D/Q+9CmB+0fQ6v7Qgs5pt3+lqolQ0/ID2xBmH48cuTvkGT0
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="NM43yBTy411TOMXeJ08KSUBGj86mXGJsnHBu6PfdRqQxewVit0R17P1u6gp3DBtttU50BTPYNC1bXuTd/eQ+UIR1Ni+/094jIVLbupje3dPDxKpyuGcX0/RBacQbqb5jHXPsmjnZ9
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
04141A20-B36B-4270-BD45-AC6520EE37DA	2025-07-18T15:20:09	2025-07-18T16:20:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$352,745.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 16 de julio de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No:	01 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	24-jun-24
667-5818434	667-5818434		AL	14-jul-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
PASS971118IRO.			23-jun-24	
DEPENDENCIA.-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
BADIRAGUATO		BADIRAGUATO	INICIO:	24-jun-24
			TERMINACIÓN:	11-sep-24
DESCRIPCIÓN:				
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA				
CONTRATO No:				
MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025				
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	
\$1,517,357.42	\$1,760,134.61	\$616,047.11	\$1,760,134.61	
			BUENO POR:	\$ 338,710.96
RECIBI:				
\$ 338,710.96	(SON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.)			
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 NORMAL				
DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 163,741.48	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$	467,832.81
MAS I.V.A.:	\$ 26,198.64	MAS I.V.A 16 %	\$	74,853.25
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 189,940.12	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$	542,686.06
3 % SVIFYC:	\$ 14,034.98	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$	203,975.10
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 203,975.10	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$	352,745.94
			SALDO A PAGAR:	\$ 338,710.96

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimacion:
			16 de julio de 2025	01 NORMAL
Periodo de la estimacion:	24/06/2024	14/07/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	24/06/2024	11/09/2024	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,760,134.61	\$ 1,517,357.42	\$ 616,047.11	\$ 531,075.09	31%
				% Avance Total
				31%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 467,832.81	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+) \$ 74,853.25	
\$ 189,940.12	Sub- Total A (=) \$ 542,686.06	\$ 542,686.06
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 163,741.48	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 26,198.64	ACUMULADO ANTERIOR
\$ -	Total (=) \$ 189,940.12	\$ -
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 304,091.33	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 48,654.61	TOTAL ACUMULADO.
\$ 189,940.12	Total (=) \$ 352,745.94	\$ 542,686.06
	3 % SVIFYC: \$ 14,034.98	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 203,975.10	CONTRATADO
\$ 616,047.11	Importe T O T A L \$ 338,710.96	\$ 1,760,134.61
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 338,710.96	SALDO
\$426,106.99	Son:	\$ 1,217,448.55
	(SON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.)	

ELABORO.-


Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

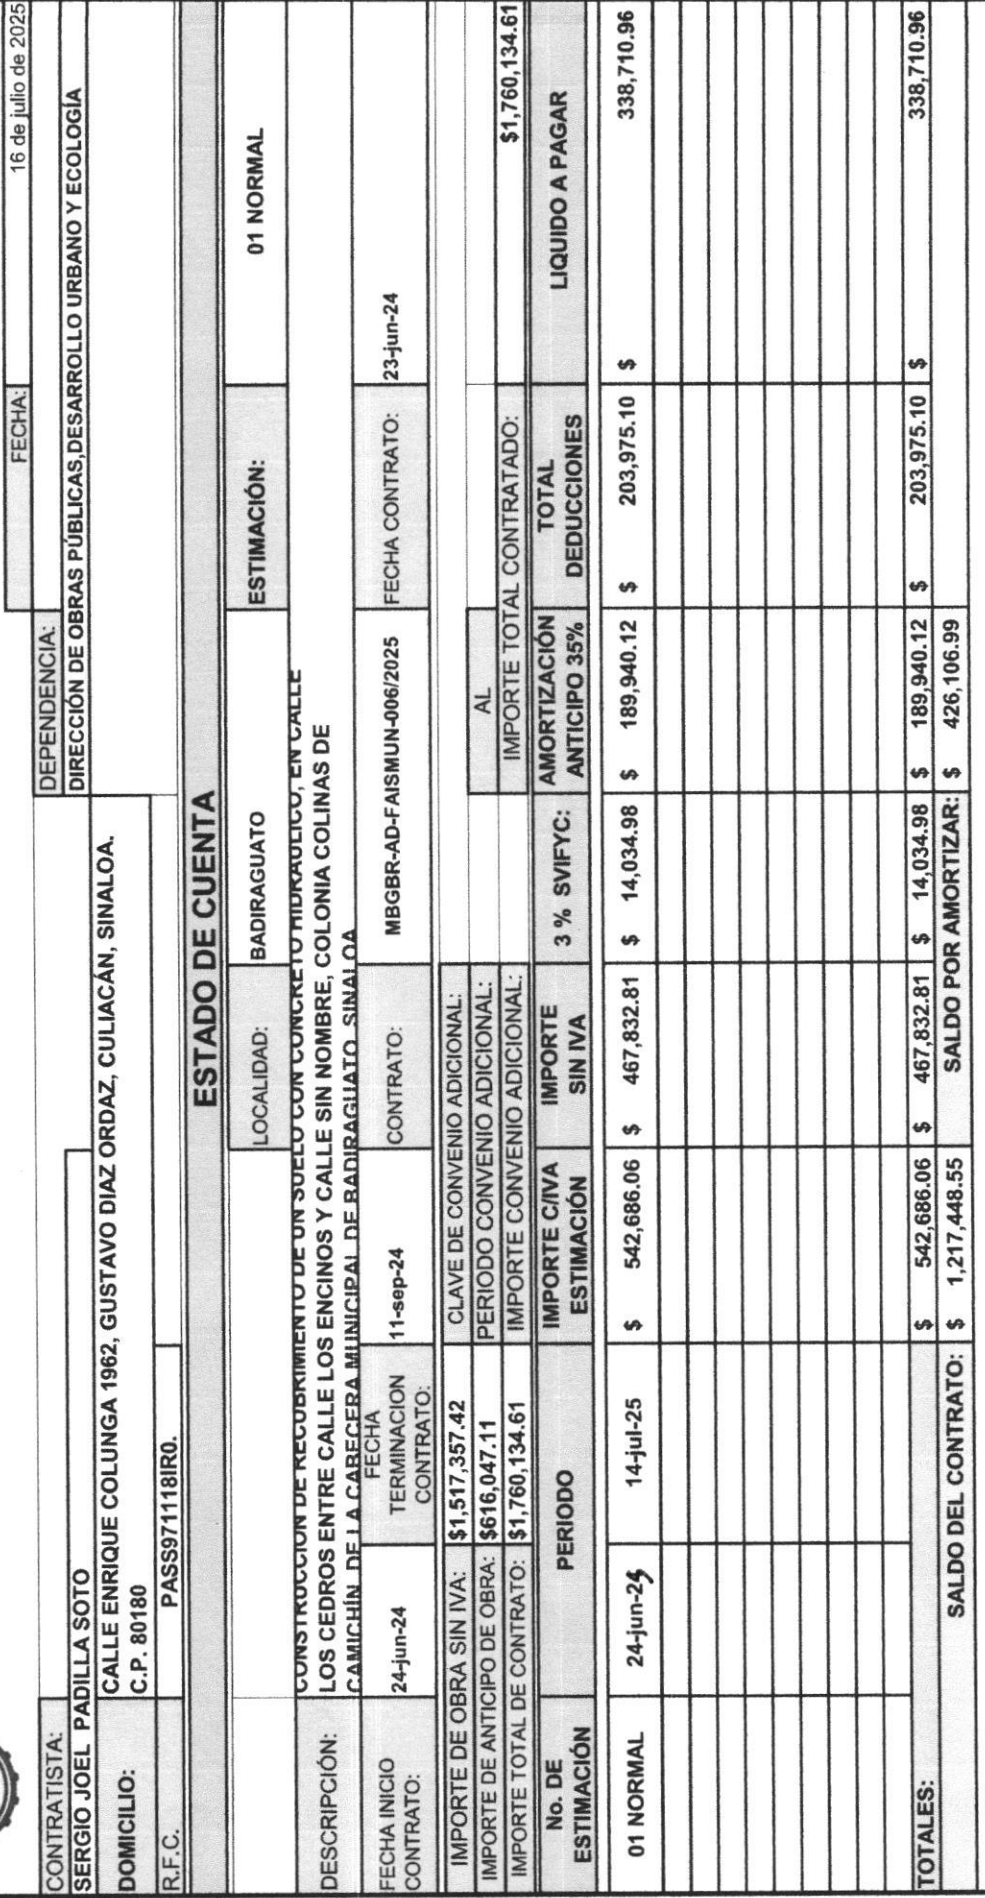

REVISO:-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS

AUTORIZO.-
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: 16 de julio de 2025	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	PASS971118IR0.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,517,357.42			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 616,047.11			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,760,134.61			

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 467,832.81
2	ESTRUCTURA	\$ -
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 467,832.81

SUB TOTAL =	\$ 467,832.81
I.V.A AL 16 %	\$ 74,853.25
TOTAL =	\$ 542,686.06

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
 C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
 COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		FECHA: miércoles, 16 de julio de 2025
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		R.F.C.	PAS8971118IRO.		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 NORMAL
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,517,357.42	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$616,047.11	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,760,134.61

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			GANT	P.U.					
GP01	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELITAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,122.00	\$ 15.58	\$ 17,480.76		0.00	1,122.00	\$ 17,480.76
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE. EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	491.70	\$ 133.09	\$ 65,440.35	0.00	0.00	491.70	\$ 65,440.35
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE. INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	894.00	\$ 37.61	\$ 33,623.34	0.00	0.00	894.00	\$ 33,623.34
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.	M2	894.00	\$ 157.55	\$ 140,849.70	0.00	0.00	894.00	\$ 140,849.70
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO. INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	894.00	\$ 196.07	\$ 175,286.58	0.00	0.00	894.00	\$ 175,286.58
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECH-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2. INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA	M2	894.00	\$ 39.32	\$ 35,152.08	0.00	0.00	894.00	\$ 35,152.08
2	ESTRUCTURA								

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLOSE

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FECHA	miércoles, 16 de julio de 2025
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180	R.F.C.	PASS971118IRO.		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

LOCALIDAD:		BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:		01 NORMAL			
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE								
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:		\$1,517,357.42	IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$616,047.11			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:								
\$1,760,134.61								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA	EXCEDENTE	DE ESTA	IMPORTE
			CANT	P.U.	ESTA ESTIM	ESTIM	SUB-TOTAL \$	
							IVA \$	467,832.81
							MONTO TOTAL \$	74,853.25
								542,686.06

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:			
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO					
R.F.C.:		PASS971118IR0.					
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA					
ESTIMACIÓN		01 NORMAL					
GENERADORES DE ESTIMACION							
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	OBSERVACIONES
PRELIMINARES							
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2					
	CADENAMIENTO						VER CROQUIS
	0+000.00	0+010.00			10.0000	10.20	102.00
	0+010.00	0+020.00			10.0000	10.20	102.00
	0+020.00	0+030.00			10.0000	10.20	102.00
	0+030.00	0+040.00			10.0000	10.20	102.00
	0+040.00	0+050.00			10.0000	10.20	102.00
	0+050.00	0+060.00			10.0000	10.20	102.00
	0+060.00	0+070.00			10.0000	10.20	102.00
	0+070.00	0+080.00			10.0000	10.20	102.00
	0+080.00	0+090.00			10.0000	10.20	102.00
	0+090.00	0+100.00			10.0000	10.20	102.00
	0+100.00	0+110.00			10.0000	10.20	102.00
	0+110.00	0+120.00			10.0000	10.20	102.00
						TOTAL EJECUTADO	1224.00
						TOTAL CONTRATADO	1122.00
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FLSA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON	M3					
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR	VER CROQUIS
	0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
	0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20	0.55	45.10
						TOTAL EJECUTADO	541.20
						TOTAL CONTRATADO	491.70
GP05	COMPACTACIÓN DE TERREÑO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2					
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		VER CROQUIS
	0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20		82.00
	0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20		82.00
	0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20		82.00
	0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20		82.00
	0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20		82.00
	0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20		82.00
	0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20		82.00
	0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20		82.00
	0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20		82.00
	0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20		82.00
	0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20		82.00
	0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20		82.00
						TOTAL EJECUTADO	984.00
						TOTAL CONTRATADO	894.00
GP08	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD.,	M2					
	CADENAMIENTO			LONG	ANCHO		VER CROQUIS
	0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20		82.00
	0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20		82.00
	0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20		82.00
	0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20		82.00
	0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20		82.00
	0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20		82.00
	0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20		82.00
	0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20		82.00
	0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20		82.00
	0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20		82.00
	0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20		82.00
	0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20		82.00
						TOTAL EJECUTADO	984.00
						TOTAL CONTRATADO	894.00

ELABORO.-

Sergio Joel Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

BRSD
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:			DEPENDENCIA:		
SERGIO JOEL PADILLA SOTO			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
CONTRATISTA:			SERGIO JOEL PADILLA SOTO		
R.F.C.			PASS971118IR0.		
OBRA:			CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		
ESTIMACION			01 NORMAL		
GENERADORES DE ESTIMACION					
GP08	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO	M2			
					VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	LONG	ANCHO	
		0+000.00	0+010.00	10.0000	8.20
		0+010.00	0+020.00	10.0000	8.20
		0+020.00	0+030.00	10.0000	8.20
		0+030.00	0+040.00	10.0000	8.20
		0+040.00	0+050.00	10.0000	8.20
		0+050.00	0+060.00	10.0000	8.20
		0+060.00	0+070.00	10.0000	8.20
		0+070.00	0+080.00	10.0000	8.20
		0+080.00	0+090.00	10.0000	8.20
		0+090.00	0+100.00	10.0000	8.20
		0+100.00	0+110.00	10.0000	8.20
		0+110.00	0+120.00	10.0000	8.20
				TOTAL EJECUTADO	984.00
				TOTAL CONTRATADO	984.00
GP109	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION CATIONICA ECI-80, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO.	M2			
					VER CROQUIS
		CADENAMIENTO	LONG	ANCHO	
		0+000.00	0+010.00	10.0000	8.20
		0+010.00	0+020.00	10.0000	8.20
		0+020.00	0+030.00	10.0000	8.20
		0+030.00	0+040.00	10.0000	8.20
		0+040.00	0+050.00	10.0000	8.20
		0+050.00	0+060.00	10.0000	8.20
		0+060.00	0+070.00	10.0000	8.20
		0+070.00	0+080.00	10.0000	8.20
		0+080.00	0+090.00	10.0000	8.20
		0+090.00	0+100.00	10.0000	8.20
		0+100.00	0+110.00	10.0000	8.20
		0+110.00	0+120.00	10.0000	8.20
				TOTAL EJECUTADO	984.00
				TOTAL CONTRATADO	984.00

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DE RECORRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE
LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE
CAMICHÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RADIRACUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORÓ.-

Sergio J. Padilla Soto

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISÓ.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		
R.F.C.	PASS971118IR0.	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICUÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RADACHUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:		
CROQUIS ESTIMACION:		
CLAVE	CONCEPTO	
1	PRELIMINARES	
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON	
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,	
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,	

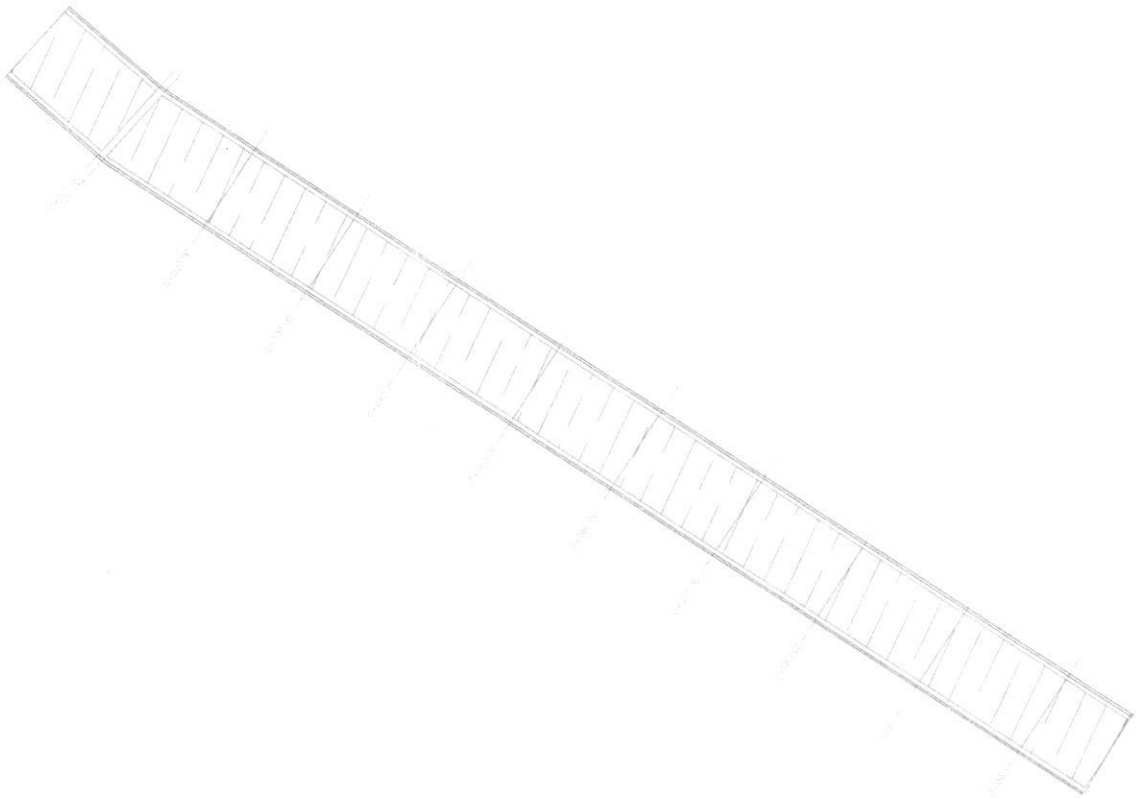

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto

CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

Br. S. J.
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



Fecha y hora de consulta

24/07/2025 12:47:47 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00798320

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 NOR AD 006

Importe de la operación: 338,710.96 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG UATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 24/07/2025

Fecha de aplicación: 24/07/2025

Concepto de pago: EST 01 NOR AD 006

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 12:47:43

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000661229

Clave de rastreo: 002601002507240000661229

Folio de firma: 0063949035

Folio único: 1401202507241247430063949041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/07/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/07/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
