

OFICIO No. OPDUyE/665/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
Badiraguato, Sin., a 26 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLES LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,760,134.61 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL
- IMPORTE A PAGAR: \$698,836.54 (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IR0
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # 154A, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA





Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 98

Fecha: 25/Nov/2025 10:32:36

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México 80180

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Col Centro Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,760,134.61</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 965,243.84 MAS I.V.A 16 % \$ 154,439.01 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 1,119,682.85</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 337,835.34 MAS I.V.A.: \$ 54,053.65 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 391,888.99</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 627,408.50 MAS I.V.A \$ 100,385.36 MONTO NETO A FACTURAR \$ 727,793.86</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.): \$ 28,957.32 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 420,846.31</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 698,836.54</p>	\$627,408.50	IVA, - Importe: 100385.36	\$627,408.50

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

setecientos veintisiete mil setecientos noventa y tres Pesos 86/100 M.N.

Subtotal: \$627,408.50

I.V.A.: \$100,385.36



Total: \$727,793.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000711829771

Folio Fiscal: B346209D-3907-4895-A99E-0B22DF76154A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2025-11-26T11:27:40

Sello digital del CFDI

D32GSZURDID2jmJsrpoTubq5Auemf6cSvMnh0jC4p5vRj2vC79ZCWXR9jON0HdpCuxPdTRzeBnTUESk87kT0MaKjN+Qi/w69QnGvptSV0R2amp50/vblqVr66ubkwUSaoP0SR5Eb40gCX
yznZ9/bu6pulUlewgLc1OE6GZFxl5Pd0ZCTBUZ1TPHQk31FpJOZSS5NtzqCmr6KncO2z+eeWGH980r5l5XXnbVy0mdTihl/8R2d7WKC955bq35RthvOfwlyCJaifrgkuPF9q1T0VJfP8Z
CL9xgemxly4CqYoaMGeUQVefud10LxxSoqrbZ2/Kf9v9KsChEoDeA==

Sello del SAT

ZaknYSg0eV0KTCjby7yzwSVXQ+q2wPiHwX1sffTx+S0xiWzK13v3Fh3aA9L3+OCSA+eSxrdvLDzYk4f1XFKyrdHzVla5X8DU6FpWFOE0ZIRRKoITKpC3duK2d1/Xw0XTwDFJONG
zw+HBLZPdchL+TiW6zqu0jP8CcF5eD4wsT4vM41CrW7Q5d7+VqRnELsODVQVMVAoe8UWUqj1UOJT4A8g01PoRQTTCCyPmOGX5ggY17VQHDAAo/MDP0Q05QCfjgSgLUHT+RqLIEQoQ2
B3R57b/+fZNXlate7d2SfSdc9qbpjctfGfcTBUPBy69xCHL/ERTSwnNrhKkOghA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B346209D-3907-4895-A99E-0B22DF76154A|2025-11-26T11:27:40|MA90610247C0|D32GSZURDID2jmJsrpoTubq5Auemf6cSvMnh0jC4p5vRj2vC79ZCWXR9jON0HdpCuxPd
TRzeBnTUESk87kT0MaKjN+Qi/w69QnGvptSV0R2amp50/vblqVr66ubkwUSaoP0SR5Eb40gCXyznZ9/bu6pulUlewgLc1OE6GZFxl5Pd0ZCTBUZ1TPHQk31FpJOZSS5NtzqCmr6KncO2z+e
eWGH980r5l5XXnbVy0mdTihl/8R2d7WKC955bq35RthvOfwlyCJaifrgkuPF9q1T0VJfP8ZCL9xgemxly4CqYoaMGeUQVefud10LxxSoqrbZ2/Kf9v9KsChEoDeA==|00001000000709182898||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQ00DCx8QyBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSUS3U1RSQUNJTE04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-11-25T10:32:36" Folio="98" FormaPago="03" LugarExpedicion="80180" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="D32GSZtJRDfD2jmJsrpoTubq5Auemf6cSvMnhojC4p5vRj2vC79ZCWxRi9jON0HdpCuxPdTrzeBnLTUESk87kT0MaKjN+Qi/w69QnGvpbSV0R2amp50/vbIqVr86ubkwUSoP0SR5Eb40gCkYz
SubTotal="627408.50" TipoDeComprobante="I" Total="727793.86" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118IR0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL
CONTRATO: $ 1,700,134.61 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 965,243.84 MAS I.V.A 16 % $ 154,439.01 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
1,119,682.85 AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% $ 337,835.34 MAS I.V.A.: $ 54,053.65 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 391,888.99 Importe TOTAL A FACTURAR $
627,408.50 MAS I.V.A $ 100,385.36 MONTO NETO A FACTURAR $ 727,793.86 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C.) : $ 28,957.32 TOTAL DEDUCCIONES: $ 420,846.31 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR: $ 698,836.54" Importe="627408.50" NoIdentificacion="SER03" ObjetoImp="02" ValorUnitario="627408.50">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="627408.50" Importe="100385.36" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100385.36">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="627408.50" Importe="100385.36" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="B346209D-3907-4895-A99E-0B22DF76154A"
FechaTimbrado="2025-11-26T11:27:40" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="D32GSZtJRDfD2jmJsrpoTubq5Auemf6cSvMnhojC4p5vRj2vC79ZCWxRi9jON0HdpCuxPdTrzeBnLTUESk87kT0MaKjN+Qi/w69QnGvpbSV0R2amp50/vbIqVr86ubkwUSoP0SR5Eb
NoCertificadoSAT="00001000000709182896"
SelloSAT="ZaknYSg0eV0KTCjbY7yzwSVXQ+q2wP1HwX1sfTxs0xtWzKI3v3Fh3sABL3+00SA+oSxrdvLDzYk4FF1XFKyrdHzyVta5X8D06FpWFOE0ZfRFRKdiTkpC3duK2d1/Xw0XTWDF10NGZ
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B346209D-3907-4895-A99E-0B22DF76154A	2025-11-25T10:32:36	2025-11-26T11:27:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$727,793.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha: 26 de septiembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No:	02 NORMAL
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	15-jul-25
667-5818434	667-5818434		AL	11-sep-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
PASS971118IR0.				23-jun-24
DEPENDENCIA.-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 24-jun-24
		TERMINACIÓN: 11-sep-24

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,517,357.42	\$1,760,134.61	\$616,047.11	\$1,760,134.61

RECIBI:	BUENO POR:	\$ 698,836.54
---------	------------	---------------

\$ 698,836.54 (SON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 NORMAL

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 337,835.34	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 965,243.84
MAS I.V.A.:	\$ 54,053.65	MAS I.V.A 16 %	\$ 154,439.01
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 391,888.99	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 1,119,682.85
3 % SVIFYC:	\$ 28,957.32	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 420,846.31
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 420,846.31	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 727,793.86

SALDO A PAGAR:	\$ 698,836.54
----------------	---------------

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			Fecha:	Estimación:
			26 de septiembre de 2025	02 NORMAL
Periodo de la estimación:	15/07/2025	11/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	15/07/2025	11/09/2024	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,760,134.61	\$ 1,517,357.42	\$ 616,047.11	\$ 531,075.09	64%
				% Avance Total
				94%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	ESTA ESTIMACION
\$ 391,889.00	\$ 965,243.84	
	16 % I.V.A (+)	\$ 154,439.01
	Sub- Total A (=)	\$ 1,119,682.85
	Amortizacion Anticipo 35%	
	\$ 337,835.34	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 189,940.12	\$ 54,053.65	
	Total (=)	\$ 542,686.06
	\$ 391,888.99	
TOTAL AMORTIZADO	Importe TOTAL A FACTURAR	
\$ 581,829.12	\$ 627,408.50	
	16 % I.V.A (+)	TOTAL ACUMULADO.
	\$ 100,385.36	
	Total (=)	\$ 1,662,368.91
	\$ 727,793.86	
ANTICIPO OTORGADO	3 % SVIFYC:	CONTRATADO
\$ 616,047.11	\$ 28,957.32	
	Total Deducciones (=)	\$ 1,760,134.61
	\$ 420,846.31	
	Importe TOTAL	
	\$ 698,836.54	
SALDO DEL ANTICIPO	NETO A PAGAR	SALDO
\$34,217.99	\$ 698,836.54	
	Son:	\$ 97,765.70
	(SON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)	

ELABORO.-


Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



			LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA					
FECHA INICIO CONTRATO:	24-jun-24	FECHA TERMINACION CONTRATO:	11-sep-24	CONTRATO:	MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025	FECHA CONTRATO: 23-jun-24

[illegible]

REVISOR

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:	FECHA:	26 de septiembre de 2025
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
R.F.C.	PASS971118IR0.	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	02 NORMAL
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,517,357.42			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 616,047.11			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,760,134.61			

DESTAJOS		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ -
2	ESTRUCTURA	\$ 949,970.37
3	OTROS	\$ 15,273.47
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 965,243.84

SUB TOTAL=	\$ 965,243.84
I.V.A AL 16 %	\$ 154,439.01
TOTAL =	\$ 1,119,682.85

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



DESGLÓSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		FECHA: viernes, 26 de septiembre de 2025	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180	DEPENDENCIA: R.F.C. PASS971118IR0.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
		1 de 2	

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE										02 NORMAL	
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,517,357.42										IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,760,134.61	
LOCALIDAD: BADIRAGUATO										ESTIMACIÓN:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$616,047.11											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
1	PRELIMINARES		CANT	P.U.	TOTAL						
2	ESTRUCTURA										
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML	196.68	\$ 792.50	\$ 155,868.90	125.50	0.00	125.50	\$	99,458.75	
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	114.00	\$ 624.05	\$ 71,141.70	78.70	0.00	78.70	\$	49,112.74	
GP103	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM². INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	690.10	\$ 912.27	\$ 629,557.53	690.10	0.00	690.10	\$	629,557.53	
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	375.00	\$ 32.67	\$ 12,251.25	303.04	0.00	303.04	\$	9,900.32	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505. INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	360.00	\$ 33.75	\$ 12,150.00	360.00	0.00	360.00	\$	12,150.00	
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	120.00	\$ 77.12	\$ 9,254.40	103.93	0.00	103.93	\$	8,015.08	
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL.	ML	240.00	\$ 81.89	\$ 19,653.60	212.48	0.00	212.48	\$	17,399.99	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD	M3	48.00	\$ 233.72	\$ 11,218.56	48.00	0.00	48.00	\$	11,218.56	
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO,	M2	202.45	\$ 558.94	\$ 113,157.40	202.45	0.00	202.45	\$	113,157.40	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE FGA

REVISÓ

ING. JOSE ROBERTO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZO

ING. RIBIRI RINCON RAMOS



DESGLOSE

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		FECHA: viernes, 26 de septiembre de 2025	
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 2 de 2	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180	R.F.C. PASS971118IR0.		

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE		LOCALIDAD: BADIRAGUATO		ESTIMACIÓN: 02 NORMAL				
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: \$1,517,357.42		IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$616,047.11		IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,760,134.61				
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANT	P.U.				
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. MATERIALES: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$ 4,771.55	\$ 4,769.35	0.00	0.00	1.00 \$ 4,771.55
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,122.00	\$ 9.36	\$ 10,501.92	0.00	0.00	1,122.00 \$ 10,501.92
							SUB-TOTAL	\$ 965,243.84
							IVA	\$ 154,439.01
							MONTO TOTAL	\$ 1,119,682.85

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ

AUTORIZO
C. ING. RUBEN RINCON RAMOS



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO							
R.F.C.		PAS9971118IR0.							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		02 NORMAL							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARTIAL	TOTAL	
3	PAVIMENTACION								
GP06	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X80 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS	ML							
	CADENAMIENTO		LONG	LADO					
	0+000.00 0+106.24		61.80	IZQUIERDA			61.80		
	0+000.00 0+106.24		63.70	DERECHA			63.70		
						TOTAL	125.50		
GP08	PATIN DE 15X80 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESMIBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO	ML							
	CADENAMIENTO		LONG	LADO					
	0+000.00 0+103.93		39.10	IZQUIERDA			39.10		
	0+000.00 0+103.93		39.80	DERECHA			39.80		
						TOTAL	78.90		
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							
	CADENAMIENTO		LONG	ANCHO					
	0+000.00 0+010.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+010.00 0+020.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+020.00 0+030.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+030.00 0+040.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+040.00 0+050.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+050.00 0+060.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+060.00 0+070.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+070.00 0+080.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+080.00 0+090.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+090.00 0+100.00		10.0000	6.64			66.40		
	0+100.00 0+103.93		3.9300	6.64			26.10		
						TOTAL	890.10		
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML							
	CADENAMIENTO		LONG	ANCHO		CORTES			
	0+000.00 0+010.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+010.00 0+020.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+020.00 0+030.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+030.00 0+040.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+040.00 0+050.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+050.00 0+060.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+060.00 0+070.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+070.00 0+080.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+080.00 0+090.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+090.00 0+100.00		10.0000	6.64		3.00	28.77		
	0+100.00 0+103.93		3.9300	6.64		3.00	15.34		
						TOTAL	303.04		

ELABORÓ.-

Sergio J. Padilla Soto

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:						
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA						
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO								
R.F.C.		PAS9971118JRO.								
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA								
ESTIMACION		02 NORMAL								
GENERADORES DE ESTIMACION										
CLAVE	CONCEPTO		UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
								PARCIAL	TOTAL	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.		ML							
	CADENAMIENTO			LONG	LADO					
		0+000.00 0+103.93		103.9300	IZQUIERDA			103.93		
		0+000.00 0+103.93		103.9300	CENTRO			103.93		
		0+000.00 0+103.93		103.9300	DERECHA			103.93		
				69.2867	EN PATIN Y GUARNICION			69.29		
							TOTAL EJECUTADO	381.08		
							CONTRATADO	380.00		
							ADICIONAL	21.08		
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
	CADENAMIENTO			LONG				LONG		
		0+000.00 0+103.93		0+103.93				103.93		
							TOTAL	103.93		
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.		ML							
	CADENAMIENTO			LONG	LADO					
		0+000.00 0+103.93		106.2400	IZQUIERDA			106.24		
		0+000.00 0+103.93		106.2400	DERECHA			106.24		
							TOTAL	212.48		
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA		M3							
	CADENAMIENTO		LADO	LONG	ANCHO	ESPESOR				
		0+000.00 0+103.93	IZQUIERDA	141.94		0.20		28.39		
		0+000.00 0+103.93	DERECHA	187.43		0.20		37.49		
							TOTAL EJECUTADO	65.88		
							CONTRATADO	48.00		
							ADICIONAL	17.88		

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							
CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO								
R.F.C.:	PAS8971118IR0.								
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA								
ESTIMACION	02 NORMAL								
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
GP10	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMERA, COLADO DE CONCRETO.	M2					PARCIAL	TOTAL	
	CADENAMIENTO	LADO	LONG	ANCHO					
	0+000.00 0+103.93	IZQUIERDA	141.94	1.00			141.94		
	0+000.00 0+103.93	DERECHA	187.43	1.00			187.43		
							TOTAL EJECUTADO	329.37	
							CONTRATADO	240.00	
							ADICIONAL	89.37	
5	OTROS								
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE	PZA							
	CADENAMIENTO			LADO		CANTIDAD			
	0+000.00 0+103.93			DERECHA		1.0000	1.00		
							TOTAL	1.00	
GP101	LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2							
	CADENAMIENTO		LONG	ANCHO					
	0+000.00 0+010.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+010.00 0+020.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+020.00 0+030.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+030.00 0+040.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+040.00 0+050.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+050.00 0+060.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+060.00 0+070.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+070.00 0+080.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+080.00 0+090.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+090.00 0+100.00		10.0000	10.20			102.00		
	0+100.00 0+110.00		10.0000	10.20			102.00		
							TOTAL	1122.00	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180


R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:

CROQUIS ESTIMACION:

CLAVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F' C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN,
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRIMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS,
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F' C=150 KG/CM2 T.M A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y

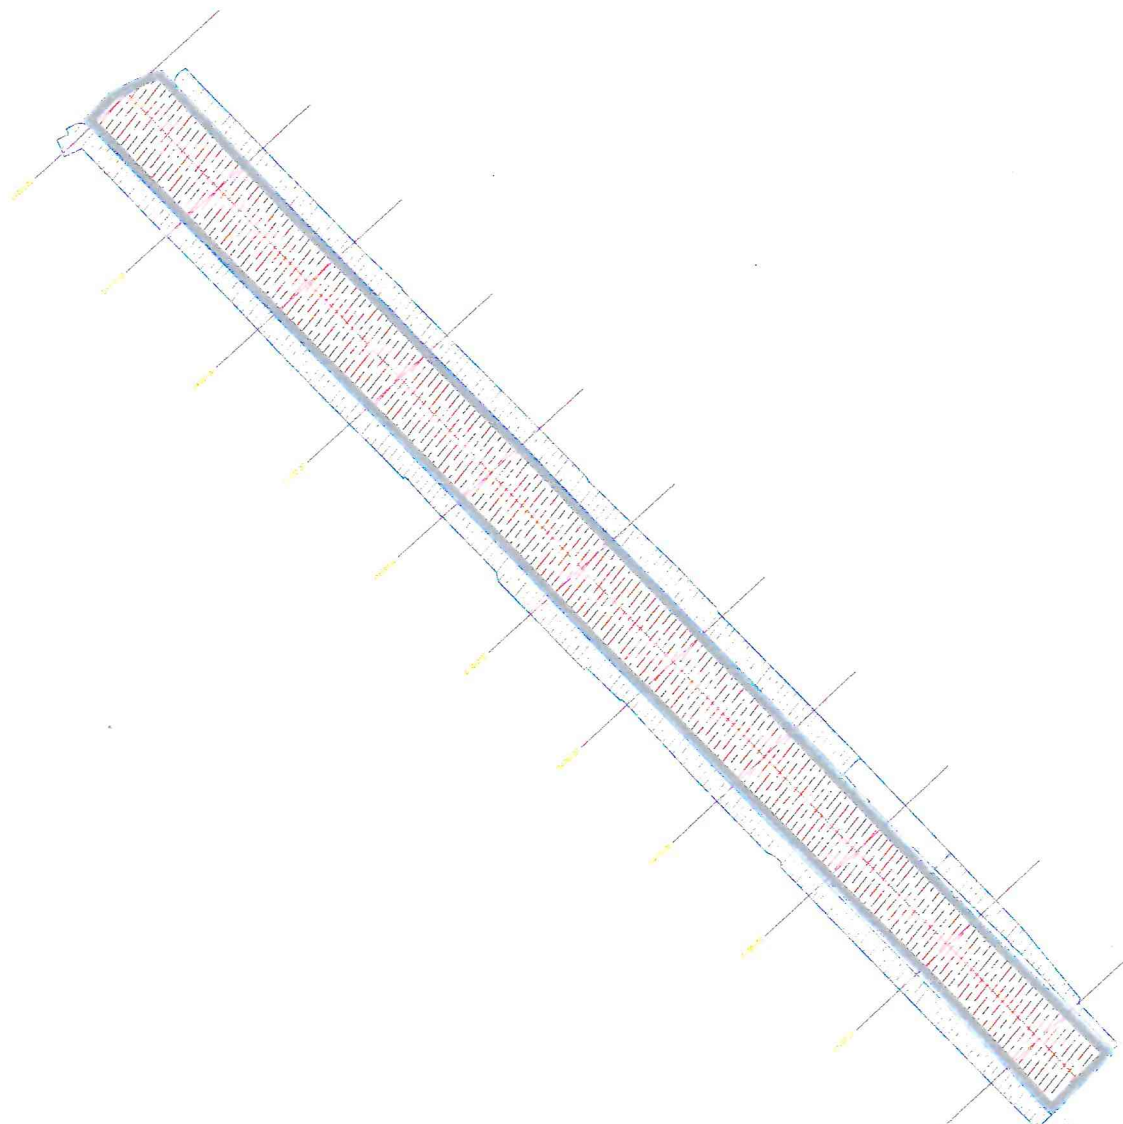

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-

ARQ. BRIGIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180			
R.F.C.: PASS971118IR0.			
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			
CROQUIS ESTIMACION:			
3	OTROS		
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA		
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		

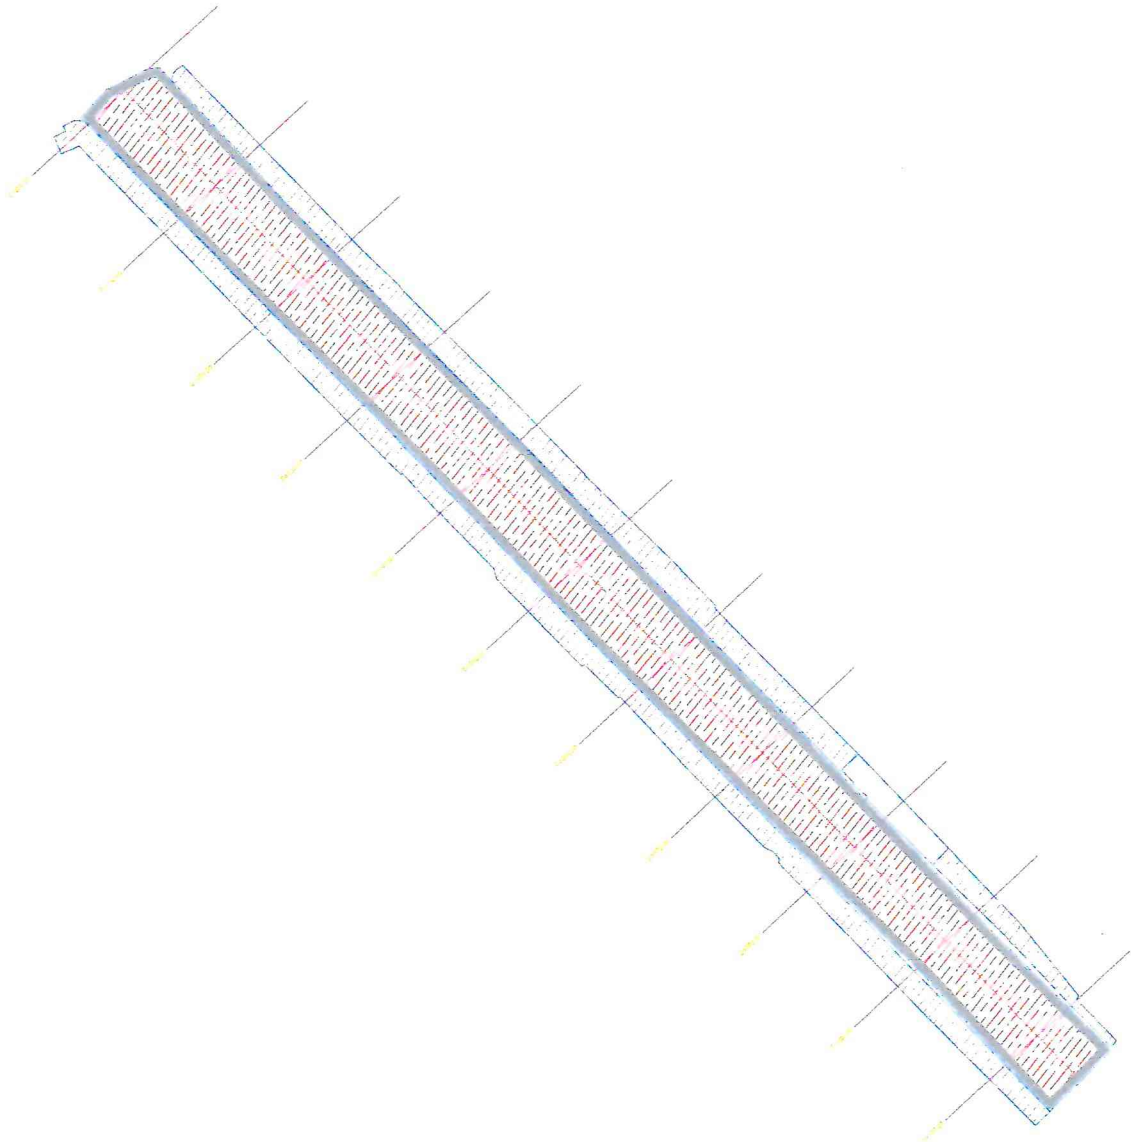

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ.-

Arq. Briceida GPE-Nieblas Martinez
ARQ. BRICEIDA GPE-NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE	CONCEPTO
2	ESTRUCTURA
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
GP08	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
GP10	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA
GP13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS,
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y



Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
COORDINADORA DE OBRAS

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

3

CONCEPTO

OTROS

**GBR6 LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON
GP10 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.**



ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
**C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
**ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
CI IDEDVISOD DE ODDA**

AUTORIZO.-

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:31:35 PM

Contrato

00798320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 02 NORM AD006

Importe de la operación: 698,836.54 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 02 NORM AD006

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:31:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000222275

Clave de rastreo: 002601002512110000222275

Folio de firma: 0069267102

Folio único: I401202512101931330069267108

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx
