

OFICIO No. OPDUyE/666/2025
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE ESTIMACION
01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 26 de Noviembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO, LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DETALLA:

- NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLES LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
- No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
- IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,760,134.61 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N)
- CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
- IMPORTE A PAGAR: \$61,019.28 (SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N)
- RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO 2025.
- EMPRESA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO
- R.F.C. PASS971118IRO
- DOMICILIO FISCAL: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80180
- No. DE FACTURA: # 5CB6, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025.


SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.C.P. ARCHIVO GUATO, SINALOA.


ATENTAMENTE


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
TESORERÍA

1:38 pm
26 NOV 2025


RECIBIDO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 97

Fecha: 25/Nov/2025 10:30:33

Lugar de expedición (C.P.) 80180

Emisor

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

RFC: PASS971118IR0

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio: ENRIQUE COLUNGA 1962 Gustavo Díaz Ordaz Culiacán Sinaloa México

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

RFC: MBA850101214

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 80500

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GABRIEL LEYVA SOLANO S/N Col Centro Badiraguato Sinaloa México 80500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72141103 - Servicio de pavimentación de calles y carreteras	<p>PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO</p> <p>DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.</p> <p>CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025 MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,760,134.61</p> <p>IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA \$ 84,280.78 MAS I.V.A 16 % \$ 13,484.92 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA \$ 97,765.70</p> <p>AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% \$ 29,498.28 MAS I.V.A.: \$ 4,719.72 TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 34,218.00</p> <p>Importe TOTAL A FACTURAR \$ 54,782.50 MAS I.V.A \$ 8,765.20 MONTO NETO A FACTURAR \$ 63,547.70</p> <p>RETENCION 3% (S.V.I.F.Y C.) : \$ 2,528.42 TOTAL DEDUCCIONES: \$ 36,746.42</p> <p>MONTO LIQUIDO A RECIBIR: \$ 61,019.28</p>	\$54,782.50	IVA, - Importe: 8765.20	\$54,782.50

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

sesenta y tres mil quinientos cuarenta y siete Pesos 70/100 M.N.

Subtotal: \$54,782.50**I.V.A.:** \$8,765.20**Total:** \$63,547.70**Este documento es una representación impresa de un CFDI****Serie del Certificado del emisor:** 00001000000711829771**Folio Fiscal:** 4FE966F2-BD85-492E-9501-E82DFF3D5CB6**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000709182898**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-26T11:25:38**Sello digital del CFDI**

aTc7DsDhVM1//45VkkWr0fVnb1nwpHeKzfYfSNrWGJ9Zbdc7zd/+4ecA8N+g4yGQp7AmiJ0uBvuogaojNv1pvqoOvi7LJNKXrBC6FrxGEuBDrlN9BVeodlEn/YfSKGfnGvXdhLA88jwh
ctsNhhUOyC2Q+ey7EUvzVNEAfdlp/OEldVO5bmDP5tayvFuUPlQIRPOPBYPf31Vuk8A2YguFFCellHhfvR3Gyj2VvliqJxKhsKAoVF7zoF1w7KVfpU1YSq8Ro3xrtZvy96by4ysosy8e6WVGJZ
A93RlqcrBQ2da1NmGnb9u9VrobHgdwhjWsdXzjAaHCXvKMI2CYUvwg==

Sello del SAT

iLPbxZrwlwJFX0VKPdkjqwGzspH75R7y/0QUYmIhdCP7IEcVKnJfgh2RuxzhqE5sQtmFsdNJZOIJ05YqjnGPNzqkq1frv/KZRRdOhALgJjcJWPDo2Olf3mXS18hzNGzYjyeZ6VqLLe4
R1/hoF01vkCMexmZ8SLH8oOlc5oSRwlCycuCMvdo4sNdZZ7JYgo15o5BcpObTAIzMvuFC4gaC/cnYzzV8mVl5nqvMV2B++hedmiQCJ0hQL6eLvudND9NkaRW5fITABUE9CNfKuZd5lySi
ZqVuWSQLmdxNaUkoJGFR22PV56QU5X/izQNmh/XKrrtNo58z5P6z3GqQFkfw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4FE966F2-BD85-492E-9501-E82DFF3D5CB6|2025-11-26T11:25:38|MAS0810247C0|aTc7DsDhVM1//45VkkWr0fVnb1nwpHeKzfYfSNrWGJ9Zbdc7zd/+4ecA8N+g4yGQp7Ami
J0uBvuogaojNv1pvqoOvi7LJNKXrBC6FrxGEuBDrlN9BVeodlEn/YfSKGfnGvXdhLA88jwhctsNhhUOyC2Q+ey7EUvzVNEAfdlp/OEldVO5bmDP5tayvFuUPlQIRPOPBYPf31Vuk8A2YguFF
CellHhfvR3Gyj2VvliqJxKhsKAoVF7zoF1w7KVfpU1YSq8Ro3xrtZvy96by4ysosy8e6WVGJZA93RlqcrBQ2da1NmGnb9u9VrobHgdwhjWsdXzjAaHCXvKMI2CYUvwg==|000010000007091828|

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGBOCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MTE4Mjk3NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSVk1DSU8gREUgQUJ1RSQUNJTE04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2025-11-25T10:30:33" Folio="97" FormaPago="03" LugarExpedicion="80180" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000711829771"
Sello="aTc7DsDhVM1//45VKKwR0fvNb1nwpHeKzFFYSNrWGJ9Zbdc7zd/+4ecA8N+g4yGQp7AmiJ0uBvuogaojNv1pvqoOv17tJNKhXrBC6FrXGEuBDr/LN9BVeodIEn/YFSKGfnGvXclhLA88jwhcts
SubTotal="54782.50" TipoDeComprobante="I" Total="63547.70" Version="4.0">
<cfdi:Emisor Nombre="SERGIO JOEL PADILLA SOTO" RegimenFiscal="612" Rfc="PASS971118IR0"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="80500" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MBA850101214" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72141103" ClaveUnidad="E48" Descripcion="SERVICIO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CARRETERAS PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS
ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO NO.: MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
MONTO DEL CONTRATO: $ 1,760,134.61 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 84,280.78 MAS I.V.A 16 % $ 13,484.92 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $
97,765.70 AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 29,498.28 MAS I.V.A.: $ 4,719.72 TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 34,218.00 Importe TOTAL A FACTURAR $
54,782.50 MAS I.V.A $ 8,765.20 MONTO NETO A FACTURAR $ 63,547.70 RETENCION 3% ( S.V.I.F.Y C. ) : $ 2,528.42 TOTAL DEDUCCIONES: $ 36,746.42 MONTO
LIQUIDO A RECIBIR: $ 61,019.28" Importe="54782.50" NoIdentificacion="SER03" ObjetoImp="02" ValorUnitario="54782.50">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="54782.50" Importe="8765.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8765.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="54782.50" Importe="8765.20" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4FE966F2-BD85-492E-9501-E82DFF3D5C86"
FechaTimbrado="2025-11-26T11:25:38" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="aTc7DsDhVM1//45VKKwR0fvNb1nwpHeKzFFYSNrWGJ9Zbdc7zd/+4ecA8N+g4yGQp7AmiJ0uBvuogaojNv1pvqoOv17tJNKhXrBC6FrXGEuBDr/LN9BVeodIEn/YFSKGfnGvXclhLA8
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="iLPbxZrw1wIJFX0VKPdkjqwGzspH75R7y/0QUYmIhdCP7tEcVKnJfqh2RuxzhqE5sQtmFSdNJZOLJD5YqjngPNzgzKq1frV/KZR/dOhALgJjcJWPDo201fb3mXS18hzNGzYjyeZ6VqLL
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PASS971118IR0	SERGIO JOEL PADILLA SOTO	MBA850101214	MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4FE966F2-BD85-492E-9501-E82DFF3D5CB6	2025-11-25T10:30:33	2025-11-26T11:25:38	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$63,547.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha: 26 de septiembre de 2025

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA:	SERGIO JOEL PADILLA SOTO		ESTIMACIÓN No:	01 ADICIONAL FINIQUITO
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		PERIODO DE ESTIMACION:	
TELÉFONO:	CEL:		DEL	15-jul-25
667-5818434	667-5818434		AL	11-sep-25
R.F.C.			FECHA DE CONTRATO:	
PASS971118IR0.				23-jun-24
DEPENDENCIA-				

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO	BADIRAGUATO	INICIO: 24-jun-24
		TERMINACIÓN: 11-sep-24

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE LOS ENCINOS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRATO No:

MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,517,357.42	\$1,760,134.61	\$616,047.11	\$1,760,134.61
			BUENO POR: \$ 61,019.28

RECIBI:

\$ 61,019.28

(SON SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 ADICIONAL FINIQUITO

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 29,498.28	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 84,280.78
MAS I.V.A.:	\$ 4,719.72	MAS I.V.A 16 %	\$ 13,484.92
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 34,218.00	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 97,765.70
3 % SVIFYC:	\$ 2,528.42	MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 36,746.42
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 36,746.42	MONTO A FACTURAR MAS IVA	\$ 63,547.70

SALDO A PAGAR:

\$ 61,019.28

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Dependencia :

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Control de Estimaciones

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA		Fecha:	Estimacion:	
		26 de septiembre de 2025	01 ADICIONAL FINQUITO	
Periodo de la estimacion:	15/07/2025	11/09/2025	Localidad:	No. De contrato:
Periodo de Ejecución:	15/07/2025	11/09/2024	BADIRAGUATO	MBGBR-AD-FAISMUN-006/2025
Importe del contrato con I.V.A:	Imp. Contratado sin I.V.A	Anticipo	Importe Anticipo sin I.V.A	% de Avance
\$ 1,760,134.61	\$ 1,517,357.42	\$ 616,047.11	\$ 531,075.09	6%
				% Avance Total
				100%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion	Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+) \$ 84,280.78	ESTA ESTIMACION
	16 % I.V.A (+) \$ 13,484.92	
\$ 34,218.00	Sub- Total A (=) \$ 97,765.70	\$ 97,765.70
	Amortizacion Anticipo 35% \$ 29,498.28	
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+) \$ 4,719.72	ACUMULADO ANTERIOR
\$ 581,829.12	Total (=) \$ 34,218.00	\$ 1,662,368.91
	Importe TOTAL A FACTURAR \$ 54,782.50	
TOTAL AMORTIZADO	16 % I.V.A (+) \$ 8,765.20	TOTAL ACUMULADO.
\$ 616,047.11	Total (=) \$ 63,547.70	\$ 1,760,134.61
	3 % SVIFYC: \$ 2,528.42	
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=) \$ 36,746.42	CONTRATADO
\$ 616,047.11	Importe TOTAL \$ 61,019.28	\$ 1,760,134.61
	NETO A PAGAR	
SALDO DEL ANTICIPO	\$ 61,019.28	SALDO
\$0.00	Son:	\$ -
	(SON SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE PESOS 28/100 M.N.)	

ELABORO.-


Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR O.P.D.U. Y E.

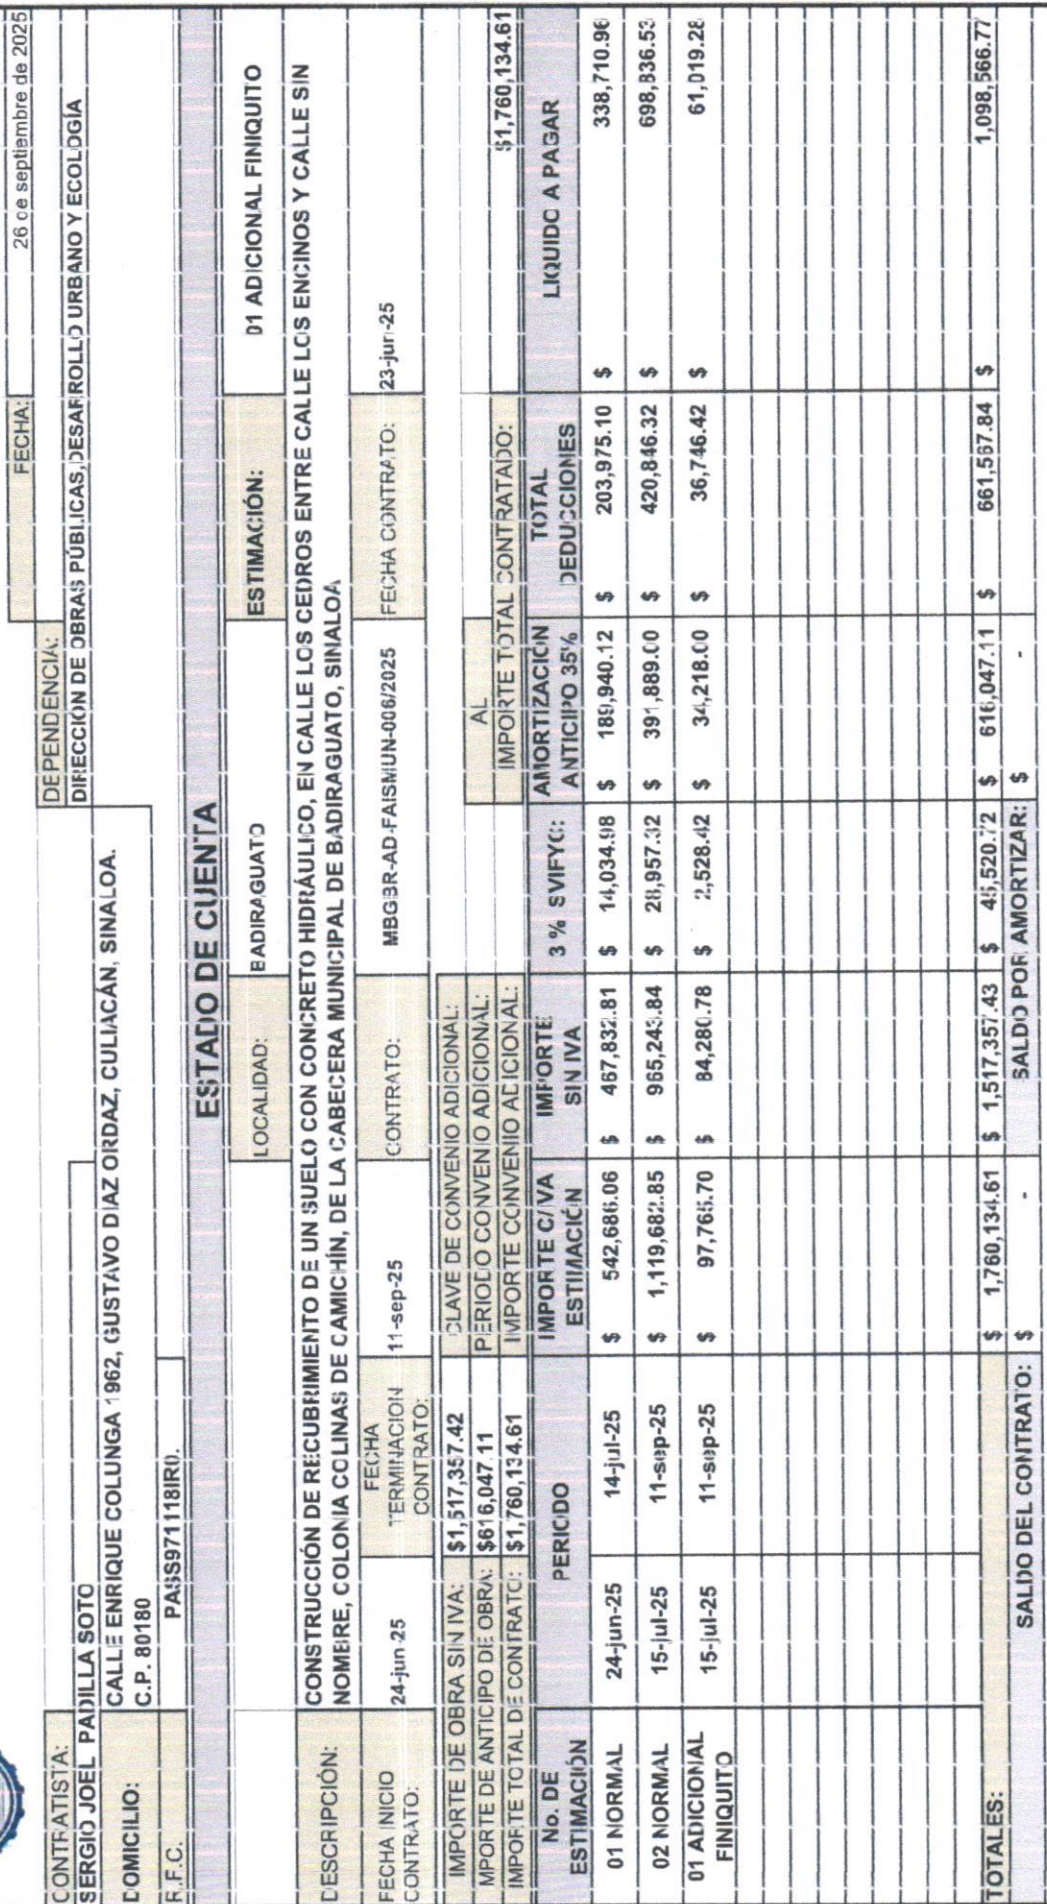

REVISO:-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTO Y PRESUPUESTOS.

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO:-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE D.P.D./J. Y E.



CONTRATISTA:		FECHA: 26 de septiembre de 2025	
SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA:	
DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	
R.F.C.	PASS971118IR0.		

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

	LOCALIDAD:	BADIRAGUATO	ESTIMACIÓN:	01 ADICIONAL FINQUITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA			

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:	\$ 1,517,357.42
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 616,047.11
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 1,760,134.61

DESTAJO		IMPORTE
1	PRELIMINARES	\$ 46,926.62
2	ESTRUCTURA	\$ 54,842.83
3	OTROS	\$ -
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:		\$ 101,769.45
POR CIERRE DE ESTIMACIÓN:		\$ 84,280.78

SUB TOTAL=	\$ 84,280.78
I.V.A AL 16 %	\$ 13,484.92
TOTAL =	\$ 97,765.70

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO-

ING. JOSE RODOLFO CONTRERAS LOPEZ
COSTOS Y PRESUPUESTOS.

AUTORIZO.-

[Firma]
C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$616,047.11
------------------------------	--------------

[illegible]

Sergio J. Padilla Soto

REVISO

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO							
R.F.C.		PASS971118JRS.							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		01 ADICIONAL FINIQUITO							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
3	PRELIMINARES								
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2							
		CADENAMIENTO							VER CROQUIS
		0+000.00	0+010.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+080.00	0+090.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+090.00	0+100.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+100.00	0+110.00		10.0000	10.20		102.00	
		0+110.00	0+120.00		10.0000	10.20		102.00	
							TOTAL EJECUTADO	1224.00	
							ESTIMACION 1	1122.00	
							ADICIONAL	102.00	
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FUA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON	M3							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO	ESPESOR		VER CROQUIS
		0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
		0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20	0.55	45.10	
							TOTAL EJECUTADO	541.20	
							ESTIMACION 1	491.70	
							ADICIONAL	49.50	
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD.,	M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO			VER CROQUIS
		0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20		82.00	
							TOTAL EJECUTADO	984.00	
							ESTIMACION 1	894.00	
							ADICIONAL	90.00	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA:				DEPENDENCIA:					
SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO							
R.F.C.		PASS971118IR0.							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		01 ADICIONAL FINIQUITO							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,	M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO			VER CROQUIS
		0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20		82.00	
							TOTAL EJECUTADO	984.00	
							ESTIMACION 1	894.00	
							ADICIONAL	90.00	
GP109	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN,	M2							
		CADENAMIENTO			LONG	ANCHO			VER CROQUIS
		0+000.00	0+010.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+010.00	0+020.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+020.00	0+030.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+030.00	0+040.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+040.00	0+050.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+050.00	0+060.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+060.00	0+070.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+070.00	0+080.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+080.00	0+090.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+090.00	0+100.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+100.00	0+110.00		10.0000	8.20		82.00	
		0+110.00	0+120.00		10.0000	8.20		82.00	
							TOTAL EJECUTADO	984.00	
							ESTIMACION 1	894.00	
							ADICIONAL	90.00	
ESTRUCTURA									
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML							
		CADENAMIENTO		LONG	LADO				
		0+000.00	0+103.93	103.9300	IZQUIERDA			103.93	
		0+000.00	0+103.93	103.9300	CENTRO			103.93	
		0+000.00	0+103.93	103.9300	DERECHA			103.93	
				69.2867	EN PATIN Y GUARNICION			69.29	
							TOTAL EJECUTADO	381.08	
							CONTRATADO	360.00	
							ADICIONAL	21.08	

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA



CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO				DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA					
CONTRATISTA:		SERGIO JOEL PADILLA SOTO							
R.F.C.		PASS971118IR0.							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA							
ESTIMACION		01 ADICIONAL FINIQUITO							
GENERADORES DE ESTIMACION									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ACUMULADO		OBSERVACIONES
							PARCIAL	TOTAL	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA	M3							
	CADENAMIENTO	LADO	LONG	ANCHO	ESPESOR				
	0+000.00	0+103.93	IZQUIERDA	141.94	0.20		28.39		
	0+000.00	0+103.93	DERECHA	187.43	0.20		37.49		
						TOTAL EJECUTADO	65.88		
						CONTRATADO	48.00		
						ADICIONAL	17.88		
GP10	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO.	M2							
	CADENAMIENTO	LADO	LONG	ANCHO					
	0+000.00	0+103.93	IZQUIERDA	141.94	1.00		141.94		
	0+000.00	0+103.93	DERECHA	187.43	1.00		187.43		
						TOTAL EJECUTADO	329.37		
						CONTRATADO	240.00		
						ADICIONAL	89.37		

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA:
SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


DOMICILIO: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C. PASS971118IR0.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CROQUIS ESTIMACION:**CROQUIS ESTIMACION:**

CLAVE	CONCEPTO
1	PRELIMINARES
GP01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO.
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN,
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,

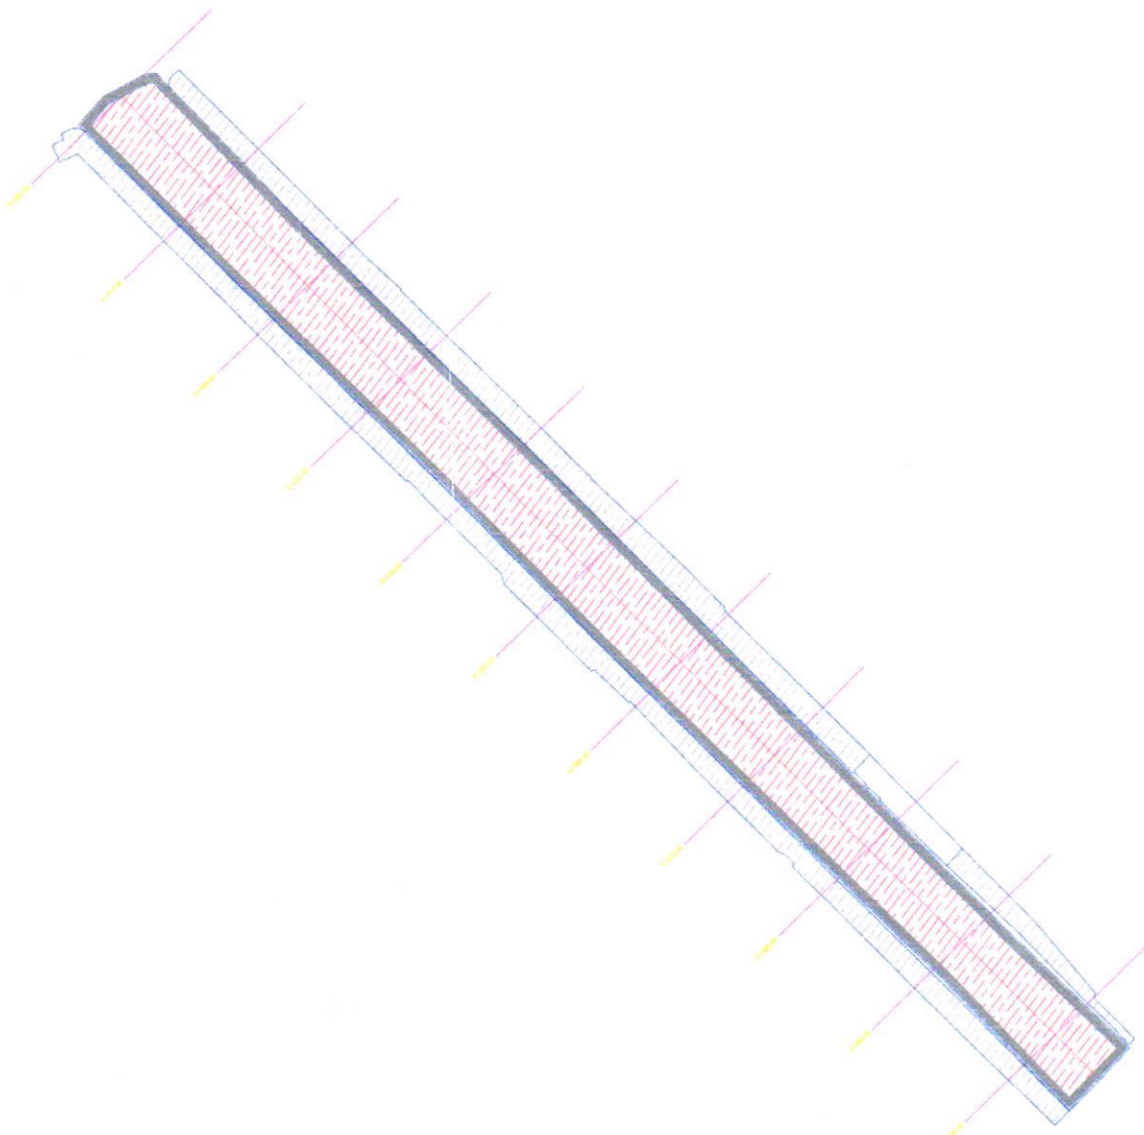

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL


REVISO.-

[Signature]
ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

[Signature]
C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.

CONTRATISTA: SERGIO JOEL PADILLA SOTO		DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DOMICILIO:	CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180	
R.F.C.	PASS971118IR0.	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA	
CROQUIS ESTIMACION:		
2	ESTRUCTURA	
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX	
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS.	
GP10	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y	

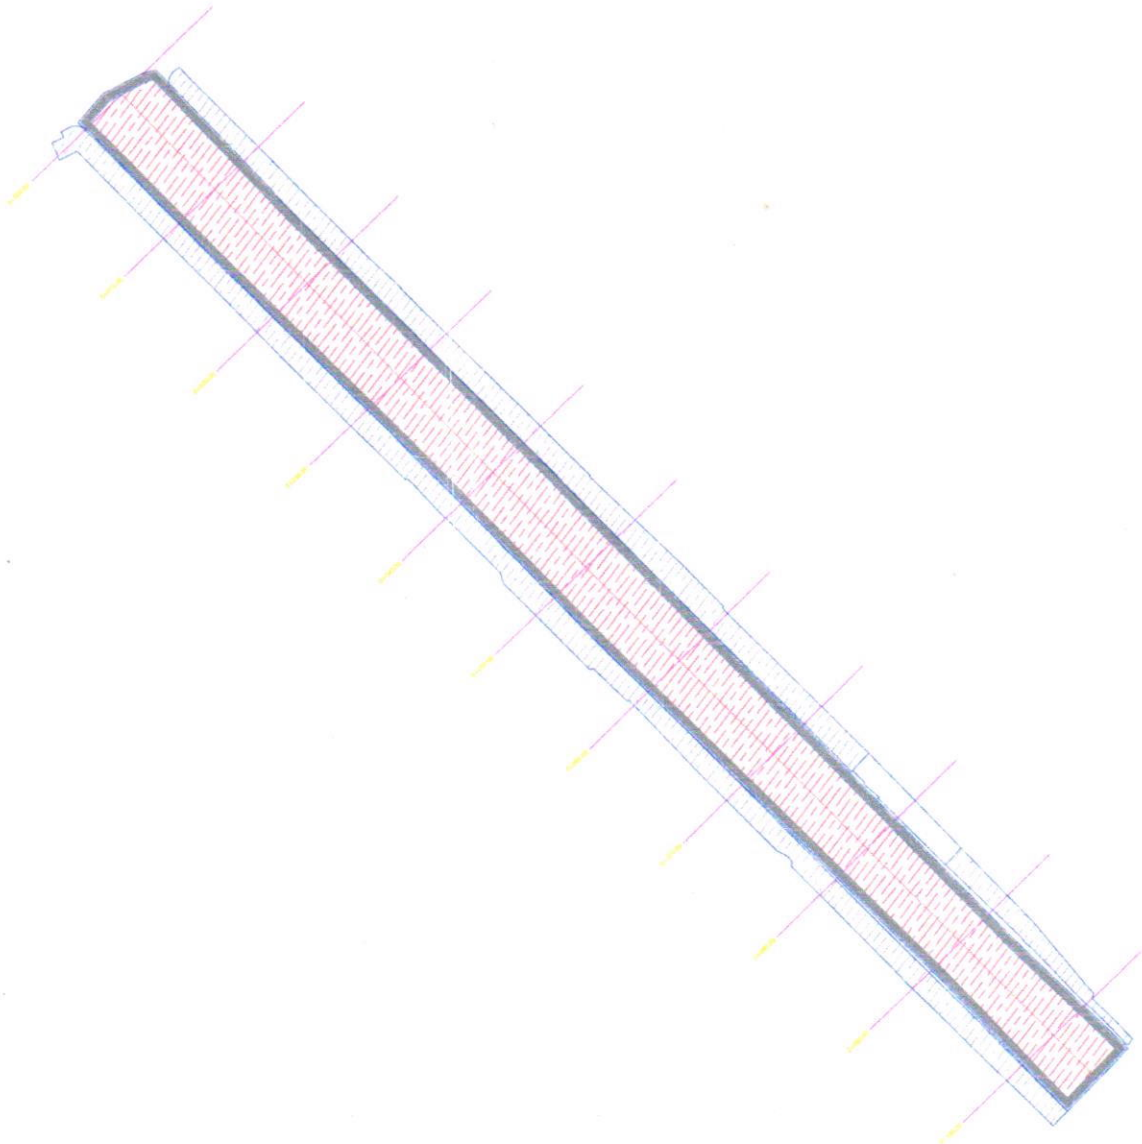

ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto
CC. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO.-

ARQ. BRICEIDA GONZALEZ NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZO.-

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.:

OBRA:

PASS971118IR0.

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

CONCEPTO

PRELIMINARES

GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO
GP25	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO,



ELABORO:-

Sergio J. Padilla Soto

**C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISO:-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez

**ARQ. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

AUTORIZO:-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos

**C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.**



CONTRATISTA:

SERGIO JOEL PADILLA SOTO

DEPENDENCIA:

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

DOMICILIO:

CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80180

R.F.C.

PASS971118IR0.

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE LOS CEDROS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHÍN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

FOTOS DE ESTIMACION:

FOTOS DE ESTIMACION:

CVE

2

CONCEPTO

ESTRUCTURA

GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE:
GP10	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y



ELABORO.-

Sergio J. Padilla Soto

**C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REPRESENTANTE LEGAL**

REVISO.-

Arq. Briceida GPE Nieblas Martinez

**ARO. BRICEIDA GPE NIEBLAS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA**

AUTORIZO.-

C. Ing. Rubiel Rincon Ramos

**C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE O.P.D.U. Y E.**



Fecha y hora de consulta

10/12/2025 7:33:35 PM

Contrato

00799320

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: EST 01 EXT FINQ AD06

Importe de la operación: 61,019.28 MXP

Cuenta de retiro: 0124174836

Cuenta de depósito: 072730012837223485

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

Titular de la cuenta: SERGIO JOEL PADILLA SOTO

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha valor: 11/12/2025

Fecha de creación: 10/12/2025

Fecha de aplicación: 10/12/2025

Concepto de pago: EST 01 EXT FINQ AD06

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382

Hora de captura en el canal: 19:33:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000222315

Clave de rastreo: 002601002512110000222315

Folio de firma: 0069267119

Folio único: I401202512101933330069267125

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	10/12/2025
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/12/2025
